西峡县交通运输局2025年农村公路桥梁改建(造)项目 (项目名称)____标段 施工招标

投 标 文 件

(商务及技术文件)

投标人:	南阳华岳路	各桥工	程有	限包	司		(电子签章)
法定代表人或	其委托代	理人:					(电子签名)
	2025	年	9	月	10	H	

目 录

一、	投标函及投标函附录	1
	(一) 投标函	1
	(二)投标函附录	2
二、	授权委托书或法定代表人身份证明	3
	(一) 授权委托书	3
	(二) 法定代表人身份证明	5
三、	投标保证金	ô
	投标保证金承诺函	7
四、	施工组织设计(暗标)18	8
五、	项目管理机构19	9
	(一)项目管理机构组成表19	9
	(二) 主要人员简历表20	Э
	(二)主要人员简历表27	7
	(二)主要人员简历表3	1
	(二)主要人员简历表3!	5
	(二)主要人员简历表38	3
	(二)主要人员简历表42	2
	(二)主要人员简历表4	5
	(二)主要人员简历表4	
五、	主要机械设备和试验检测设备配备表54	
七、	资格审查资料58	3
	(一)投标人基本情况表58	3
	(二)近年财务状况64	4
	(三)近年完成的类似项目情况表166	ŝ
	(三)近年完成的类似项目情况表175	3
	(三)近年完成的类似项目情况表179	9
	(三)近年完成的类似项目情况表185	5
	(四)投标人的信誉情况表19	1

	(五)正在施工和新承接的项目情况表	309
	(六)近年发生的诉讼及仲裁情况	310
	(七) 拟委任的其他人员资历表	311
	(七) 拟委任的其他人员资历表	314
	(七) 拟委任的其他人员资历表	316
	(七) 拟委任的其他人员资历表	319
	(七) 拟委任的其他人员资历表	321
	(七) 拟委任的其他人员资历表	324
八、	其他资料	326
	承诺书 (一)	326
	承诺书 (二)	327
	承诺书 (三)	328
	承诺书 (四)	329
	承诺书(五)	330
	2. 招标文件要求及投标人认为必要的其他材料。	332
	(一)根据本项目的实际情况结合新技术,新工艺,新材料等展现企业	的相应能力。
		332
	(二)机械设备和试验检测设备配备情况	337
	(三)根据本项目的工期、质量、管理、服务做出相应实质性的承诺.	341
	(四)保修服务承诺	361
	(五)项目部成员在岗保证措施	364

一、投标函及投标函附录 (一) 投标 函

西峡县交通运输局(招标人名称):

- 1 我方已仔细研究<u>西峡县交通运输局2025年农村公路桥梁改建(造)项目</u>(项目名称)_一_标段施工招标文件的全部内容(含补遗书第_/号至第_/号),在考察工程现场后,愿意以第二个信封(报价文件)中的投标总报价,按合同约定实施和完成承包工程,修补工程中的任何缺陷。
 - 2 我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不撤销投标文件。
 - 3 项目经理: <u>张职杨</u>,工程质量: <u>合格</u>,安全目标:安全生产零事故,工期: 365 日历天,投标有效期:自投标人提交投标文件截止之日起计算60日历天。
 - 4 如我方中标,我方承诺:
 - (1) 在收到中标通知书后,在中标通知书规定的期限内与你方签订合同;
 - (2) 在签订合同时不向你方提出附加条件;
 - (3) 在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务;
- (4) 在你方和我方进行合同谈判之前,我方将按照合同附件提出的最低要求填 报派驻本标段的其他管理和技术人员及主要机械设备和试验检测设备,经你方审批后作 为派驻本标段的项目管理机构主要人员和主要设备且不进行更换。如我方拟派驻的人员 和设备不满足合同附件要求,你方有权取消我方中标资格。
- 5 我方在此声明,所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确,且不存在招标文件第二章"投标人须知"第1.4.3 项和第1.4.4 项规定的任何一种情形。
- 6 在合同协议书正式签署生效之前,本投标函连同你方的中标通知书将构成我们 双方之间共同遵守的文件,对双方具有约束力。
 - 7 / (其他补充说明)

投标 人: 南阳华岳路桥工程有限公司	(电子签章)
法定代表人或其委托代理人:	(电子签名)
地址: 西峡县五里桥镇工业大道中段东侧	
网址:	
电话:13525119056	
传真:	
邮政编码:	
年9月10日	

(二) 投标函附录

项目名称	西	西峡县交通运输局2025年农村公路桥梁改建(造)项目						
投标人名称		南阳华岳路桥工程有限公司						
投标范围		施工图纸及工程量清单范围内的所有内容						
-75 II /2 -79	姓名	张职杨	注册级别	公路二级 建造师	注册编号	豫 241181835281		
项目经理		产考核合 片编号	豫交安 B22G00134	身份证号		411330199002 264513		
投标报价		详见"第二信封 报价文件"投标函						
投标工期		365日历天						
投标质量		合格						
投标有效期		投标截止之日起60日历天						
企业资质	建筑工程		《包贰级、公路 西工总承包贰约			级、市政公用工 级		
备注								

投标人:_	南阳华岳	路桥工程有限公司	(电子签章)
法定代表。	人或其委托	法:	(电子签名)
20254	年 <u>9</u> 月_	10 日	

二、授权委托书或法定代表人身份证明

(一) 授权委托书

本人<u>刘溪洋</u>(姓名)系<u>南阳华岳路桥工程有限公司</u>(投标人名称)的法定代表人,现委托<u>张职杨</u>(姓名)为我方代理人。代理人根据授权,以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改<u>西峡县交通运输局2025年农村公路桥梁改建(造)项目</u>一标段(项目名称、标段)施工投标文件、签订合同和处理有关事宜,其法律后果由我方承担。

委托期限: <u>自本授权委托书签署之日起至投标有效期期满</u>代理人无转委托权。

附: 法定代表人身份证明

投标人: 南阳华岳路桥二	工程有限公司 (电子签章)
法定代表人:	(电子签名)
身份证号码: 4113301	99711192049
委托代理人: 张职杨	
身份证号码: 4113301	99002264513
手机号码:135251	19056

法定代表人身份证明



委托代理人身份证明





(二) 法定代表人身份证明

投标人名称: 南阳华岳路桥工程有限公司__

单位性质: 有限责任公司

地址: 西峡县五里桥镇工业大道中段东侧

成立时间: 2016 年 6 月 14 日

经营期限: _长期______

姓名: 刘溪洋 性别: 女

年龄: 28岁 职务: 总经理

系_南阳华岳路桥工程有限公司_(投标人名称)的法定代表人。

特此证明。

投标人: 南阳华岳路桥工程有限公司 (单位电子签章)

三、投标保证金

附:请附银行转账凭证扫描件或电子投标保函截图或免缴保证金证明。

我公司是纳入南阳市建筑业企业信用评价且结果为 AA 级的投标企业,在下一年度信用评价结果公告之目前,在参与南阳市政府投资项目招标投标活动中,符合投标保证金减半缴纳条件。(后附信用评价文件)

		中国建设银行	网上银行电子回	妣	
	币别: 人	民市元 日期: 20250908 凭证号: 107834	923285 账	户明细编号-交易流水号:	8921-41075690899CZ84M7E7
44	全 称	南阳华岳路桥工程有限公司	al-	全 称	西峡县公共资源交易中心
付 款 人	账号	41050175690800000073	收款 人	账 号	94100301002679669604482
Д	开户行	中国建设银行股份有限公司西峡支行		开户行	中国邮政储蓄银行股份有限公司西峡县白羽南路支
大写金额	伍仟元整		小写金额	5, 000. 00	
用途	保证金		钞汇标志	钞	冷阳建设
摘要	电子转账				6 出

投标人(电子签章): <u>南阳华岳路桥工程有限公司</u> 法定代表人(或授权委托人):

投标保证金承诺函

西峡县交通运输局 (招标人名称):

我公司因参加<u>西峡县交通运输局2025年农村公路桥梁改建(造)项目(项目名称)</u>投标活动,特承诺在规定的投标有效期内不撤销或修改其投标文件,在收到中标通知书后,在中标通知书规定的期限内按照招标文件与招标人及时签订合同,合同签订后及时上传合同。如有违反,愿意缴纳招标控制价2%(最高不超过80万)的违约金。

如有争议,服从由行政监督部门作出的行政决定,或仲裁委 员会作出的仲裁裁决,或工程项目所在地人民法院作出的判决。

本投标承诺函在投标有效期内保持有效。

投标人: _南阳华岳路桥工程有限公司__

法定代表人(或授权委托人):

南阳市住房和城乡建设局南阳市水利局文件南阳市交通运输局

宛建市〔2025〕5号

关于公布 2024 年度全市建筑业类企业信用 综合评价结果的公告

各县(市、区)住房和城乡建设局、交通运输局、水利局, 市直各相关单位,各建筑业类企业:

依据《南阳市住房和城乡建设局关于印发南阳市建筑业企业信用评价标准的通知》(宛建〔2020〕25号〕及《南阳市住房和城乡建设局关于印发南阳市建筑勘察、设计企业信用评价标准(试行)》的通知(宛建设〔2022〕1号)等文件要求,经企业申报、县(市、区)主管部门审核,市直各行业主管部门及信用评价成员单位根据职责分工分别认定,通过网上公示、

申诉等程序,确定 206 家企业为 AAA 级、446 家企业为 AA 级、1201 家企业为 A级、 10 家企业为 B级,现予以公告(详见附件)。同时,请各县(市、区)各行业主管部门,市直各有关单位,按照评价结果及出台的相关惠企政策要求,对建筑业企业在市场准入、创先评优、动态监管服务等方面按照差别化管理予以落实。

附件: 2024 年度南阳市建筑业企业信用评价审核结果汇总表







2024年度南阳市建筑业企业信用评价审核结果汇总表

—、 3	建筑施工企业		
(一)) 建筑施工总承包企业		·
1.施	工总承包AAA级企业(共149家)		-
序号	企业名称	参评资质	信用评级
1	河南天工建设集团有限公司	建筑工程施工总承包	AAA
2	镇平县城建市政工程有限公司	市政公用工程施工总承包	AAA
3	南阳市市政工程总公司	市政公用工程施工总承包	AAA
4	岭煊建设有限公司	建筑工程施工总承包	AAA
5	河南牧原建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	AAA
6	新野县市政工程有限责任公司	市政公用工程施工总承包	AAA
7	南阳绿城建设有限公司	建筑工程施工总承包	AAA
8	南阳市宛城建筑有限责任公司	建筑工程施工总承包	AAA
9	淅川县鼎力建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	AAA
10	正扬建设有限公司	建筑工程施工总承包	AAA
11	河南仁筑建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	AAA
12	河南天正建设有限公司	建筑工程施工总承包	AAA
13	南阳卓越建工有限公司	市政公用工程施工总承包	AAA
14	内乡百川建筑有限公司	建筑工程施工总承包	AAA
15	邓州市市政工程公司	市政公用工程施工总承包	AAA
16	河南四建集团第二建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	AAA
17	河南禹泰建设有限公司	水利水电工程施工总承包	AAA
18	河南华力建设集团有限公司	建筑工程施工总承包	AAA
19	南阳市杏煜建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	AAA
20	方城县裕鑫市政工程有限公司	市政公用工程施工总承包	AAA
21	河南中岳建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	AAA
22	河南宛北公路工程有限公司	公路工程施工总承包	AAA
23	河南省中州公路工程有限公司	公路工程施工总承包	AAA
24	河南富世建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	AAA
25	唐河县永琚建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	AAA
26	河南新恒通公路工程有限责任公司	公路工程施工总承包	AAA
27	南阳市住宅建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	AAA
28	河南淯鑫建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	AAA

		26 20 XIII XIII XIII XIII XIII XIII XIII X	99,000
29	内乡县宛西公路工程有限公司	公路工程施工总承包	AAA
30	内乡县湍东建筑安装有限公司	建筑工程施工总承包	AAA
31	南阳高新区沣源市政开发有限公司	市政公用工程施工总承包	AAA
32	河南万工建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	AAA
33	河南辉腾建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	AAA
34	河南晟德公路工程建设有限公司	市政公用工程施工总承包	AAA
35	河南锦冠电力工程有限公司	电力工程施工总承包	AAA
36	桐柏县隆泰建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	AAA
37	河南赛诺建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	AAA
38	淅川县恒信建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	AAA
39	南阳市建发工程有限公司	建筑工程施工总承包	AAA
40	河南省宛南建筑有限公司	建筑工程施工总承包	AAA
41	河南锦广建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	AAA
42	桐柏县兴桐建设工程有限公司	市政公用工程施工总承包	AAA
43	河南万方交通工程有限公司	公路工程施工总承包	AAA
44	方城县第一建筑有限公司	建筑工程施工总承包	AAA
45	河南金鼎建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	AAA
46	南阳城建工程建设有限公司	建筑工程施工总承包	AAA
47	河南诚泰建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	AAA
48	河南十九建建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	AAA
49	唐河鑫淼建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	AAA
50	中及御龙建设有限公司	水利水电工程施工总承包	AAA
51	盛发建设有限公司	建筑工程施工总承包	AAA
52	河南鑫安泰建设有限公司	建筑工程施工总承包	AAA
53	河南华禹建设集团有限公司	建筑工程施工总承包	AAA
54	南召县第二建筑公司	建筑工程施工总承包	AAA
55	河南汇禹实业发展有限公司	市政公用工程施工总承包	AAA
56	南阳市建筑公司	建筑工程施工总承包	AAA
57	河南益之源建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	AAA
58	南阳市路通公路工程有限公司	公路工程施工总承包	AAA
59	河南省宛东建筑安装工程有限公司	建筑工程施工总承包	AAA
60	西峡县第二建筑集团有限责任公司	建筑工程施工总承包	AAA
61	北控南阳水务集团有限公司	市政公用工程施工总承包	AAA

	T"		
62	中睿五翔咨询有限公司	建筑工程施工总承包	AAA
63	河南宛洲建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	AAA
64	西峡县自来水务有限公司	市政公用工程施工总承包	AAA
65	古阳建设发展有限公司	建筑工程施工总承包	AAA
66	河南恒康建设有限公司	建筑工程施工总承包	AAA
67	内乡县第一建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	AAA
68	河南诚信建设工程股份有限公司	建筑工程施工总承包	AAA
69	南召县丹霞建筑工程有限公司	市政公用工程施工总承包	AAA
70	南阳城建卧龙工程建设有限公司	建筑工程施工总承包	AAA
71	河南唐河天工建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	AAA
72	河南森宇建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	AAA
73	淅川县电力勘测设计院工程有限公司	电力工程施工总承包	AAA
74	社旗县鑫发建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	AAA
75	河南桐柏天工建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	AAA
76	南阳市油田天鹏建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	AAA
77	桐柏县水利井灌工程有限公司	水利水电工程施工总承包	AAA
78	河南天工建设集团工程建设有限公司	建筑工程施工总承包	AAA
79	社旗县公路工程发展有限公司	公路工程施工总承包	AAA
80	河南畅通公路工程技术有限公司	公路工程施工总承包	AAA
81	河南意恒建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	AAA
82	西峡县金林建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	AAA
83	河南豪瑞建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	AAA
84	河南盛世祥泰建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	AAA
85	河南维斯密建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	AAA
86	河南举阳建设有限公司	建筑工程施工总承包	AAA
87	南阳市中鼎建筑安装有限公司	建筑工程施工总承包	AAA
88	河南浩铭建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	AAA
89	河南嘉广建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	AAA
90	桐柏县鸿运路桥建设有限公司	公路工程施工总承包	AAA
91	南召县彩虹水利建设工程有限公司	水利水电工程施工总承包	AAA
92	南阳市远大道路桥梁工程有限公司	公路工程施工总承包	AAA
93	南阳市诚达建设有限公司	建筑工程施工总承包	AAA
94	河南天成路桥建设有限公司	公路工程施工总承包	AAA

	1000		
95	河南开元建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	AAA
96	镇平县欣兴建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	AAA
97	河南俊宇建设工程有限公司	水利水电工程施工总承包	AAA
98	南阳腾远石油工程技术服务有限公司	市政公用工程施工总承包	AAA
99	南阳市常安建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	AAA
100	南召县威凯建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	AAA
101	河南德仁建设工程有限公司	市政公用工程施工总承包	AAA
102	西峡县市政有限公司	市政公用工程施工总承包	AAA
103	河南宏奇建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	AAA
104	南阳博宇建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	AAA
105	河南瀚海建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	AAA
106	河南广程建设有限公司	建筑工程施工总承包	AAA
107	河南省桐柏县淮安建筑有限公司	建筑工程施工总承包	AAA
108	河南鸿华建设集团有限公司	建筑工程施工总承包	AAA
109	河南顺景建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	AAA
110	河南方厦建设工程有限公司	市政公用工程施工总承包	AAA
111	南阳飞龙电力集团有限公司	建筑工程施工总承包	AAA
112	河南远见建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	AAA
113	南阳吉祥建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	AAA
114	河南四建集团股份有限公司	建筑工程施工总承包	AAA
115	南召县通达公路工程有限公司	公路工程施工总承包	AAA
116	河南省玉都城乡建设工程集团有限公司	建筑工程施工总承包	AAA
117	镇平县鹏程公路工程有限公司	公路工程施工总承包	AAA
118	社旗县市政工程有限公司	市政公用工程施工总承包	AAA
119	河南天力电气科技公司	电力工程施工总承包	AAA
120	南阳市华祥建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	AAA
121	南召县永胜建筑有限公司	建筑工程施工总承包	AAA
122	社旗县城乡建设工程有限公司	市政公用工程施工总承包	AAA
123	南阳通力路桥有限公司	公路工程施工总承包	AAA
124	南阳市路通建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	AAA
125	河南禾材建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	AAA
126	南阳海川路桥建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	AAA
127	河南楚辉建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	AAA

128	南阳大旗石化工程股份有限公司	建筑工程施工总承包	AAA
129	河南省创兴建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	
130	河南鹏运建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	AAA
131	河南楠欧建设工程有限公司	建筑工程施工总承包 建筑工程施工总承包	AAA
132	河南鸿宸建设有限公司	建筑工程施工总承包	AAA
133	中交建筑集团有限公司	建筑工程施工总承包	AAA
134	河南乐山建设工程有限公司		AAA
135	河南鑫绿建设有限公司	建筑工程施工总承包	AAA
136	唐河县基业市政工程有限公司	建筑工程施工总承包	AAA
137		市政公用工程施工总承包	AAA
138	南阳恒丰建设有限公司	建筑工程施工总承包	AAA
	方城县腾龙水利建筑有限公司	水利水电工程施工总承包	AAA
139	南阳市卧龙建筑工程有限责任公司	建筑工程施工总承包	AAA
140	河南罗聪建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	AAA
141	河南岳丰建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	AAA
142	河南幸福源泉建设工程有限公司	市政公用工程施工总承包	AAA
143	南阳嘉浩建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	AAA
144	河南宏江建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	AAA
145	河南中联创合建设有限公司	建筑工程施工总承包	AAA
146	南阳市瑞洪建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	AAA
147	郑州一建集团有限公司	建筑工程施工总承包	AAA
148	河南省百通建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	AAA
149	内乡县菊龙市政工程有限公司	市政公用工程施工总承包	AAA
	[总承包AA级企业(共295家)		
序号	企业名称	参评资质	信用评级
1	河南广盛建安建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	AA
2	南阳市浩丰市政工程有限公司	市政公用工程施工总承包	AA
3	河南坤阳建筑水利有限公司	建筑工程施工总承包	AA
4	河南江辉建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	AA
5	河南恒卓基础工程有限公司	市政公用工程施工总承包	AA
6	南阳市豫南建设有限公司	建筑工程施工总承包	AA
7	南阳市广顺建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	AA
8	河南寅正建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	AA
9	南阳富龙电力工程有限公司	电力工程施工总承包	AA

		TO THE	100
10	河南京通建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	AA
11	南阳市城建市政工程有限公司	市政公用工程施工总承包	AA
12	南阳远征实业有限责任公司	市政公用工程施工总承包	AA
13	唐河县恒通市政工程有限公司	建筑工程施工总承包	AA
14	河南隽华建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	AA
15	邓州市公路工程有限责任公司	公路工程施工总承包	AA
16	隆中建设集团有限公司	建筑工程施工总承包	AA
17	河南恩润实业有限公司	建筑工程施工总承包	AA
18	南阳天合路桥实业有限公司	市政公用工程施工总承包	AA
19	南阳市丰盈市政工程有限公司	市政公用工程施工总承包	AA
20	河南省豫合建设工程施工有限公司	建筑工程施工总承包	AA
21	河南国臻建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	AA
22	河南省珩泰建设有限公司	建筑工程施工总承包	AA
23	河南中原畅通公路工程有限公司	公路工程施工总承包	AA
24	唐河路达公路工程有限公司	公路工程施工总承包	AA
25	南阳宏源水利水电工程有限公司	水利水电工程施工总承包	AA
26	永佳建设有限公司	建筑工程施工总承包	AA
27	河南冠宝建设工程有限公司	市政公用工程施工总承包	AA
28	中铁十二局集团有限公司	建筑工程施工总承包	AA
29	河南弘丰路桥工程有限公司	公路工程施工总承包	AA
30	南召县常青建设工程有限公司	市政公用工程施工总承包	AA
31	新洋建设 (河南) 有限公司	建筑工程施工总承包	AA
32	南阳南油科贸有限公司	建筑工程施工总承包	AA
33	社旗县赊店镇建筑工程公司	建筑工程施工总承包	AA
34	河南中原杰邦建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	AA
35	上久建设有限公司	建筑工程施工总承包	AA
36	河南省航诺建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	AA
37	南阳引丹建筑工程有限责任公司	建筑工程施工总承包	AA
38	南阳大正石化实业有限公司	建筑工程施工总承包	AA
39	河南春韬建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	AA
40	河南八顺建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	AA
41	河南广得成建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	AA
42	南阳市中达建筑安装工程有限责任公司	建筑工程施工总承包	AA

43	河南宝霄建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	AA
44	南阳市三盈市政建设工程有限公司	市政公用工程施工总承包	AA
45	河南明悦建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	AA
46	南阳三晶网络信息工程投资有限公司	通信工程施工总承包	AA
47	河南顿赢建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	AA
48	河南晟篷建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	AA
49	河南森之大实业有限公司	建筑工程施工总承包	AA
50	河南宛工建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	AA
51	河南振先建设有限公司	建筑工程施工总承包	AA
52	河南省建一建设有限公司	市政公用工程施工总承包	AA
53	邓州市自来水管道安装工程有限公司	市政公用工程施工总承包	AA
54	河南昆仑建设发展有限公司	建筑工程施工总承包	AA
55	一凡建设发展有限公司	建筑工程施工总承包	AΛ
56	淅川县鸿禹水利水电工程有限公司	水利水电工程施工总承包	AA
57	淅川县路桥工程有限公司	公路工程施工总承包	AA
58	河南浩安建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	AA
59	河南亘兴建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	AA
60	邓州市兴工建设有限公司	建筑工程施工总承包	AA
61	桐柏县鸿鑫建设有限公司	建筑工程施工总承包	AA
62	河南润南园林建设有限公司	建筑工程施工总承包	AA
63	河南嘉润建设工程有限公司	市政公用工程施工总承包	AA
64	河南晨广实业有限公司	市政公用工程施工总承包	AA
65	南召县宇丞市政工程有限公司	市政公用工程施工总承包	AA
66	河南骏晟建设工程管理有限公司	建筑工程施工总承包	AA
67	河南润旺建筑工程有限公司	水利水电工程施工总承包	AA
68	河南玉渊水利水电工程有限公司	市政公用工程施工总承包	AA
69	河南三崇建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	AA
70	河南宛栋建设有限公司	建筑工程施工总承包	AA
71	南阳吉顺建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	AA
72	河南纳辉建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	AA
73	唐河县恒新建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	AA
74	河南铭鼎建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	AA
75	南阳裕交公路工程有限公司	公路工程施工总承包	AA

76	南阳引丹山水施工有限公司	水利水电工程施工总承包	AA
77	河南钦鼎建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	AA
78	邓州市交通路桥工程有限公司	公路工程施工总承包	AA
79	河南泰赛建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	AA
80	河南宛润建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	AA
81	河南国泰建工建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	AA
82	河南省皖楚建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	AA
83	南阳华岳路桥工程有限公司	公路工程施工总承包	AA
84	南阳驰恒实业有限公司	建筑工程施工总承包	AA
85	河南泉润园林建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	AA
86	南阳市瑞通市政工程有限公司	建筑工程施工总承包	AA
87	河南龙兴建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	AA
88	河南全豪建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	AA
89	河南星宇建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	AA
90	河南远开建设工程有限公司	市政公用工程施工总承包	AA
91	河南兴禹水利水电建筑工程有限公司	水利水电工程施工总承包	AA
92	河南万龙兴建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	AA
93	南阳大正科美实业有限公司	建筑工程施工总承包	AA
94	方城县第二建筑有限公司	建筑工程施工总承包	AA
95	河南星工建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	AA
96	河南诚誉建设有限公司	建筑工程施工总承包	AA
97	邓州市正阳建筑工程有限责任公司	建筑工程施工总承包	AA
98	河南锦饶建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	AA
99	邓州市农水建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	AA
100	河南汇一建工有限公司	建筑工程施工总承包	AA
101	河南松泽建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	AA
102	河南庆瑞建设有限公司	建筑工程施工总承包	AA
103	河南省东方耀明电力工程有限公司	电力工程施工总承包	AA
104	南阳新鑫市政园林工程有限公司	市政公用工程施工总承包	AA
105	河南国璟建设有限公司	市政公用工程施工总承包	AA
106	河南中宛建工集团有限公司	建筑工程施工总承包	AA
107	河南龙峰建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	AA
108	河南中及泓富建设有限公司	建筑工程施工总承包	AA

四、施工组织设计(暗标) 暗标,另附

五、项目管理机构

(一) 项目管理机构组成表

				执业	业或职业资格证明			
职务	姓名	职称	证书 名称	级别	证号	专业	养老保险	备注
项目经理	张职杨	工程师	建造师	二级	豫 241181835281	公路	己缴	
	水坑物		交安	B级	豫交安 B22G00134	交通水运	幼幼	
项目总工	王伟	工程师	工程师	中级	C201909B6132 307400025	道路与桥 梁	己缴纳	
合同工程师	别萧萧	助工	预算员	/	Y04124010009 01098	城建	己缴纳	
财务负责人	李明星	会计师	会计师	中级	317012109411 35100476	/	己缴纳	
测量工程师	符家源	助工	测量员	/	Y04124008009 00701	城建	己缴纳	
试验检测负 责人	杜伟刚	工程师	工程师	中级	C202209B6132 307400051	道路与桥梁	己缴纳	
质检工程师	曹广兴	助工	质量员	/	041241090002 0000062	市政	己缴纳	
专职安全员	靳志强	助工	安全证	C级	豫交安 C22G00313	交通水运	已缴纳	

(二) 主要人员简历表

姓 名	张职杨	年 龄	35岁	学 历	专科
职称		职 务		拟在本合同任职	项目经理
毕业学校		2012 年毕业-	于 河南	交通职业学院 学校	建筑工程管理 专业
			主	要工作经历	
时间	参加	加过的类似项	目	担任职务	发包人及联系电话
2025. 06- 2025. 07	西峡县农村公路建设养护 心2024年第二批农村公路 护项目			项目副经理	西峡县农村公路建设养护 中心0377-69666485

备注:

- 1、"主要人员简历表"中的项目经理应附身份证、注册证、学历证等资料复印件;
- 2、其他主要人员应附上岗证或执业证等资料复印件。



中华人民共和国二级建造师注册证书

姓 名:张职杨

性 别: 男

出生日期: 1990-02-26

注册编号:豫241181835281

聘用企业:南阳华岳路桥工程有限公司

注册专业: 公路工程 (2024年11月07日 至 2027年11月06日)





个人签名: 张双龙

公路水运工程施工企业主要负责人和安全生产 管理人员安全生产考核合格证书



姓名: 张职杨

性别: 男

出生年月: 1990-02-26 身份证号: 411330199002264513

经公路水运工程施工企业主要负责人和安全生产管理人员安全生产考核

合格,特发此证。

企业名称: 南阳华岳路桥工程有限公司

证书编号: 豫交安B22G00134

有效期:

2022-02-24

2028-02-24

考核部门: 河南省交通运输厅



中华人民共和国交通运输部监制

普通高等学校



学生 张职杨 性别 男 , 一九九〇年 二月二十六日生, 于 二〇〇九 年 九 月至二〇一二年 七 月在本校 建筑工程管理


专业 三 年制 专 科学习, 修完教学计划规定的全部课程, 成绩合 格、准予毕业。

校 名:河南交通职业技术学院

校 (院) 长:

证书编号: 137891201206000565

中华人民共和国教育部学历证书查询网址: http://www.chsi.com.cn



出生 1990 年 2 月 26 日

住 址 河南省西峡县米坪镇王庄 村草岈组2号



公民身份号码 411330199002264513



中华人民共和国居民身份证

签发机关 西峡县公安局

有效期限 2023.02.01-2043.02.01



河南省社会保险个人参保证明 (2025年)

证件	类型		居民身份i	正.	证件	号码	Ø.		199002		单位:元
	障号码		0199002		姓	名		张职杨	3230001	性别	男
	单位名称			险种类型		 起始年月		7	截止年月		
河南	乐泰建筑工程有限	公司		工伤保险			202303	-		202502	
灵宝市道	通畅公路工程有限	责任公司	企业取	只工基本养老保险			202102			202302	
河南	广得建筑工程有限	公司		失业保险			202002			202004	
河南	广得建筑工程有限	公司	企业取	只工基本养老保险			202002			202004	
河南	霆妙建筑工程有限	公司	企业取	只工基本养老保险			202006			202008	
焦作市恒	信市政工程质量检 司	测有限公		失业保险			201607			202001	,
南阳	华岳路桥工程有限	公司	企业取	只工基本养老保险			202504			-	
灵宝市通	通畅公路工程有限	责任公司		失业保险			202102			202302	
河南	乐泰建筑工程有限	公司		失业保险			202303			202502	
河南	乐泰建筑工程有限	公司	企业取	只工基本养老保险			202303			202502	
河南	合庆建筑工程有限	公司	企业取	只工基本养老保险			201811			201901	
	广得建筑工程有限		工伤保险		202003		202004				
焦作市恒	信市政工程质量检 司	测有限公	工伤保险			201607		202205			
南阳	华岳路桥工程有限	公司	工伤保险				202504		-		
河南	霆妙建筑工程有限	公司	失业保险				202006			202008	
焦作市恒	信市政工程质量检 司	测有限公	企业职工基本养老保险				201607			202001	
河南	霆妙建筑工程有限	公司	工伤保险				202008			202008	
灵宝市通	通畅公路工程有限	责任公司	工伤保险		202102		202302				
南阳	华岳路桥工程有限	公司		失业保险	202504		ता				
	-			缴费明细性	青况						
	基本养	老保险		失业	L 保险				工伤	保险	
月份	参保时间	缴费	状态	参保时间		缴费	状态	参保	时间	缴费	状态
7,0	2016-07-01	参保	缴费	2016-07-01		参保	缴费	2016-	07-20	参保	缴费
	缴费基数	缴费	情况	缴费基数		缴费	情况	缴费	基数	缴费	情况
0 1	3756	•	•	3756)	3 7	56	-	-
0 2	3756	•	D	3756				3 7	5 6	-	-
0 3			-			194				-	-
0 4	3756	(3756		•)	37	56	-	_
0 5	3756	•		3756		•	•	3 7	56	-	=
0 6	3756	(•	3756				3 7	56	-	=1
0 7	3756	(D	3756)	3 7	56	-	-

表单验证号码011a3cdd6e244984b9b84017442ee145

奥 森湖	3756	•	3756	•	3756	-
	\$	-		-	3756	_
		-		-		-
11		-		_		-
1 2		-		_		_

说明:

- 1、本证明的信息,仅证明参保情况及在本年内缴费情况,本证明自打印之日起三个月内有效。
- 2、扫描二维码验证表单真伪。
- 3、●表示已经实缴, △表示欠费, ○表示外地转入, ─表示未制定计划。
- 4、工伤保险个人不缴费,如果工伤保险基数正常显示,一表示正常参保。
- 5、若参保对象存在在多个单位参保时,以参加养老保险所在单位为准。

打印时间: 2025-09-02

项目经理无在建承诺书

西峡县交通运输局__(招标人名称):

我方在此承诺,我方拟派往<u>西峡县交通运输局2025年农村公路桥梁改建(造)项目</u>(项目名称)<u>E4113231323000094</u>(项目编号)的项目经理<u>张职杨</u>(项目经理姓名)现阶段没有担任任何在建建设工程项目的项目经理,一旦查出自愿放弃中标资格。

我方保证上述信息的真实和准确,并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

特此承诺

投标人(电子签章): _	南阳华岳路桥工程有限公司
法定代表人(电子签名	3):
2025 年 9 月	10 日

(二) 主要人员简历表

姓名	王伟	年 龄	42岁	学 历	专科					
职称	工程师	职务	/	拟在本合同任职	项目总工					
毕业学校	毕业学校 2004 年毕业于 南阳理工大学 学校 建筑工程 专业									
	主要工作经历									
时间	参加过的类似项目			担任职务	发包人及联系电话					
2024. 5. 31- 2024. 7. 31	米坪大庄村至军马河鱼库(二期 道路改造等项目)			项目经理	西峡县交通运输局 0377-69663492					
2024. 8. 15– 2024. 12. 15		024年农村 第一标段	公路桥梁建 (施工标)	项目总工	西峡县交通运输局 0377-69663492					
A7 1.2.										

备注:

- 1、"主要人员简历表"中的项目经理应附身份证、注册证、学历证等资料复印件;
- 2、其他主要人员应附上岗证或执业证等资料复印件。









中华人民共和国二级建造师注册证书

姓 名: 王伟

性 别:男

出生日期: 1983-11-30

注册编号: 豫241202154735

聘用企业:南阳华岳路桥工程有限公司

注册专业: 市政公用工程 (2023年04月10日 至 2026年04月09日)

公路工程 (2024年05月13日 至 2027年05月12日)





个人签名: 支子

签名日期: 2026. 7. 5





河南省社会保险个人参保证明

(2025年)

单位:元

证件类型		居民身份证	证件号码	411330	198311302910	
社会保障号码	411330	411330198311302910		玉伟	性别	男
单位	名称	险种类型		起始年月	截止年月	
河南省中州公路	8工程有限公司	企业职工基本养老保险		200402	202304	
河南省中州公路工程有限公司		工伤保险		202012	202304	
南阳华岳路桥	工程有限公司	工伤保险		202304	-	
南阳华岳路桥	工程有限公司	企业职工基本养老保险		202305	=	
南阳华岳路桥工程有限公司		失业保险		202305 -		
河南省中州公路	B工程有限公司	失业保险		202012	202304	

缴费明细情况

基本养老		老保险	失业性	保险	工伤位	保险	
	参保时间	缴费状态	参保时间	缴费状态	参保时间	缴费状态	
月份	2004-02-20	参保缴费	2020-12-01	参保缴费	2020-12-15	参保缴费	
	缴费基数	缴费情况	缴费基数	缴费情况	缴费基数	缴费情况	
0 1	3756	•	3756	•	3756	-	
0 2	3756	•	3756	•	3756		
0 3	3756	•	3756	•	3756	_	
0 4	3756	•	3756	•	3756	_	
0 5	3756	•	3756	•	3756	=	
0 6	3756	•	3756	•	3756	-	
0 7	3756	•	3756	•	3756		
0 8	3756	•	3756	•	3756		
0 9		<u>les</u>		-	3756	<u> </u>	
1 0				-		=	
1 1		=		=		=	
1 2		=		-		-	

说明:

- 1、本证明的信息,仅证明参保情况及在本年内缴费情况,本证明自打印之日起三个月内有效。
- 2、扫描二维码验证表单真伪。
- 3、●表示已经实缴, △表示欠费, ○表示外地转入, -表示未制定计划。
- 4、工伤保险个人不缴费,如果工伤保险基数正常显示,一表示正常参保。
- 5、若参保对象存在在多个单位参保时,以参加养老保险所在单位为准。

打印时间: 2025-09-02

(二) 主要人员简历表

姓名	别萧萧	年 龄	31岁	学 历	专科
职称	助工	职务	/	拟在本合同任职	合同工程师
毕业学校	2016 年毕业于 开封大学 学校 建筑工程技术 专业				
主要工作经历					
时间	参加过的类似项目			担任职务	发包人及联系电话
2024. 8. 15 -2024. 12. 15	西峡县2024年农村公路桥 梁建设项目第一标段(施工 标)			合同工程师	西峡县交通运输局 0377-69663492
3. γ\tau.					

备注:

- 1、"主要人员简历表"中的项目经理应附身份证、注册证、学历证等资料复印件;
- 2、其他主要人员应附上岗证或执业证等资料复印件。





证书编号: Y0412401000901098

住房和城乡建设领域专业技术管理人员职业培训合格证

姓名:别萧萧

性别:男

身份证号: 411330199402090030

岗位名称:预算员

工作单位:南阳华岳路桥工程有限公司

证书有效期:2026年05月31日



本证书由河南省建设教育协会核发, 持证人已经通过考核,成绩合格。



实时数据, 扫码验证

发证机构:河南省建设教育协会

培训机构:河南华中职业技能培训学校

发证日期: 2024年05月81

查询网址: www. hreen. n



(2025年)

单位:元

					THE COLUMN TWO IS NOT			, , , , ,
证件类型	居民身份证			号码	411330	199402090	030	
社会保障号码	411330199402090030			名	别萧萧	1	生别	男
单位	单位名称 险种类型				起始年月	截」	上年月	
南阳华岳路桥	工程有限公司	失业保险			202106	-		
南阳华岳路桥	工程有限公司	工伤保险			202106	;=		
南阳华岳路桥	工程有限公司	企业职工基本养老保险			201704	_		
		the electric	tale vert					

缴费明细情况

	基本养老保险		失业	2保险	工伤	保险
月份	参保时间	缴费状态	参保时间	缴费状态	参保时间	缴费状态
月饭	2017-04-01	参保缴费	2021-06-01	参保缴费	2021-06-03	参保缴费
	缴费基数	缴费情况	缴费基数	缴费情况	缴费基数	缴费情况
0 1	3756	•	3756	•	3756	_
0 2	3756	•	3756	•	3756	-
0 3	3756	•	3756	•	3756	-
0 4	3756	•	3756	•	3756	-
0 5	3756	•	3756	•	3756	ī
0 6	3756	•	3756	•	3756	_
0 7	3756	•	3756	•	3756	
0 8	3756	•	3756	•	3756	-
0 9		-		-	3756	r r
1 0		-		-		-
11		1		_		-
1 2		3		_		9

说明:

- 1、本证明的信息,仅证明参保情况及在本年内缴费情况,本证明自打印之日起三个月内有效。
- 2、扫描二维码验证表单真伪。
- 3、●表示已经实缴, △表示欠费, ○表示外地转入, -表示未制定计划。
- 4、工伤保险个人不缴费,如果工伤保险基数正常显示,一表示正常参保。
- 5、若参保对象存在在多个单位参保时,以参加养老保险所在单位为准。

(二) 主要人员简历表

姓 名	李明星	年龄	35岁	学 历	本科
职 称		职务	/	拟在本合同任职	财务负责人
毕业学校		201	3 年毕业于	于 郑州大学 学校	会计学 专业
			主要	要工作经历	
时间	参加过的类似项目			担任职务	发包人及联系电话
2024. 8. 15 -2024. 12. 15	西峡县2024年农村公路桥 梁建设项目第一标段(施工 标)			财务负责人	西峡县交通运输局 0377-69663492
N.2.					

备注:

- 1、"主要人员简历表"中的项目经理应附身份证、注册证、学历证等资料复印件;
- 2、其他主要人员应附上岗证或执业证等资料复印件。







(2025年)

单位:元

证件类型	居民身份证			号码	411330	199001020525		
社会保障号码	411330	411330199001020525			李明星	SERVICE STREET	性别	女
单位。	名称	险种类型			起始年月	截止年月		
南阳华岳路桥	工程有限公司	企业职工基本养老保险			202402	=		
河南省中州公路	了工程有限公司	企业职工基本养老保险			201711	202401		
河南省中州公路	8工程有限公司	失业保险			202012	202401		
南阳华岳路桥	工程有限公司	失业保险			202402	=		
河南省中州公路	了工程有限公司	工伤保险			202012	202401		
南阳华岳路桥	工程有限公司	工伤保险	202401			=		

缴费明细情况

	基本养老	老保险	失业性	保险	工伤位	保险
п //	参保时间	缴费状态	参保时间	缴费状态	参保时间	缴费状态
月份	2017-11-01	参保缴费	2020-12-01	参保缴费	2020-12-16	参保缴费
	缴费基数	缴费情况	缴费基数	缴费情况	缴费基数	缴费情况
0 1	3756	•	3756	•	3756	-
0 2	3756	•	3756	•	3756	
0 3	3756	•	3756	•	3756	_
0 4	3756	•	3756	•	3756	20
0 5	3756	•	3756	•	3756	=
0 6	3756	•	3756	•	3756	-
0 7	3756	•	3756	•	3756	
0 8	3756	•	3756	•	3756	_
0 9		less		-	3756	_
1 0		=		-		=
1 1		=		=		=
1 2		=		=		-

说明:

- 1、本证明的信息,仅证明参保情况及在本年内缴费情况,本证明自打印之日起三个月内有效。
- 2、扫描二维码验证表单真伪。
- 3、●表示已经实缴, △表示欠费, ○表示外地转入, -表示未制定计划。
- 4、工伤保险个人不缴费,如果工伤保险基数正常显示,一表示正常参保。
- 5、若参保对象存在在多个单位参保时,以参加养老保险所在单位为准。

(二) 主要人员简历表

姓名	符家源	年 龄	27岁	学 历		专科				
职 称	助工	职务	/	拟在本合同任职		测量工程师				
毕业学校	2020 年5	华业于 河	南建筑耶	只业技术学院	学校	道路桥梁工程技术 专业				
	主要工作经历									
时间	参加法	过的类似项	· 目	担任职务		发包人及联系电话				
2024. 8. 15 -2024. 12. 15	西峡县2024年农村公路桥 梁建设项目第一标段(施工 标)		测量工程划	师	西峡县交通运输局 0377-69663492					

备注:

- 1、"主要人员简历表"中的项目经理应附身份证、注册证、学历证等资料复印件;
- 2、其他主要人员应附上岗证或执业证等资料复印件。





证书编号: Y0412400800900701

住房和城乡建设领域专业技术管理人员职业培训合格证

姓名:符家源

性别:男

身份证号: 411330199708101134

岗位名称:测量员

工作单位:南阳华岳路桥工程有限公司

证书有效期:2026年05月31日



本证书由河南省建设教育协会核发, 持证人已经通过考核,成绩合格。



实时数据, 扫码验证

发证机构:河南省建设教育协会

培训机构:河南华中职业技能培训学校

发证日期: 2024年05月81

查询网址: www. hneen. n



(2025年)

单位:元

证件类型	J	居民身份证			199708101134	
社会保障号码	411330	0199708101134	姓 名	符家源	性别男	
单位名称		险种类型		起始年月	截止年月	
南阳汉冶特钢有限公司		失业保险		202108	202203	
南阳华岳路桥	工程有限公司	工伤保险		202208	-	
河南圆方人力数字 公	AND THE SECOND S	工伤保险		201909	202103	
南阳华岳路桥	工程有限公司	失业保险		202208	=	
南阳汉冶特	钢有限公司	工伤保险	工伤保险 202107		202203	
南阳华岳路桥工程有限公司		企业职工基本养老保险		202208	=	
河南圆方人力资源	原管理有限公司1	工伤保险		201909	202103	

缴费明细情况

	基本养老	老保险	失业	保险	工伤	保险
月份	参保时间	缴费状态	参保时间	缴费状态	参保时间	缴费状态
月饭	2022-08-01	参保缴费	2021-08-01	参保缴费	2019-09-21	参保缴费
	缴费基数	缴费情况	缴费基数	缴费情况	缴费基数	缴费情况
0 1	3756	•	3756	•	3756	
0 2	3756	•	3756	•	3756	-
0 3	3756	•	3756	•	3756	===
0 4	3756	•	3756	•	3756	=
0 5	3756	•	3756	•	3756	=
0 6	3756	•	3756	•	3756	-
0 7	3756	•	3756	•	3756	-
0 8	3756	•	3756	•	3756	-
0 9		-		=	3756	_
1 0		=		=		=
11		=		=		=
1 2		=		-		-

说明:

- 1、本证明的信息,仅证明参保情况及在本年内缴费情况,本证明自打印之日起三个月内有效。
- 2、扫描二维码验证表单真伪。
- 3、●表示已经实缴, △表示欠费, ○表示外地转入, ─表示未制定计划。
- 4、工伤保险个人不缴费,如果工伤保险基数正常显示,一表示正常参保。
- 5、若参保对象存在在多个单位参保时,以参加养老保险所在单位为准。

(二) 主要人员简历表

姓名	杜伟刚	年 龄	37岁	学	历	专	纠
职称	工程师	职务	/	拟在本合同任职		试验检测匀	负责人
毕业学校	2021	年毕业于	南阳师	市范学院	学校	建筑工程技术	专业
			主要	要工作经历			
时间	参加过的类似项目			担任	职务	发包人及联	系电话
2024.8.16- 2024.12.16	西峡县2024年农村公路桥 梁建设项目第二标段(施工 标)			试验检测	训负责人	西峡县交通 0377-696	
<u>አ</u> ን ,				1		1	

备注:

- 1、"主要人员简历表"中的项目经理应附身份证、注册证、学历证等资料复印件;
- 2、其他主要人员应附上岗证或执业证等资料复印件。



中华人民共和国

居民身份证

签发机关 西峡县公安局

有效期限 2017.04.25-2037.04.25

姓名 杜伟刚

性别 男 民族汉

出生 1988 年 8 月 6 日

住址 河南省西峡县五里桥镇五 里桥村贾营组999号



公民身份号码 411330198808062035

从事专业道路与桥梁工程

取得职称名称工程师

取得职称级别

中级

取得方式评审

评审组织 與取粉评审委员会 (认定部门)

评审(认定) 2023.03 通过时间

发证单位 南阳市人力资源和社会保障局

杜伟刚

为

1988.08 出生年月

河南省中州公路工程有限公司

C202209B6132307400051

书编号 2023 05 05 年 月 日

 \bigcirc



(2025年)

单位:元

证件类型	居民身份证		证件号码	411330	198808062035		
社会保障号码	411330	0198808062035	姓 名	杜伟刚	性别男		
单位	名称	险种类型		起始年月	截止年月		
中铁大桥局集团第-	一工程有限公司(B)	工伤保险		200912	201307		
河南劳学人力资	源服务有限公司	工伤保险		201301	201212		
中铁大桥局集团第-	一工程有限公司(B)	工伤保险		201308	201307		
河南劳学人力资源	原服务有限公司(B)	工伤保险		201209	201212		
河南劳学人力资源	原服务有限公司(B)	工伤保险		201301	201212		
中铁大桥局集团第	第一工程有限公司	工伤保险		201308	201307		

缴费明细情况

	基本养老保险		失业	保险	工伤	保险
	参保时间	缴费状态	参保时间	缴费状态	参保时间	缴费状态
月份	2013-10-01	参保缴费	2020-12-01	参保缴费	2009-12-01	参保缴费
	缴费基数	缴费情况	缴费基数	缴费情况	缴费基数	缴费情况
0 1	3756	•	3756	•	3756	-
0 2	3756	•	3756	•	3756	_
0 3	3756	•	3756	•	3756	=
0 4	3756	•	3756	•	3756	<u></u>
0 5	3756	•	3756	•	3756	777.0
0 6	3756	•	3756	•	3756	=
0 7	3756	•	3756	•	3756	-
0 8	3756	•	3756	•	3756	
0 9		Pala		×22	3756	프
1 0				-		-
1 1		=		=		=:
1 2		=		=		-

说明:

- 1、本证明的信息,仅证明参保情况及在本年内缴费情况,本证明自打印之日起三个月内有效。
- 2、扫描二维码验证表单真伪。
- 3、●表示已经实缴, △表示欠费, ○表示外地转入, -表示未制定计划。
- 4、工伤保险个人不缴费,如果工伤保险基数正常显示,一表示正常参保。
- 5、若参保对象存在在多个单位参保时,以参加养老保险所在单位为准。

(二) 主要人员简历表

姓名	曹广兴	年 龄	44岁	学 历	专科
职称	助工	职务	/	拟在本合同任职	质检工程师
毕业学校	200	03 年毕业	于河南	工业技术学院 学校	市场营销 专业
			主要	要工作经历	
时间	参加法	过的类似巧	页目	担任职务	发包人及联系电话
2024.8.16- 2024.12.16	西峡县2024年农村公路桥 梁建设项目第二标段(施工 标)			质检工程师	西峡县交通运输局 0377-69663492

备注:

- 1、"主要人员简历表"中的项目经理应附身份证、注册证、学历证等资料复印件;
- 2、其他主要人员应附上岗证或执业证等资料复印件。







证书编码: 0412410900020000062

住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训合格证



姓 名: 曹广兴

身份证号: 41133019810710153X

岗位名称: 市政工程质量员

参加住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训,测试成绩合格。



扫码验证

培训机构:漯河市德众建设工程技术培训中心

发证时间: 2024年06月12日

查询地址: http://rcgz.mohurd.gov.cn



(2025年)

单位:元

证件类型	3	居民身份证	证件号	码	411330	019810710153X		
社会保障号码	411330	019810710153X	姓名	名	曹广兴	男		
单位	名称	险种类型		j	起始年月	截止年月		
河南省中州公路	8工程有限公司	失业保险			202012	202106		
南阳华岳路桥	工程有限公司	失业保险			202106)=		
南阳华岳路桥	工程有限公司	工伤保险			202106	-		
南阳华岳路桥工程有限公司		企业职工基本养老保险			202106	<u>~</u>		
河南省中州公路	中州公路工程有限公司 工伤保险			202012 2021			6	
河南省中州公路	8工程有限公司	企业职工基本养老保险	200307 20			20210	6	

缴费明细情况

	基本养老	老保险	失业性	保险	工伤位	保险
П //\	参保时间	缴费状态	参保时间	缴费状态	参保时间	缴费状态
月份	2003-07-20	参保缴费	2020-12-01	参保缴费	2020-12-16	参保缴费
	缴费基数	缴费情况	缴费基数	缴费情况	缴费基数	缴费情况
0 1	3756	•	3756	•	3756	-
0 2	3756	•	3756	•	3756	_
0 3	3756	•	3756	•	3756	-
0 4	3756	•	3756	•	3756	=
0 5	3756	•	3756	•	3756	==
0 6	3756	•	3756	•	3756	-
0 7	3756	•	3756	•	3756	-
0 8	3756	•	3756	•	3756	_
0 9		Page 1			3756	2
1 0		=		-		=
11		=		=		=
1 2		=		-		-

说明:

- 1、本证明的信息,仅证明参保情况及在本年内缴费情况,本证明自打印之日起三个月内有效。
- 2、扫描二维码验证表单真伪。
- 3、●表示已经实缴, △表示欠费, ○表示外地转入, -表示未制定计划。
- 4、工伤保险个人不缴费,如果工伤保险基数正常显示,一表示正常参保。
- 5、若参保对象存在在多个单位参保时,以参加养老保险所在单位为准。

(二) 主要人员简历表


姓 名	靳志强	年龄	44岁	学 历	专科
职称	助工	职务	/	拟在本合同任职	专职安全员
毕业学校	20)16 年毕	业于 国	家开放大学 学校 建	筑施工与管理 专业
			主要	要工作经历	
时间	参加	过的类似	项目	担任职务	发包人及联系电话
2024.8.16- 2024.12.16		024年农村 目第二标 标)	村公路桥 設(施工	专职安全员	西峡县交通运输局 0377-69663492

备注:

- 1、"主要人员简历表"中的项目经理应附身份证、注册证、学历证等资料复印件;
- 2、其他主要人员应附上岗证或执业证等资料复印件。

公路水运工程施工企业主要负责人和安全生产

管理人员安全生产考核合格证书



姓名:靳志强

性别:

眠

出生年月: 1981-12-10

身份证号: 41133019811270003%

合格,特发此证。

企业名称:南阳华岳路桥工程有限公司

证书编号:豫交安C22G00313

2022-02-24 有效期:

考核部门:河南省交通运输厅


阳

2028-02-24

中华人民共和国交通运输部監制

ltgc.hncd.cn/QY/DYZSiGR_DYZS.asp?UserID=2023092110225072488946&CertificateId=4100002025022018071999141740



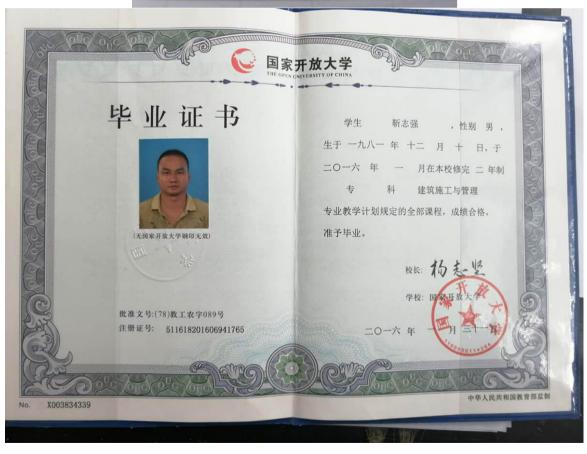



(2025年)

单位:元

证件类型		居民身份证	Market Co.		311210003X	
社会保障号码	41133	019811210003X	姓 名	名 靳志强 性兒		
单位名	名称	险种类型	走	已始年月	截止年月	
河南省中州公路	工程有限公司	失业保险	2	202110	202304	
南阳华岳路桥	工程有限公司	失业保险	2	202106	202109	
南阳华岳路桥	工程有限公司	企业职工基本养老保险	2	202106	202109	
河南省中州公路工程有限公司		失业保险	2	202012	202106	
南阳华岳路桥工程有限公司		工伤保险	2	202304	_	
南阳华岳路桥工程有限公司		企业职工基本养老保险	2	202305	-	
河南省中州公路工程有限公司		工伤保险	2	202109	202304	
河南省中州公路工程有限公司		企业职工基本养老保险	2	202110	202304	
河南省中州公路工程有限公司		企业职工基本养老保险	2	200801	202106	
河南省中州公路工程有限公司		工伤保险	2	202012 20210		
南阳华岳路桥	南阳华岳路桥工程有限公司 失业位			202305		
南阳华岳路桥	工程有限公司	工伤保险	202106		202109	

缴费明细情况

基本养	基本养老保险		保险	工伤	保险
参保时间	缴费状态	参保时间	缴费状态	参保时间	缴费状态
2008-01-20	参保缴费	2020-12-01	参保缴费	2020-12-16	参保缴费
缴费基数	缴费情况	缴费基数	缴费情况	缴费基数	缴费情况
3756	•	3756	•	3756	-
3756	•	3756	•	3756	_
3756	•	3756	•	3756	-
3756	•	3756	•	3756	-
3756	•	3756	•	3756	-
3756	•	3756	•	3756	_
3756	•	3756	•	3756	=
3756	•	3756	•	3756	-1
	-		-	3756	=
	-21		8 <u>—</u> 8		22)
	=		Е		-
	-		-		-
	参保时间 2008-01-20 缴费基数 3756 3756 3756 3756 3756 3756	参保时间 缴费状态 2008-01-20 参保缴费 缴费基数 缴费情况 3756	参保时间 缴费状态 参保时间 2008-01-20 参保缴费 2020-12-01 缴费基数 缴费基数 3756 ● 3756 3756 ● 3756 3756 ● 3756 3756 ● 3756 3756 ● 3756 3756 ● 3756 3756 ● 3756 3756 ● 3756 3756 ● 3756 3756 - 3756 - - - - - - - - - - - -	参保时间 缴费状态 参保时间 缴费状态 2008-01-20 参保缴费 2020-12-01 参保缴费 缴费基数 缴费情况 缴费基数 缴费情况 3756 ● 3756 ● 3756 ● 3756 ● 3756 ● 3756 ● 3756 ● 3756 ● 3756 ● 3756 ● 3756 ● 3756 ● 3756 ● 3756 ● 3756 ● 3756 ● 3756 ● 3756 ● 3756 ● 3756 ● 3756 ● 3756 ● 3756 ● 3756 ● 3756 ● 3756 ● 3756 ● 3756 ● 3756 ● 3756 ●	参保时间 缴费状态 参保时间 缴费状态 参保时间 2008-01-20 参保缴费 2020-12-01 参保缴费 2020-12-16 缴费基数 缴费基数 缴费基数 缴费基数 3756 ● 3756 ● 3756 3756 ● 3756 ● 3756 3756 ● 3756 ● 3756 3756 ● 3756 ● 3756 3756 ● 3756 ● 3756 3756 ● 3756 ● 3756 3756 ● 3756 ● 3756 3756 ● 3756 ● 3756 3756 ● 3756 ● 3756 3756 ● 3756 ● 3756 - - - 3756

沿田.

- 1、本证明的信息,仅证明参保情况及在本年内缴费情况,本证明自打印之日起三个月内有效。
- 2、扫描二维码验证表单真伪。
- 3、●表示已经实缴, △表示欠费, ○表示外地转入, -表示未制定计划。
- 4、工伤保险个人不缴费,如果工伤保险基数正常显示,一表示正常参保。

表单验证号码da47eafbb1ca49149c51e1824ab46d9a



五、主要机械设备和试验检测设备配备表

设备名称	规格、功率及容量	单位	数量
装载机	ZL50	台	4
挖掘机	PC220	台	6
履带式推土机	D120	台	4
振动压路机	YZ20	台	4
自卸汽车	解放	台	25
洒水车	东风	台	3
抽水机		台	20
沥青砼拌和机	3000	台	2
橡胶沥青反应设 备	VSS	台	2
智能沥青洒布车	ZZ5256GLQ	台	3
摊铺机	ABG423	台	4
装载机	ZL50	台	3

双钢轮压路机	SW850	台	4
石屑洒布机	东风	台	2
自卸汽车	解放	台	45
洒水车	东风	台	2
灭火鼓风机		台	28
小型压路机	小型压路机	台	1
土壤无侧限仪	WE-2	台	1
土壤液塑限联合测定	LH-100	台	1
光电液塑限仪	SDY-1	台	1
土样分析筛		台	1
灌砂筒		台	6
烘箱		台	1
土工试验模具		台	2
含水量测定仪		台	1

经纬仪	JD2	台	2
水准仪	NA2	台	2
压力试验机	WEY-2000D	台	1
塌落度测定仪	300*200*100	台	3
砼回弹仪	HT75	台	1
水泥稠度凝结时 间测定仪	300±2G	台	1
砼振动台	1M3	台	2
砼贯入阻力仪	HG80S	台	1
砼切片机	HQP-150	台	1
容量筒	1∼30L	台	2
架盘天平	JPT-2	台	1
台秤	TGT-100	台	1
保温箱	40DL-160	台	1
水泥筛		台	5

砂浆稠度仪	CS145	台	5
布氏旋转粘度检 测仪	LD-21	台	2
软化点仪	HYD-300	台	4
标准筛(方孔筛)		台	10
烘箱	300LHS	台	2
脱模器		台	4
马歇尔实验仪	GTT-S	台	1
马歇尔试件击实 仪	DLO	台	3
恒温水箱		台	
冰箱	190L	台	1
沥青混合料抽提 仪	CTH-400	台	2
路面取芯机	FY-20	台	2
路面平整度仪	DH-3	台	4
马歇尔实验仪		台	1

七、资格审查资料

(一) 投标人基本情况表

投标人名称	南阳华岳路桥工程有限公司							
注册地址	西峡县五里桥镇工业大道中段东侧			邮政编码		474	500	
联 五十	联系人	胡博		电话	13525119056		119056	
联系方式	传真	/		电子邮件		,	/	
法定代表人	姓名	刘溪洋	技术职称	助工	电	话	助工	
技术负责人	姓名	胡博	技术职称	高级工程 师	电话		高级工程 师	
成立时间	2016年6	月14日		员工总人	数: 6	5人		
企业资质等级	公路工程施工/ 市政公用工程	建筑工程施工总承包贰级、公路工程施工总承包贰级、市政公用工程施工总承包贰级、		项目经理			15人	
营业执照号	91411323MA	3XARWX4L	 其中	高级职称人员			2人	
注册资金	40007	4000万元		中级职称人员		16人		
基本账户开户 银行	中国建设银行股份有限公 司西峡县支行 41050175690800000073			初级职称人员			30人	
基本账户账号						25人		
经营范围	许可项目:建设工程施工;输电、供电、受电电力设施的安装、维修和记验;地质灾害治理工程施工;电气安装服务;建筑劳务分包;公路管理与养护;建筑物拆除作业(爆破作业除外);路基路面养护作业;施工专业作业(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:对外承包工程。园林绿化工程施工;体育场地设施工程施工;普通机械设备安装服务;土石方工程施工;机械设备租赁;建筑工程机械与设备租赁;运输设备租赁服务;办公设备租赁服务;特种设备出租;市政设施管理;环境卫生公共设施安装服务;电气设备修理;交通设施维修;水泥制品制造;建筑材料销售;水泥制品销售;砼结构构件销售;工程管理服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)				公路 范			
资产构成情况 及投资参股的 关联企业情况								

备注

注:在本表后附企业法人营业执照副本的复印件(并加盖单位章)、资质证书副本的复印件(并加盖单位章)、安全生产许可证副本的复印件(并加盖单位章)、基本账户开户许可证的复印件(并加盖单位章)。

1、企业法人营业执照等



2、资质证书



业企业资质证书

(副本)

南阳华岳路桥工程有限公司

西峡县五里桥镇工业大道中段东侧

统一社会信用代码 (或营业执照注册号): 91411323MA3XARWX4L 法定代表人: 刘溪洋

经济性质: 其他有限责任公司 4000万元人民币

D341548171 期:至2028年06月08日

资质类别及等级: 建筑工程施工总承包贰级 公路工程施工总承包贰级 市政公用工程施工总承包贰级 施工劳务不分等级

发证机关:

2023年12月01日

中华人民共和国住房和城乡建设部制

全国建筑市场监管公共服务平台查询网址: http://jzsc.mohurd.gov.cn

NO.DF 22710808

3、安全生产许可证



62

4、开户许可证

基本存款账户信息

账户名称: 南阳华岳路桥工程有限公司

账户号码: 41050175690800000073

开户银行:

中国建设银行股份有限公司西峡支行

法定代表人:

刘溪洋

(单位负责人)

基本存款账户编号: J5135000446304


2023年11月27日 西峽县建行

102001L4i1701073272800519

(二) 近年财务状况

提供近三年(2022年度、2023年度、2024年度)经会计师事务所或审计机构审计的财务报告,新成立企业,不足三年的,按已有年份提供;

2022年财务报表

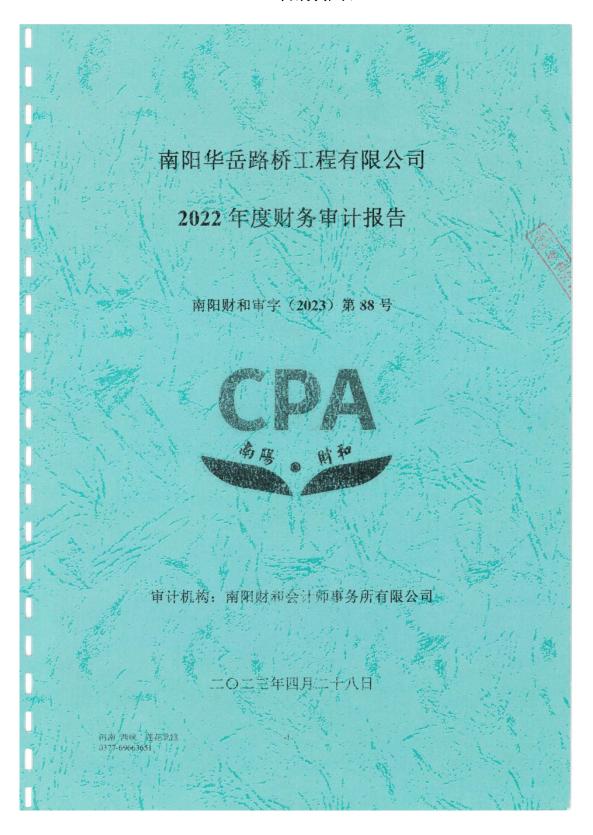

南阳财和会计师事务所有限公司 地址:南阳市西峡县莲花北路 369 号 电话: (0377) 69663651 13703412775

目 录

内	容	页 次
٠,	审计报告	1-6
_,	已审财务报表	

- 、 口甲则分报农
 - 1. 资产负债表
 - 2. 利润表
 - 3. 现金流量表
 - 4. 所有者权益变动表
 - 5. 财务报表附注

1-21

三、资格证明

- 1. 营业执照
- 2. 执业证书
- 3. 注册会计师证书

审计报告

南阳财和会审字[2023]第 88 号 南阳华岳路桥工程有限公司全体股东:

一、审计意见

我们审计了后附的南阳华岳路桥工程有限公司(以下简称华岳路桥公司)财务报表,包括2022年12月31日资产负债表,2022年度利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及财务报表附注。

我们认为,华岳路桥公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了华岳路桥公司 2022 年 12 月 31 日的财务状况以及 2022 年度经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于华岳路桥公司,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

三、管理层和治理层对财务报表的责任

华岳路桥公司管理层(以下简称管理层)负责按照企业会计准则 的规定编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护必要 的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时,管理层负责评估华岳路桥公司的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非管理层计划清算华岳路桥公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督华岳路桥公司的财务报告过程。

四、其他信息

华岳路桥公司管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。 我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息,我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计,我们的责任是阅读其他信息,在此过程中,考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。基于我们已执行的工作,如果我们确定其他信息存在重大错报,我们应当报告该事实。在这方面,我们无任何事项需要报告。

五、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致 的重大错报获取合理保证,并出具包含审计意见的审计报告。合理保 证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重 大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致,如果合理预 期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出 的经济决策,则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判断,并 保持职业怀疑。同时,我们也执行以下工作:

- (1)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险,设计和实施审计程序以应对这些风险,并获取充分、适当的审计证据,作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上,未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险。
- (2)了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
- (3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
- (4)对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据 获取的审计证据,就可能导致对华岳路桥公司持续经营能力产生重大 疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结 论认为存在重大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报表 使用者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表 非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而, 未来的事项或情况可能导致华岳路桥公司不能持续经营。
- (5)评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露),并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
- (6) 就华岳路桥公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据,以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和 河南 西峽 莲花北路 55-0377-69663651

执行集团审计,并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通,包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

南阳财和会计师事务所有限公司

中国注册会计师:

长布

中国注册会计师: 2000年

河南•西峡

二〇二三年四月二十八日

览, 负吸表

资	イルル	什 上	期末巻	6 冊 2 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 7 6 7 6 7 6 7 6	行次	年利都	規木数
	17.5	十四次	7471.50	ススペーコロン		22.22	
流动资金:				流动负债:			
货币资金	-	60,769.28	128,146.52	短期借款	51	1,000,000.00	2,800,000.00
短期投资	2			应付票据	52		
应收票据	3	-		应付账款	53	40,589,134.46	21,038,529.98
应收账款	4	43,883,104.93	51,487,721.73	预收账款	54	50,512.00	1,333,836.80
减:坏账准备	2			应付内部单位款	22		
预付账款	9	613,278.74	372,370.36	其他应付款	99	12,746,145.93	1,108,880.33
应收内部单位款	7			应付工资	57	573,650.00	884,883.00
备用金	8			其中:含量工资包干节9	58		
其他应收款	6	-509,589.82	5,260,560.92	应付福利费	59		
待摊费用	10			未交税金	09	-209,658.17	-115,985.80
存货	11	6,515,516.31	8,809,368.73	未付利润	61		
其中:在建工程	12			其他未交款	62		
待处理流动财产净损失	13			预提费用	63		
-年內到期的长期债券投	18			一年內到期的长期负债	64		
其他流动资产	19			其他流动负债	65		
流动资产合计	20	50,563,079.44	66,058,168.26	流动负债合计	70	54,749,784.22	27,050,144.31
长期投资:				长期负债:			
长期投资	21			长期借款	71		
拨付所属资金	22			应付债券	72		
固定答序:				长期应付款	73		
固定资产原价	25	14,467,697.46	15,466,438.59	其他长期负债	92		
减:累计折旧	56	11,346,484.26	12,860,018.61	其中:专项应付款	77		
固定资产净值	27	3,121,213.20	2,606,419.98	住房周转金	78		
固定资产清理	28			长期负债合计	82		
待处理固定资产净损失	59			递延税项:			
固定资产合计	32	3,121,213.20	2,606,419.98	递延税款贷项	83		
专项工程:				负债合计	98	54,749,784.22	27,050,144.31
	-			所有者权益:			
无形资产及递延资产合计	40	-		实收资本	87	5,950,000.00	5,950,000.00
其他资产:				上级拨入资金	88		
临时设施	41			资本公积	83		36,644,063.55
减:临时设施摊销	42			盈余公积	06		
临时设施净值	43			其中:公益金	92		
临时设施清理	44			未分配利润	92	-7,015,491.58	-979,619.62
其他长期资产	46			专项储备		1	•
其他资产合计	47			A STATE OF THE PERSON NAMED IN COLUMN			
递延税项:							
递延税款借项	48			所有者权益合计	66	-1,065,491.58	41,614,443.93
松本出	50	53 684 292 64	68 664 588 24	仓保及所有者权益总计	100	53.684.292.64	68.664.588.24

70

利 润 表

编制单位:南阳华岳路桥工程有限公司	in'	编制日期: 2022年12月30日	单位: 元
项	行次	本月数	本年累计数
一,工程结算收入	1	13,296,135.91	34,231,256.90
减:工程结算成本	2	11,521,812.94	23,688,259.48
工程结算税金及附加	3	25,095.10	125,843.71
二,工程结算利润	5	1,749,227.87	10,417,153.71
加:其他业务利润	9	-456,616.22	-306,851.19
减:管理费用	7	1,254,177.60	4,017,938.86
财务费用	8	9,508.03	57,580.34
三,营业利润	10	28,926.02	6,034,783.32
加:按资收益	11		
营业外收入	12	0.00	54,104.33
用含量工资节余弥补利润	13		
减:营业外支出	15	0.00	53,015.69
结转的含量工资包干节余	16		
加:以前年度损益调整	18	0.00	0.00
四,利润总额	19	28,926.02	6,035,871.96
减:所得税	21		
五, 俸利润	22	28,926.02	6,035,871.96

制表人:王晶晶

财务负责人: 张远远

单位负责人: 王海伟

71

	强	金	流 量 表		
编制单位: 南阳华岳路桥工程有限公司	確制	编制日期: 2022年12月31日			单位: 元
	行次	金额	补充资料	行次	金额
一、经营活动产生的现金流量:			1、将净利润调节为经营活动现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	-	30,990,778.02	净利润	57	6,035,871.96
收到的税费返还	က		加: 计提的资产减值准备	58	
收到的其他与经营活动有关的现金	00	54,104.33	固定资产折旧	59	1,513,534.35
现金流入小计	o	31,044,882.35	无形资产摊销	9	
购买商品、接受劳务支付的现金	10	46,132,239.05	长期待摊费用摊销	61	
支付给职工以及为职工支付的现金	12	3,398,420.01	待摊费用减少(减:增加)	64	
支付的各项税费	13	1,070,630.57	预提费用增加(减:减少)	65	
支付的其他与经营活动有关的现金	18	17,763,957.56	处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)	99	53,015.69
现金流出小计	20	68,365,247.19	固定资产报废损失	67	
经营活动产生的现金流量净额	21	-37,320,364.84	财务费用	89	57,580.34
二、投资活动产生的现金流量:		0000000	投资损失(减:收益)	69	
收回投资所收到的现金	22		递延税款贷项(减:借项)	70	
取得投资收益所收到的现金	23		存货的减少(减:增加)	71	-2,293,852.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	25	W	经营性应收项目的减少(减;增加)	72	-13,133,859.16
收到的其他与投资活动有关的现金	28		经营性应付项目的增加(减:减少)	73	-29,499,639.91
现金流入小计	29		其他	74	-53,015.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	30	998,741.13	经营活动产生的现金流量净额	75	-37,320,364.84
投资所支付的现金	31				
支付的其他与投资活动有关的现金	35				
现金流出小计	36	998,741.13			
投资活动产生的现金流量净额	37	-998,741.13	-998,741.13 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动:		
三、筹资活动产生的现金流量:			债务转为资本	76	
吸收投资所收到的现金	38	36,644,063.55	一年内到期的可转换公司债券	77	
借款所收到的现金	40	1,800,000.00	融资租入固定资产	78	
收到的其他与筹资活动有关的现金	43				
现金流入小计	44	38,444,063.55			
偿还债务所支付的现金	45				
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	46	57,580.34	57,580.34 3、现金及现金等价物净增加情况:		
支付的其他与筹资活动有关的现金	52		现金的期末余额	79	128,146.52
现金流出小计	53	57,580.34	减; 现金的期初余额	80	60,769.28
筹资活动产生的现金流量净额	54	38,386,483.21	加: 现金等价物的期末余额	81	
四、汇率变动对现金的影响	55		减: 现金等价物的期初余额	82	
五、现金及现金等价物净增加额	29	67,377.24	现金及现金等价物净增加额	83	67,377.24

72

企业负责人:王海伟

制表人: 王晶晶

所有者权益(股东权益)变动表 2023年度

单位: 元

岭割 鱼份, 南阳华兵路桥丁程有限公司	公司			2022	2022年度						単位: 元
						本期					
	4	#	甘柏权為丁具			地	其他综合	专项储	みる小部	十个配利油	所有者权益合计
项目	秋坂郊本 (吳 昭木)	伊佐路	市公里十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二	井伊	资本公积	4股	校群		館米なた	本力 ALATIN	
1. 子艺士 人能	5.950,000.00	- י	-	1		-				-7,015,491.58	-1,065,491.58
、上中別不宗敎	and the state of t										
加: 会计政策变更											
前期差错更正											
其他										-7.015,491.58	-1,065,491.58
二、本年期初余额	5,950,000.00	'		'	'		1			6.035,871.96	L
三、本期增减变动金额(减少以"-"号填列)	1	'	•		36,644,063.55	1				6.035.871.96	
(一) 综合收益总额										1	
(二) 所有者投入和减少资本	1	'	'		36,644,063.55		'	'			
. 所有者投入的普通股											
2.其他权益工具持有者投入资本											
3.股份支付计入所有者权益的金额											36,644,063.55
4.其他					36,644,063.55						
(三) 利润分配	1	'	'	1	'	•	'				
1.提取盈余公积											
2.对所有者(或股东)的分配											'
3.其他											
(四) 所有者权益内部结转				1	-	'					'
1.资本公积转增资本(或股本)								1			'
2.盈余公积转增资本(或股本)						1		-	-		
3.盈余公积弥补亏损								-			
4.其他											
(五) 专项储备	-	1	'		'	<u>'</u>					
1.本期提取								-	-		
2.本期使用						-		1	-		
(六) 其他										-979,619.62	62 41,614,443.93
四、本期期末余额	5,950,000.00		'		36,644,063.55	8					

企业负责人; 王海伟 财务负责人; 张远远 制表人; 张远远

会计报表附注

截止 2022 年 12 月 31 日

金额单位: 人民币元

注释一: 公司简介

南阳华岳路桥工程有限公司(以下简称本公司)于 2016 年 6 月 14 日取得西峡县市场监督管理局核发的营业执照,注册号 91411323MA3XARWX4L,法定代表人:王海伟;注册资本 600 万元,经营范围:建设工程施工,输电、供电、受电电力设施的安装维修和试验,地质灾害治理工程施工,电气安装服务:建筑劳务分包,公路管理与养护,建筑物拆除作业 (爆破作业除外)等。

注释二: 财务报表的编制基础

一、编制基础

本公司财务报表以《企业会计准则》为编制基础。

二、遵循企业会计准则的声明

本公司声明,本公司编制的财务报表已按《企业会计准则》及相 关的规定编制,符合《企业会计准则》及规定的要求,真实、完整地 反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量情况。

三、重要会计政策、会计估计的说明

本财务报表所载财务信息根据下列主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法编制。

1、会计制度 -

公司执行《企业会计准则》的规定。

2、会计年度

本公司会计年度采用公历年度,即每年自1月1日起至12月31日止。

3、记账本位币

本公司记账本位币和编制本财务报表所采用的货币为人民币。除 有特别说明外,金额单位均以人民币元表示。

4、记账基础及计价原则

公司采用借贷记账法,以权责发生制为记账基础,以历史成本为 计价原则。

5、现金流量表之现金及现金等价物的确定标准 本公司现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。 现金流量表之现金等价物指持有期限短(一般是指从购买日起六个月 内到期)、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小 的投资及银行承兑汇票。

- 6、应收款项坏账损失核算方法
- (1) 坏账损失确认标准:
- A、因债务人破产或死亡,以其破产财产或遗产清偿后,仍然不能收回的应收款项;
- B、因债务人逾期未履行偿债义务,超过三年仍然不能收回的应收款项;
 - C、有确凿的证据表明不能收回的应收款项。

以上确实不能收回的应收款项,按国家规定的审批核销权限分级

批准后,作为坏账核销。

(2)公司坏账核算方法:采用直接转销法核算。不计提坏账准备,在实际发生坏账损失时直接计入当期损益。

7、存货计价方法

本公司存货主要包括原材料、在产品、产成品及商品、低值易耗品。

- (1) 存货取得的计价方法: 购入原材料以买价加运输、装卸、 保险等费用作为实际成本; 产成品以制造和生产过程中发生的实际数 量乘以计划价核算。
 - (2) 存货发出的计价方法: 采用计划价法计价。
 - (3) 低值易耗品和包装物的摊销方法: 采用一次转销法。
 - (4) 存货的盘存制度: 永续盘存制。
- (5) 期末存货计价原则及存货跌价准备确认标准和计提方法: 期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价;期末,在对存货进行全面盘点的基础上,对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因,预计其成本不可收回的部分,提取存货跌价准备。存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取,可变现净值按估计售价减去估计完工成本、销售费用和税金后确定。

8、长期投资核算方法

债券投资的收益按照投资债券的面值及债券利率计算当年应计利息,计入当年损益。

长期股权投资,投资额占被投资单位权益资本 20%以下的采用成本法核算,20%-50%采用权益法,50%以上的采用成本法核算。

9、固定资产

- (1)固定资产标准:固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的,使用寿命超过一个会计年度的有形资产。
 - (2) 固定资产的确认条件:

与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业;

该固定资产的成本能够可靠计量。

- (3)固定资产分类:固定资产包括房屋建筑物、生产设备、运输设备、电子设备及其他等。
 - (4) 固定资产计价:

外购的固定资产,以实际支付的购买价款、相关税费、使固定资产达到预定可使用状态前所发生的归属于该项资产的运输费、装卸费、安装费和专业人员服务费等作为该项固定资产的初始成本。

自行建造的固定资产,以建造该项资产达到预定可使用状态前所 发生的必要支出作为该项固定资产的初始成本。

投资者投入的固定资产,以投资合同或协议约定的价值为该项固 定资产的初始成本。

(5) 固定资产折旧:

固定资产折旧以预计使用年限在预留 5%的残值后采用直线法计算,并按固定资产类别,预计使用年限确定折旧率。

固定资产分类预计折旧年限及年折旧率如下表:

类 别	折旧年限(年)	年折旧率(%)
房屋建筑物	20	4.75
生产设备	10	9.50
运输设备	5	19.00
电子设备及其他	5.	19.00

(6)固定资产后续支出的处理:固定资产后续支出在同时满足下面条件时计入固定资产成本,如有替换部分,应扣除其账面价值: (1)与该支出有关的经济利益很可能流入企业;(2)该后续支出的成本能可靠地计量。不符合上述条件的固定资产后续支出,在发生时计入当期损益。

以经营租赁方式租入固定资产发生的改良支出,予以资本化,作为长期待摊费用,在合理的期间摊销。

10、在建工程

- (1)在建工程的计价:按实际发生的支出确定工程成本。自营工程按直接材料、直接工资、直接施工费等计量;出包工程按应支付的工程价款等计量;设备安装工程按所安装设备的价值、安装费用、工程试运转等所发生的支出确定工程成本。
- (2) 在建工程结转固定资产的时点:本公司建造的固定资产在 达到预定可使用状态之日起,根据工程预算、造价或工程实际成本等, 按估计的价值结转固定资产,次月起开始计提折旧。
- 11、借款费用的会计处理方法

借款费用包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因

外币借款而发生的汇兑差额等。公司发生的借款费用,可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的,予以资本化,计入相关资产成本;其他借款费用,在发生时根据其发生额确认为费用,计入当期损益。

(1) 资本化条件

在同时具备下列三个条件时,借款费用予以资本化:

资产支出已经发生;

借款费用已经发生:

为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。

(2) 资本化金额的确定

资本化金额按以下原则确定:

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的,以专门借款当期实际发生的利息费用,减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。

为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的,根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率,计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

(3) 暂停资本化

若固定资产的购建活动发生非正常中断,并且中断时间连续超过 3 个月,则暂停借款费用的资本化,将其确认为当期费用,直至资产 的购建活动重新开始。

(4) 停止资本化

当所购建的固定资产达到预定可使用状态时,停止其借款费用的 资本化,以后发生的借款费用于发生当期确认为费用。

12、无形资产

(1) 无形资产计价: 无形资产按实际成本进行初始计量。自行 开发的无形资产,其成本包括自满足一定条件后达到预定用途前所发 生的支出总额。

(2) 无形资产摊销:

公司无形资产自取得当月起在预计使用年限内分期平均摊销,计入损益。合同规定有受益期限的,在受益期限内平均摊销,合同没有规定受益期限而法律规定有效期限的,按不超过法律规定的有效期限平均摊销;合同规定了受益期限而法律也规定了有效期限的,摊销年限不超过两者之中较短者;合同和法律均未规定受益期限或有效期限的,按不超过10年的期限摊销。

13、收入确认原则

本公司的营业收入主要包括销售商品收入,其收入确认原则如下:

- (1)本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方:
- (2)本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权,也 没有对已售出的商品实施有效控制;
 - (3) 收入的金额能够可靠地计量;
 - (4) 相关的经济利益很可能流入企业:
 - (5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

14、成本费用的确认原则

本公司在生产经营中发生的各项费用,以实际发生数计入成本、 费用。期间费用直接计入当期损益,成本计入所生产的产品、提供劳 务的成本。

15、员工社会保障及福利的内容、计提方法和会计处理方法

本公司员工社会保障及福利主要根据国家和当地政府有关规定 及公司的制度按比例提取并向指定机构缴付社会保险统筹,所需费用 直接计入成本费用。

16、所得税的会计处理方法

本公司所得税的会计核算采用应付税款法核算。

17、利润分配方法

利润分配由本公司依据《中华人民共和国公司法》及本公司章程 决议制定,在弥补以前年度未弥补亏损后按以下比例分配:

- (1) 按净利润的 10%提取法定盈余公积金;
- (2) 按净利润的 5%提取法定公益金(2,006, 年1月1日执行新《公司法》后本公司根据修改后的章程不再计提法定公益金,原法定公益金余额根据财政部财企[2,006,] 67号文的有关规定转入盈余公积);
 - (3) 提取任意盈余公积, 具体比例由股东会决定;
 - (4) 向投资人分配利润。

四、主要税项

1、增值税

本公司商品销售收入适用的增值税。其中:内销商品销项税率为9%。

本公司购买原材料等所支付的增值税进项税额可以抵扣销项税。 本公司的增值税应纳税额为当期销项税抵减当期进项税后的余 额。

2、城市维护建设税

按实际缴纳的流转税的5%缴纳。

3、教育费附加、地方教育费附加

教育费附加按实际缴纳的流转税的 3%缴纳, 地方教育费附加按 实际缴纳的流转税的 2%缴纳。

4、企业所得税

本公司企业所得税的适用税率 2007 年以前为 33%, 2008 年为 25%。

五、会计政策、会计估计变更的会计处理方法

对于会计政策变更,采用如下两种会计处理方法:

- 1、法律或行政法规、规章要求改变会计政策的同时,也规定了会 计政策变更的会计处理方法的,这时按规定的办法处理。
- 2、国家没有规定的相关的会计处理方法,则采用追溯调整法进行会计处理。

对于会计估计变更采用未来适用法。

注释五: 会计报表主要项目注释

(一) 资产负债表项目注释

1. 货币资金

截止 2022 年 12 月 31 日,期末余额 128,146.52 元,比年初上升 110.87%。具体明细项目列示如下:

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
银行存款	128146.52	60769.28
合 计	128146.52	60769.28

2. 应收账款

截止 2022 年 12 月 31 日,应收账款期末余额 51,487,721.73 元。 主要债务人情况

单位名称	期末余额	占应收账款
河南通源高速公路养护工程有限责任公司	263, 730. 00	0.51%
河南路彩建材有限公司	514, 839. 54	1.00%
河南万方交通工程有限公司第二分公司	4, 103, 439. 35	7. 97%
中州公路工程有限公司	45, 766, 682. 84	88.89%
龙成成飞置业有限公司(龙成一期垫方工程)	691, 030. 00	1.34%
付军建	100, 000. 00	0.19%
周建章	48, 000. 00	0.09%

3. 预付款项

截止 2022 年 12 月 31 日, 预付账款余额 372,370.36 元, 比年初数下降 39.28%。

主要债务人情况:

20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 2		
单位名称	期末余额	占预付账款 余额的比例
西峡县鑫泰粉体材料有限公司	1, 314. 50	0.35%
中国石化销售有限公司河南南阳石油分公司	35.00	0.01%
河南淅建新型建材有限公司	34, 166. 00	9. 18%
河南同德物资有限公司	18, 206. 45	4. 89%
封振强	40,000.00	10.74%
中国大地财产保险股份有限公司南阳中心支公司	4, 312. 06	1. 16%
西峡县锦海工程有限公司	16, 785. 00	4. 51%
国网河南省电力公司	4, 045. 95	1.09%
西峡县财政局	10,000.00	2.69%
中国石化销售股份有限公司河南南阳石油分公司	139. 40	0.04%
西峡县自然资源局	73, 166. 00	19.65%
西峡县十方物流有限公司	7, 600. 00	2. 04%
西峡县金汇实业有限公司	50, 000. 00	13. 43%
南阳宁锴机电设备有限公司	30,000.00	8.06%
栾川县广宇混凝土有限公司	12, 600. 00	3. 38%
张林	70, 000. 00	18.80%

4. 其他应收款

截止 2022 年 12 月 31 日, 其他应收款余额 5,260,560.92 元, 比 年初数上升 1132.31%。

主要债务人情况:

单位名称	期末数	占其他应收款余额的 比例
中虔建设集团有限公司	2, 385, 109. 54	45. 34%
刘敏	1, 830, 925. 90	34. 80%
刘俊锋	59, 000. 00	1.12%
余建忠	550, 000. 00	10. 46%
杨占敏	250, 000. 00	4. 75%
张祖建	220, 000. 00	4. 18%
中虔建设集团有限公司	2, 385, 109. 54	45. 34%
刘敏	1, 830, 925. 90	34. 80%

5. 存货

截止 2022 年 12 月 31 日,存货余额 8809368.73 元,比年初数上 升 35.21%,具体构成如下:

项 目	期末数	比例	期初数	比例
库存材料	88, 458. 41	1.36%	384, 864. 92	4. 37%
库存产成品	518, 290. 47	7. 95%	1, 613, 892. 75	18. 32%
工程施工	5, 908, 767. 43	90. 69%	5, 105, 070. 85	57. 95%
辅助生产		_	1, 705, 540. 21	19. 36%
合计	6, 515, 516. 31	100.00%	8, 809, 368. 73	100.00%

6. 固定资产及累计折旧

截止 2022 年 12 月 31 日,固定资产原值 15466438.59 元,累计 折旧 12860018.61 元,固定资产净值 2606416.98 元。具体构成如下:

项 目	原值	累计折旧	净值
房屋建筑物及附 属设施	2, 297, 481. 00	1, 910, 307. 16	387, 173. 84
施工机械及其他 生产设备	9, 306, 074. 20	7, 737, 805. 10	1, 568, 269. 10
实验器材及设备	81, 800.00	68, 014. 98	13, 785. 02
运输工具	1, 574, 233. 31	1, 308, 941. 91	265, 291. 40
办公设备	156, 036. 58	129, 741. 14	26, 295. 44
其他设备	2, 050, 813. 50	1, 705, 208. 32	345, 605. 18
合计	15, 466, 438. 59	12, 860, 018. 61	2, 606, 419. 98

7. 短期借款

截止 2022 年 12 月 31 日,期初余额 1,000,000.00 元,期末余 额为 2,800,000.00 元。

项目	期初数	期末数
短期借款	1,000,000.00	2, 800, 000. 00

8. 应付账款

截止 2022 年 12 月 31 日,应付账款余额 21,038,529.98 元。 主要债务人情况:

供应商名称	金 额	占比
西峡县盛鑫混凝土有限公司	733, 718. 10	6. 11%

南阳华鑫公路养护有限公司	4, 432, 500. 00	36.89%
南阳市铂源建材有限公司	396, 558. 00	3.30%
西峡县诚源建筑工程有限公司	512, 820. 00	4. 27%
西峡县宏业建筑工程有限公司	377, 505. 00	3. 14%
回车祥瑞机械租赁部	396, 580. 00	3. 30%

9. 预收账款

截止 2022 年 12 月 31 日, 预收账款余额 1,333,836.80 元。

供应商名称	金 额	占比
龙成成飞置业有限公司(龙成社区道 路二期工程)	119, 787. 40	8. 98%
丹水镇政府	20,000.00	1.50%
南阳阜升实业有限公司(曹彦华)	12.00	0.00%
卢氏县畅通公路养护有限责任公司	705, 637. 40	52. 90%
西峡县金林建筑工程有限公司	488, 400. 00	36. 62%
合计	1, 333, 836. 80	100.00%

10. 应交税费

截止 2022 年 12 月 31 日,应交税费余额-115,985.80 元。具体构成如下:

税 种	期初数	期末数
城建税	29, 067. 33	4, 756. 96
教育费附加	17, 440. 40	2, 854. 17

地方教育费附加	11, 626. 93	1, 902. 77
待认证进项税额	-859, 572. 36	-315, 795. 56
未交增值税	581, 346. 68	190, 278. 21
个人所得税		17. 64
印花税	10, 432. 85	0.01
合 计	-209, 658. 17	-115, 985. 80

11. 其他应付款

截止 2022 年 12 月 31 日, 其他应付款余额 1,108,880.33 元。具体构成如下:

1113/902/11	2.0	
项 目	期末余额	占比
刘佳	10, 000. 00	0.90%
运费	-90. 07	-0.01%
南阳市住房公积金管理中心	1, 146. 00	0.10%
费用	956, 598. 00	86. 27%
王海伟	41, 226. 40	3. 72%
许寒冰	10, 000. 00	0.90%
李梓菡	10, 000. 00	0.90%
牛牧	10, 000. 00	0.90%
朱霖	10, 000. 00	0.90%
陈梦圆	10, 000. 00	0.90%
王海明	10,000.00	0. 90%
	<u> </u>	

任一铭	10, 000. 00	0. 90%
刘嘉林	10, 000. 00	0.90%
王志远	10, 000. 00	0. 90%
赵军辉	10, 000. 00	0.90%
合计	1, 108, 880. 33	100.00%

12. 应付职工薪酬

截止 2022 年 12 月 31 日,应付职工薪酬余额 884883.00 元。

13. 实收资本

截止 2022 年 12 月 31 日,股本余额 5,950,000.00 元。

投资者名称	期末数	期初数
实收资本	5,950,000.00	5,950,000.00
合 计	5,950,000.00	5,950,000.00

14. 资本公积

截止 2022 年 12 月 31 日, 未分配利润余额 36,644,063.55 元。

15. 未分配利润

截止 2022 年 12 月 31 日,未分配利润余额-979,619.62 元。

项 目	期末数	期初数
利润分配	-979,619.62	-7,015,491.58
合 计	-979,619.62	-7,015,491.58

(二) 利润表项目注释

1. 营业收入

2022年度业务收入累计发生额为34,690,534.56元,项目列示如下:

h sh	期末余额	
名称	金 额	比例 (%)
工程结算收入	34,231,256.90	98.68%
其他业务收入	459,277.66	1.32%
合 计	.34,690,534.56	100.00%

2. 营业成本

2022 年度主营业务成本累计发生额为 24,454,388.33 元,项目列示如下:

名称	期末	余额
石柳	金额	比例 (%)
工程结算成本	23,688,259.48	96.87%
其他业务支出	766,128.85	3.13%
合计	24,454,388.33	100%

3. 税金及附加

2022年度税金及附加累计发生额为125,843.71元,项目列示如下:

税和	本期数	比例 (%)
城建税	26,122.45	20.76%
教育费附加	15,672.01	12.45%
地方教育费附加	10,448.01	8.30%
印花税	6,668.16	5.30%

车船税	4,618.24	3.67%
房产税	14,364.68	11.41%
土地使用税	47,950.16	38.10%
合计	125,843.71	100.00%

4. 管理费用

2022年度管理费用累计发生额为4,017,938.86元,项目列示如下:

项目	本期数	比例(%)
职工工资	809, 986. 00	20.16%
办公费	200, 232. 35	4. 98%
差旅费	11, 395, 66	0. 28%
水电费	47, 944, 78	1.19%
机械费	107, 328. 60	2. 67%
招待费	529, 728. 00	13.18%
税金	4, 760. 32	0.12%
福利费	101, 596. 00	2. 53%
折旧费用	927, 349. 87	23. 08%
养老金	364, 866. 08	9.08%
医保金	195, 698. 14	4.87%
住房公积金	136, 107. 00	3. 39%
工会费	61, 349. 40	1.53%
其他费用	288, 818. 52	7. 19%

职业年金	77, 033. 00	1.92%
安全费用	117, 342. 75	2.92%
工伤保险	20, 742. 07	0. 52%
失业保险	15, 660. 32	0.39%
合计	4, 017, 938. 86	100%

5. 财务费用

2022年度财务费用累计发生额为57,580.34元,项目列示如下:

项目	本期数	比例(%)
财务费用	57,580.34	100%

6. 营业外收入

2022年度营业外收入累计发生额为54104.33元,明细列示如下:

项 目	本期数	比例 (%)
其他收入	54104. 33	100%
合 计	54104. 33	100%

7. 营业外支出

2022 年度营业外支出累计发生额为53015.69 元,明细列示如下:

项目	本期数	比例 (%)
其他	53015.69	100%
合 计	53015.69	100%

(三) 现金流量表有关项目注释

本年总现金流入 69,488,945.90 元, 总现金流出 69,421,568.66 元, 现金净流量 67,377.24 元。其中:

- 1、经营活动现金流入 31,044,882.35 元, 经营活动流出 68,365,247.19 元, 经营活动现金净流量-37,320,364.84 元;
- 2、投资活动现金流入 0 元,投资活动现金流出 998,741.13 元,投资活动现金净流量-998,741.13 元;
- 3、筹资活动现金流入 38,444,063.55 元, 筹资活动现金流出 57,580.34 元, 筹资活动现金净流量 38,386,483.21 元。

注释六:或有事项

本公司无需要披露的或有事项。

注释七: 承诺事项

本公司无需要披露的承诺事项。

注释八:资产负债表日后事项

本公司无需要披露的资产负债表日后事项。

注释九: 其他重要事项、

本公司无需要披露的其他重要事项。

上述二〇二二年度公司会计报表和会计报表有关附注,系我们按 《企业会计准则》、《企业会计制度》和有关规定及补充规定编制。

企业名称: 南阳华岳路桥工程有限公司

单位负责人: 王海伟

财务负责人: 张远远

其他重大事项

本报告书已按照有关规定对有关信息作了如实披露, 无其他为避 免对本报告书内容产生误解而必须披露的信息。

声明

本人(以及本人所代表的机构)承诺本报告及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

南阳华岳路桥工程有限公司(盖章)。王

法定代表人(签字)

二〇二三年三月二十四日



用 災

1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政 部门依法审批,准予执行注册会计师法定业务的

会计师事务所

- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的。 应当向财政部门申请换发。
- 《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、 租、出借、转让。
- 会计师事务所终止或执业许可注销的,应当向财 政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关。河南省城政厅

称: 南阳财和会计师事务所有限公司

A

首席合伙人:

主任会计师: 宋建敏

西峡县莲花北路 经营场所:

组织形式;有限责任

执业证书编号: 41160007

批准执业文号;豫财会协字(1999)35号

批准执业日期; 1999年09月10日

中华人民共和国财政部制









年度检验翻译的 Annual Renewal Registration

Annual Renewal Registration


A i 正书经体系合格上组织有

This certificate i hand for another this renewal.


2021年6月30日


411600070003

发证日期: Date of Issuance

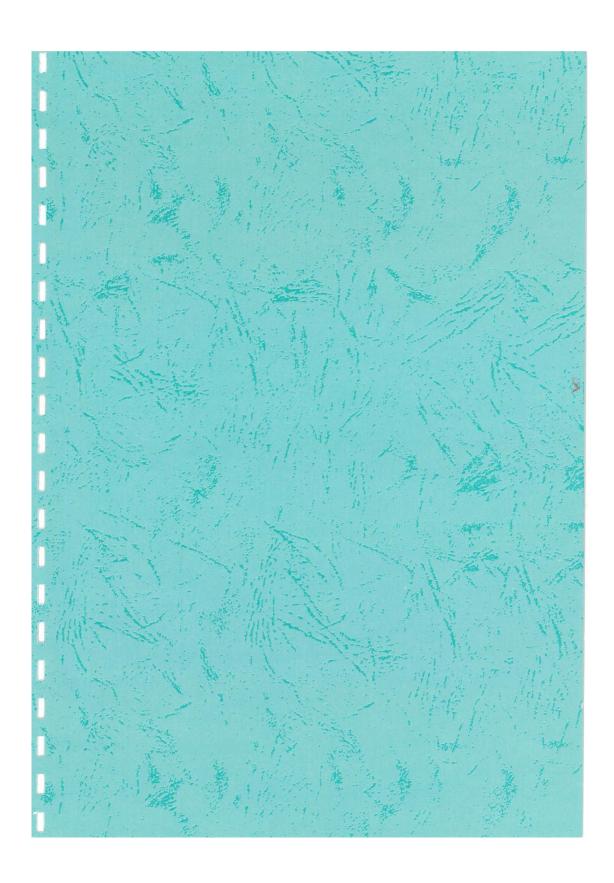

2023年财务报表

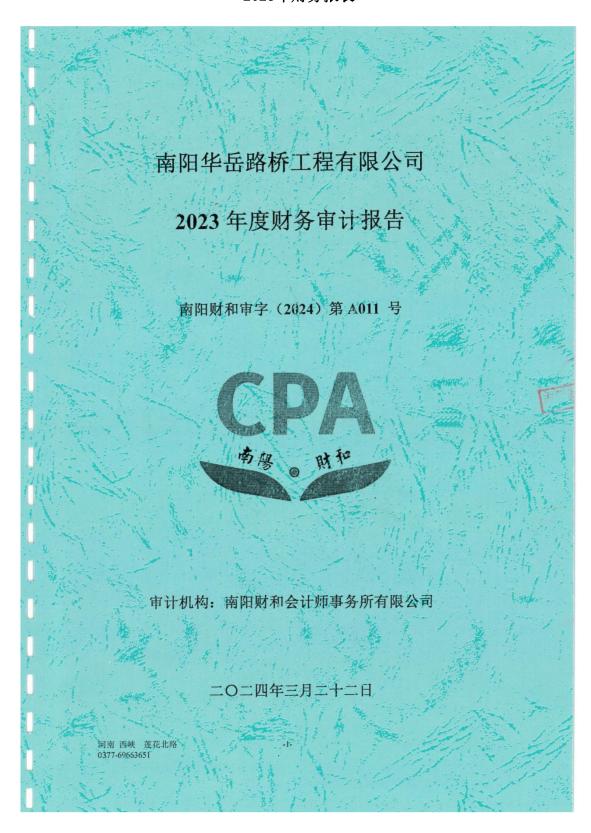

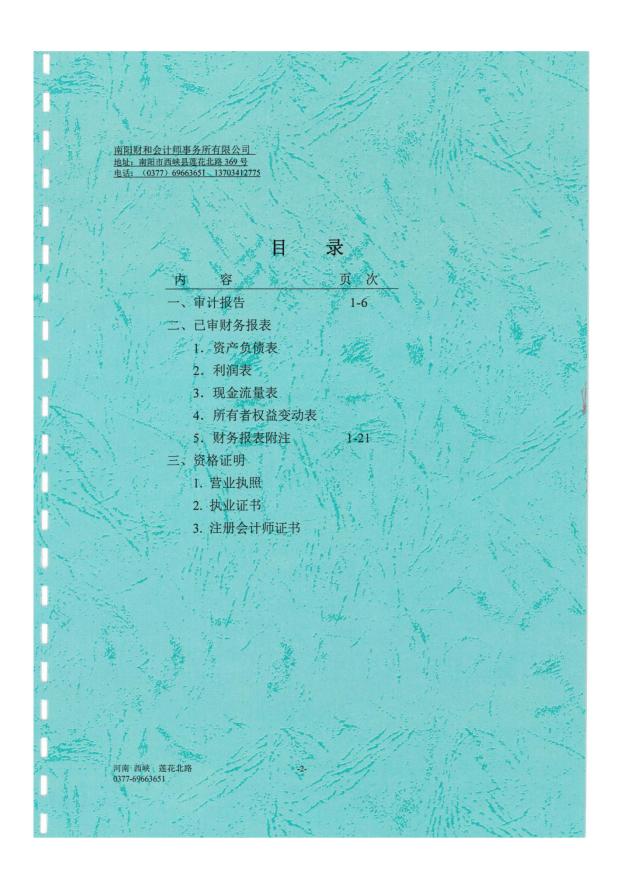

南阳华岳路桥工程有限公司 2023 年度财务审计报告

南阳财和审字(2024)第 A011 号



1

审计机构: 南阳财和会计师事务所有限公司

二〇二四年三月二十二日

河南 西峡 莲花北路 0377-69663651 -1-

<u>南阳財和会计师事务所有限公司</u> 地址: 南阳市西峡县莲花北路 369 号 电话: (0377) 69663651 13703412775

目 录

内	容	页 次
一、	审计报告	1-6
=,	已审财务报表	
	1. 资产负债表	
	2. 利润表	
	3. 现金流量表	
	4. 所有者权益变动表	
	5. 财务报表附注	1-20
三、	资格证明	
	1. 营业执照	
	2. 执业证书	

3. 注册会计师证书

河南 西峡 莲花北路 0377-69663651

审计报告

南阳财和会审字[2024]第 **A011** 号 南阳华岳路桥工程有限公司全体股东:

一、审计意见

我们审计了后附的南阳华岳路桥工程有限公司(以下简称华岳路桥工程公司)财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日资产负债表,2023年度利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及财务报表附注。

我们认为,华岳路桥工程公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了华岳路桥工程公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于华岳路桥工程公司,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

三、管理层和治理层对财务报表的责任

华岳路桥工程公司管理层(以下简称管理层)负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错

河南 西峡 莲花北路 0377-69663651

L ..

报。

在编制财务报表时,管理层负责评估华岳路桥工程公司的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非管理层计划清算华岳路桥工程公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督华岳路桥工程公司的财务报告过程。

四、其他信息

华岳路桥工程公司管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息,我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计,我们的责任是阅读其他信息,在此过程中,考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。基于我们已执行的工作,如果我们确定其他信息存在重大错报,我们应当报告该事实。在这方面,我们无任何事项需要报告。

五、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致 的重大错报获取合理保证,并出具包含审计意见的审计报告。合理保 证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重 大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致,如果合理预

河南 西峡 莲花北路 0377-69663651 -4

期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出 的经济决策,则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判断,并 保持职业怀疑。同时,我们也执行以下工作:

- (1)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险,设计和实施审计程序以应对这些风险,并获取充分、适当的审计证据,作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上,未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
- (2)了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但 目的并非对内部控制的有效性发表意见。
- (3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
- (4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获取的审计证据,就可能导致对华岳路桥工程公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而,未来的事项或情况可能导致华岳路桥工程公司不能持续经营。
- (5)评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露),并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

河南 西峡 莲花北路 0377-69663651

-5-

(6) 就华岳路桥工程公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据,以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计,并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通,包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺

陷。

南阳财和会计师事务所有限公司

中国注册会计师:

移饰

中国注册会计师:

河南 西峡

二〇二四年四月二十二日

河南 西峡 莲花北路 0377-69663651

1							
多田路	J.		资	负债表			
编制单位:南州华岳路桥工程有限	恒沙			3年12月3			单位: 元
五十五	智	年初数	期末数	负债及所有者权益	行次	年初数	期末数
(4)(2) : (4)(4)(4)(4)(4)(4)(4)(4)(4)(4)(4)(4)(4)(1	128 146 52	85 960 42	加·丛贝·顷 : 短·腊德·兹·	899	2 800 000 000	3 000 000 000
短期投资 000 日	2	and the Colonian control of th		以付票据 以付票据	69	7,000,000,00	00.000,000,0
2073	3	-	The same of the sa	应付帐款	70	21,038,529.98	19,997,133.18
应收股利	4	And the first of the second property and the second party of the s	A STATE OF THE PERSON OF THE P	预收帐款	77	1.333,836.80	421,171.70
应收利息	2		The second section of the second section of the second section of the second section of the second section sec	应付工资	72	884,883.00	1,353,087.00
应收帐款	9	51,487,721.73	45,151,992.49	应付福利费	73		
电位应收款	7	5,260,560.92	5,416,558.28	应付股利	74	The state of the s	
预付帐 款	60	372,370.36	5,177,835.78	应文税金	75	-115,985.80	-19,079.69
应收补贴款	60	THE RESERVE AND ADDRESS OF THE RESERVE AND ADDRE	Annual Control of the Control April 10 of the Control Annual Annu	其他应交款	80		And the second s
存货	10	8,809,368.73	15,302,293.29	其他应付款	81	1,108,880.33	5,910,756.21
待權费用	11			预提费用	82		American desired and the contract of the contr
·年內到期的长期债券投资	21			预计负债	83	CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF	Mark Conn. of Jan. William Control or Market Con
其他流动资产	24			一年內到期的长期负债	98		and descripting to a construction of the description of the descriptio
				其他流动负债	06	To date of the second of the second operation operation operation operation of the second operation of the second operation operat	es de la galeria de las desentes de las desentes de la consente del la consente de la consente d
派母室下 台山	31	66,058,168.26	71,134,540.26	流动负责合计	100	27,050,144.31	30,663,068.40
A.即校位:				长期负债:		And the second of the second party of the seco	AND THE CONTRACT OF THE CONTRA
长期股权投资	32			长明借款	101	To an institution of a Laboratory of the Company of	and of the second secon
CEISE 技技器	34			应付债券	102	And the state of t	Annual services of the control of th
公司校安合二	38	The second secon	E THE CONTRACT OF THE CONTRACT	医JUDIS 年級	103		
有定位产 。		And the Control of th		专项应付款	106		
而定变产原价	39	15,466,438.59	16,511,608.35	其他长期负债	108		
減. 點山折田	40	12,860,018.61	14,112,462.97	长期负债合计	110		
母定後产净值	41	2,606,419.98	2,399,145.38	谢娅税项:			
級: 固定资产减值准备	42	The second secon		遊延税项货项	111		
固定资产净额	43	2,606,419.98	2,399,145.38	负债总计	114	27,050,144.31	30,663,068.40
L程物资	44			少数股东权益			
在建工程	45	Control organization of the Control					
固定资产清理	46	The second secon	CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF	所有者权益(或股东权益):			
固定资产合计	20	2,606,419.98	2,399,145.38	实收资本(或股本)	115	5,950,000.00	10,780,000.00
无形资产及其他资产:				减: 已归还投资	116		
无形资产	51			实收资本(或股本)净额	117	5,950,000.00	10,780,000.00
长期待摊费用	52			资本公积	118	36,644,063.55	31,964,063.55
其他长期资产	53			盈余公积	119		
无形资产及其他资产合计	09		-	其中: 法定公益金	120		
递延税项:				未分配利润	121	-979,619.62	126,653.69
递延税款借项	61			所有者权益(或股东权益)合计	122	41,614,443.93	42,870,717.24
资产总计	67	68,664,588.24	73,533,785.64	负债和所有者权益(或股东权益)总计	135	68,664,588.24	73,533,785.64
企业负责人:王海伟				财务负责人: 张远远			制表人: 王晶晶

利润及利润分配表

编制单位: 南中洋區路第二程有限公司	2023年1	2月	单位:元
学順	行次	本年累计数	上年数
一、主营业人民人	1	29,836,239.20	34,231,256.90
减:主学以传成在2000	2	24,791,133.05	23,688,259.48
主营业务税金及附加	3	115,782.71	125,843.71
二、主营业务利润(亏损以"一"号填列)	4	4,929,323.44	10,417,153.71
加: 其他业务利润(亏损以"一"号填列) 5		-306,851.19
减: 营业费用	6		
管理费用	7	3,500,803.24	4,017,938.86
财务费用	8	269,528.48	57,580.34
三、营业利润(亏损以"一"号填列)	9	1,158,991.72	6,034,783.32
加:投资收益(损失以"一"号填列)	10		
资产处置损益	11		
营业外收入	1 12	75,998.75	54,104.33
减:营业外支出	13	128,717.16	53,015.69
四、利润总额(亏损以"一"号填列)	14	1,106,273.31	6,035,871.96
减: 所得税	15		
少数股东权益	16		
五、净利润(亏损以"一"号填列)	17	1,106,273.31	6,035,871.96
加: 年初未分配利润	18	-979,619.62	-7,015,491.58
其也等入	19		
六、可供分配的利润	20	126,653.69	-979,619.62
减: 提取法定盈余公积	21		
提取法定公益金	22		
提取职工奖励及福利基金	23		
提収储备基金	24		
提取企业发展基金	25		
利利与其还没资	26		
七、可供投资者分配的利润	2.7	126,653.69	-979,619.62
减,应付优先股股利	28		
提取任意盈余公积	29		
应付普通股股利	30		
转作资本(或股本)的普通股股利	31		
八、未分配利润	32	126,653.69	-979,619.62

补充资料.

項目	行法	本年累计数	上年同期数
1、出售。 定置部门或被投资单位所得收益			
2、自然大喜发生的损失	1 2		
3、会计政策变更增加(或减少)利润总额	3		
4、会计估计变更增加(或减少)利润总额	4		
5、债务重型损失	5		
6、共性	8		

企业负责人, 王海伟

财务负责人: 坐远远

制表人: 王晶晶

编制 甲位: 周阳 12 品级材 1 在有限公司					0.7
10000000000000000000000000000000000000	行次	金额	补充资料	行次	金额
一、经营活动产生的现金流量;			1、将净利润调节为经营活动现金流量:		
海世面出、超一数多表面出。今 3/4	4	38,053,983,46	美国 克	25	1,106,273.31
200			10. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11.	80	
20002073 E	91	4,877,874,63		50	1,252,444,36
超级强	0	42,331,858.09	光形以产格组	99	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2000年,众父为各支目的完全	10	38,425,688,89	第一次 第二次 第二次 第二次 第二次 第二次 第二次 第二次 第二次 第二次 第二	100	The state of the s
2. 计给制工具表为职工支付的处价	12	2,641,377.00	各樣費用減少(議,營加)	64	
支付的各项税费	13	885,695.72	预提费用增加(减;减少)	65	1
支付的其他与经营活动有关的现金	18	56,584.34	处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)	99	
现金流出小计	20	42,009,345.95	固定资产报废损失	29	
经营活动产生的现金流量净额	2.1	922,512.14	财务费用	89	269,528.48
二、投资活动产生的现金流量:			投资损失(减:收益)	69	
收回投资所收到的现金	22		遠延税款贷项(碳:借项)	20	
取得投资收益所收到的现金	23	A Company or sent to company or the control of the	存货的减少(减,增加)	7.1	-6,492,924.56
处置周宏宏心、无形弦冲和其他长期设产所收回的现金净额	25	Contract and the contract of t	经营件应收项目的减少(减;增加)	72	1,374,266.46
交到的其他与投资否动有关的现金	28	A CONTRACTOR OF THE PERSON OF	经营性应付项目的增加(减:减少)	73	3,412,924.09
現金流入小哥	29			74	7
公正图4.0个, 大形纹广阳户原长图数产图文目形成。	8	1,045,169 78	套合活动产生的现金统量冷凝	7.5	922,512.14
校验所支付的现金	34	1			
支付的其他与投資活动有关的现金	35				
現金第出今井	36	1,045,169.76			
投资活动产生的现金流量冷衡	557	-1,045,139,76 25	2、不涉及现金收支的投资和筹资活动;		
三、筹资活动产生的现金流量;			位务转为资本	92	
吸收投资所收到的规金	00	150,000.00	一年內到期的可转換公司债券	77	
借款所收到的现金	40	200,000.00	融资租入固定资产	78	
收到的其他与筹资活动有关的现金	43				
现金流入小计	44	350,000.00			
偿还债务所支付的现金	45	,			
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	46		3、现金及现金等价物净增加情况:		
支付的其他与筹资活动有关的现金	52	269,528.48	现金的期末余额	79	85,960.42
现金流出小计	53	269,528.48	减:现金的期初余额	80	128,146.52
筹资活动产生的现金流量净额	54	80,471.52	加:现金等价物的期末余额	81	
四、汇率变动对现金的影响	55		减: 现金等价物的期初余额	82	
17 日今乃田今年俸衛為城市第	24	10 106 10	臣今以臣今始今有名为古治	00	12 106 10

制表人: 王晶晶

财务负责人: 张远远

企业负责人:王海伟

所有者权益(股东权益)变动表 2023年01 - 12月

S	
-	
1	
_	
0	
#	
3	
2	

				本期	本期金额			
项目	实收资本(或 股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末会额	5.950.000.00	36.644.063.55					-979 619 62	41 614 443 93
加: 会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	5,950,000.00	36,644,063.55		,			-979,619.62	41,614,443.93
三、本年增减变动金额(减少以"-"号填列	4,830,000.00	4,680,000.00					1,106,273.31	1,256,273.31
(一) 神利润							1,106,273.31	1,106,273.31
(二) 其他综合收益								
上说(一) 档(二) 小中								•
(三)所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配								
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配								
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)							a de la companya de l	
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本年年末余額	10.780.000.00	31.964.063.55					126 653 60	AC 717 078 CA

企业负责人: 王海伟

会计机构负责人:

111

会计报表附注

截止 2023 年 12 月 31 日

金额单位: 人民币元

注释一: 公司简介

南阳华岳路桥工程有限公司(以下简称本公司)于 2016 年 6 月 14 日取得西峡县市场监督管理局核发的营业执照,注册号 91411323MA3XARWX4L, 法定代表人: 刘溪洋; 注册资本 4000 万元, 经营范围: 建设工程施工, 输电、供电、受电电力设施的安装维修和试验, 地质灾害治理工程施工, 电气安装服务:建筑劳务分包, 公路管理与养护, 建筑物拆除作业 (爆破作业除外)等。

注释二: 财务报表的编制基础

一、编制基础

本公司财务报表以《企业会计准则》为编制基础。

二、遵循企业会计准则的声明

本公司声明,本公司编制的财务报表已按《企业会计准则》及相 关的规定编制,符合《企业会计准则》及规定的要求,真实、完整地 反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量情况。

三、重要会计政策、会计估计的说明

本财务报表所载财务信息根据下列主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法编制。

.1、会计制度 -

公司执行《企业会计准则》的规定。

*2、会计年度

本公司会计年度采用公历年度,即每年自1月1日起至12月31日止。

3、记账本位币

本公司记账本位币和编制本财务报表所采用的货币为人民币。除 有特别说明外,金额单位均以人民币元表示。

4、记账基础及计价原则

公司采用借贷记账法,以权责发生制为记账基础,以历史成本为 计价原则。

- 5、现金流量表之现金及现金等价物的确定标准 本公司现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。 现金流量表之现金等价物指持有期限短(一般是指从购买日起六个月 内到期)、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小 的投资及银行承兑汇票。
 - 6、应收款项坏账损失核算方法
 - (1) 坏账损失确认标准:
- A、因债务人破产或死亡,以其破产财产或遗产清偿后,仍然不能收回的应收款项;
- B、因债务人逾期未履行偿债义务,超过三年仍然不能收回的应收款项:
 - C、有确凿的证据表明不能收回的应收款项。

以上确实不能收回的应收款项,按国家规定的审批核销权限分级

批准后,作为坏账核销。

(2)公司坏账核算方法:采用直接转销法核算。不计提坏账准备,在实际发生坏账损失时直接计入当期损益。

7、存货计价方法

本公司存货主要包括原材料、在产品、产成品及商品、低值易耗品。

- (1) 存货取得的计价方法: 购入原材料以买价加运输、装卸、 保险等费用作为实际成本; 产成品以制造和生产过程中发生的实际数 量乘以计划价核算。
 - (2) 存货发出的计价方法: 采用计划价法计价。
 - (3) 低值易耗品和包装物的摊销方法: 采用一次转销法。
 - (4) 存货的盘存制度: 永续盘存制。
- (5) 期末存货计价原则及存货跌价准备确认标准和计提方法: 期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价;期末,在对存货进行全面盘点的基础上,对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因,预计其成本不可收回的部分,提取存货跌价准备。存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取,可变现净值按估计售价减去估计完工成本、销售费用和税金后确定。

8、长期投资核算方法

债券投资的收益按照投资债券的面值及债券利率计算当年应计 利息, 计入当年损益。 长期股权投资,投资额占被投资单位权益资本 20%以下的采用成本法核算,20%-50%采用权益法,50%以上的采用成本法核算。

9、固定资产

- (1)固定资产标准:固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的,使用寿命超过一个会计年度的有形资产。
 - (2) 固定资产的确认条件:

与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业;

该固定资产的成本能够可靠计量。

- (3)固定资产分类:固定资产包括房屋建筑物、生产设备、运输设备、电子设备及其他等。
 - (4) 固定资产计价:

外购的固定资产,以实际支付的购买价款、相关税费、使固定资产达到预定可使用状态前所发生的归属于该项资产的运输费、装卸费、安装费和专业人员服务费等作为该项固定资产的初始成本。

自行建造的固定资产,以建造该项资产达到预定可使用状态前所 发生的必要支出作为该项固定资产的初始成本。

投资者投入的固定资产,以投资合同或协议约定的价值为该项固 定资产的初始成本。

(5) 固定资产折旧:

固定资产折旧以预计使用年限在预留 5%的残值后采用直线法计算,并按固定资产类别,预计使用年限确定折旧率。

固定资产分类预计折旧年限及年折旧率如下表:

-	类 别	折旧年限(年)	年折旧率(%)
	房屋建筑物	20	4.75
	生产设备	10	9.50
	运输设备	5	19.00
	电子设备及其他	5	19.00

- (6) 固定资产后续支出的处理: 固定资产后续支出在同时满足下面条件时计入固定资产成本,如有替换部分,应扣除其账面价值: (1) 与该支出有关的经济利益很可能流入企业; (2) 该后续支出的
- (1)与该支出有关的经济利益很可能流入企业; (2)该后续支出的 成本能可靠地计量。不符合上述条件的固定资产后续支出,在发生时 计入当期损益。

以经营租赁方式租入固定资产发生的改良支出,予以资本化,作 为长期待摊费用,在合理的期间摊销。

10、在建工程

- (1) 在建工程的计价:按实际发生的支出确定工程成本。自营工程按直接材料、直接工资、直接施工费等计量;出包工程按应支付的工程价款等计量;设备安装工程按所安装设备的价值、安装费用、工程试运转等所发生的支出确定工程成本。
- (2) 在建工程结转固定资产的时点:本公司建造的固定资产在 达到预定可使用状态之日起,根据工程预算、造价或工程实际成本等, 按估计的价值结转固定资产,次月起开始计提折旧。

11、借款费用的会计处理方法

借款费用包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因

外币借款而发生的汇兑差额等。公司发生的借款费用,可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的,予以资本化,计入相关资产成本;其他借款费用,在发生时根据其发生额确认为费用,计入当期损益。

(1) 资本化条件

在同时具备下列三个条件时,借款费用予以资本化:

资产支出已经发生;

借款费用已经发生;

为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。

(2) 资本化金额的确定

资本化金额按以下原则确定:

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的,以专门借款当期实际发生的利息费用,减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。

为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的,根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率,计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

(3) 暂停资本化

若固定资产的购建活动发生非正常中断,并且中断时间连续超过 3 个月,则暂停借款费用的资本化,将其确认为当期费用,直至资产 的购建活动重新开始。

(4) 停止资本化

当所购建的固定资产达到预定可使用状态时,停止其借款费用的 资本化,以后发生的借款费用于发生当期确认为费用。

12、无形资产

(1) 无形资产计价: 无形资产按实际成本进行初始计量。自行 开发的无形资产, 其成本包括自满足一定条件后达到预定用途前所发 生的支出总额。

(2) 无形资产摊销:

公司无形资产自取得当月起在预计使用年限内分期平均摊销,计入损益。合同规定有受益期限的,在受益期限内平均摊销,合同没有规定受益期限而法律规定有效期限的,按不超过法律规定的有效期限平均摊销;合同规定了受益期限而法律也规定了有效期限的,摊销年限不超过两者之中较短者;合同和法律均未规定受益期限或有效期限的,按不超过10年的期限摊销。

13、收入确认原则

本公司的营业收入主要包括销售商品收入,其收入确认原则如下:

- (1)本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方;
- (2)本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权,也 没有对已售出的商品实施有效控制;
 - (3) 收入的金额能够可靠地计量;
 - (4) 相关的经济利益很可能流入企业;
 - (5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

14、成本费用的确认原则

本公司在生产经营中发生的各项费用,以实际发生数计入成本、 费用。期间费用直接计入当期损益,成本计入所生产的产品、提供劳 务的成本。

15、员工社会保障及福利的内容、计提方法和会计处理方法 本公司员工社会保障及福利主要根据国家和当地政府有关规定 及公司的制度按比例提取并向指定机构缴付社会保险统筹,所需费用 直接计入成本费用。

16、所得税的会计处理方法

本公司所得税的会计核算采用应付税款法核算。

17、利润分配方法

利润分配由本公司依据《中华人民共和国公司法》及本公司章程 决议制定,在弥补以前年度未弥补亏损后按以下比例分配:

- (1) 按净利润的 10%提取法定盈余公积金;
- (2) 按净利润的 5%提取法定公益金(2006 年 1 月 1 日执行新《公司法》后本公司根据修改后的章程不再计提法定公益金,原法定公益金余额根据财政部财企[2006] 67 号文的有关规定转入盈余公积);
 - (3) 提取任意盈余公积, 具体比例由股东会决定:
 - (4) 向投资人分配利润。

四、主要税项

1、增值税

本公司商品销售收入适用的增值税。其中:内销商品销项税率为 9%。

本公司购买原材料等所支付的增值税进项税额可以抵扣销项税。 本公司的增值税应纳税额为当期销项税抵减当期进项税后的余 额。

2、城市维护建设税

按实际缴纳的流转税的5%缴纳。

3、教育费附加、地方教育费附加

教育费附加按实际缴纳的流转税的 3%缴纳, 地方教育费附加按 实际缴纳的流转税的 2%缴纳。

4、企业所得税

本公司企业所得税的适用税率 2007 年以前为 33%, 2008 年以后为 25%。

五、会计政策、会计估计变更的会计处理方法

对于会计政策变更,采用如下两种会计处理方法:

- 1、法律或行政法规、规章要求改变会计政策的同时,也规定了会 计政策变更的会计处理方法的,这时按规定的办法处理。
- 2、国家没有规定的相关的会计处理方法,则采用追溯调整法进行 会计处理。

对于会计估计变更采用未来适用法。

注释五: 会计报表主要项目注释

(一) 资产负债表项目注释

1. 货币资金

截止 2023 年 12 月 31 日,期末余额 85,960.42 元,比年初下降 32.92%。具体明细项目列示如下:

(1) 明细情况

项目	期末数	期初数
银行存款	85,960.42	128,146.52
合 计	85,960.42	128,146.52

2. 应收账款

截止 2023 年 12 月 31 日,应收账款期末余额 45,151,992.49 元。 主要债务人情况

单位名称	期末余额	占应收账款余额的 比例
中州公路工程有限公司	32, 647, 057. 81	72. 30%
河南万方交通工程有限公司第二分公司	4, 103, 439. 35	9.09%
南阳鸿飞建筑工程有限公司	7, 624, 029. 51	16.89%
河南路彩建材有限公司	256, 484. 54	0. 57%
付军建	100, 000. 00	0. 22%
南京东大智能化系统有限公司	50, 622. 00	0.11%
河南通源高速公路养护工程有限责任公司	34, 661. 09	0.08%

3. 预付款项

截止 2023 年 12 月 31 日, 预付账款余额 5,177,835.78 元, 比年 初数上升 1290.51%。

主要债务人情况:

单位名称	期末余额	占预付账 款余额的 比例
西峡县房产管理中心	1, 459, 679. 20	28. 19%
西峡县山城物资产业有限公司	1, 133, 894. 84	21.9%
南阳海川路桥建设工程有限公司	756, 568	14.61%
栾川县广宇混凝土有限公司	630, 099	12. 17%
孙书九	337, 450	6. 52%
王红亮	170, 000	3. 28%
河南省中施展建筑劳务有限公司	94, 857	1.83%
西峡县路源物流有限公司	80, 809	1.56%
西峡县自然资源局	73, 166	1.41%

4. 其他应收款

截止 2023 年 12 月 31 日, 其他应收款余额 5, 416, 558. 28 元, 比 年初数上升 2.97 %。

主要债务人情况:

单位名称	期末数	占其他应收款余额的 比例
刘敏	2, 613, 327. 30	48. 25%
中虔建设集团有限公司	1, 659, 411. 06	30.64%
余建忠	150, 000. 00	2.77%

杨占敏	400, 000. 00	7. 38%
张祖建	250, 631. 00	4. 63%
秦程密	135, 105. 00	2.49%
符欢欢	142, 000. 00	2.62%

5. 存货

截止 2023 年 12 月 31 日,存货余额 15,302,293.29 元,比年初数 上升 73.70%,具体构成如下:

项目	期末数	比例	期初数	比例
库存材料	512, 661. 92	3. 35%	384, 864. 92	4. 37%
库存产成品	1, 154, 203. 91	7. 54%	1, 613, 892. 75	18: 32%
工程施工	12, 904, 877. 2 6	84. 33%	5, 105, 070. 85	57. 95%
辅助生产	726, 948. 43	4. 75%	1, 705, 540. 21	19. 36%
低值易耗品	3, 601. 77	0.03%		
合计	15, 302, 293. 2 9	100.00%	8, 809, 368. 73	100.00%

6. 固定资产及累计折旧

截止 2023 年 12 月 31 日,固定资产原值 16,511,608.35 元,累 计折旧 14,112,462.97 元,固定资产净值 2,399,145.38 元。具体构 成如下:

项目	原值	累计折旧	净值
房屋建筑物及附 属设施	2, 297, 481. 00	2, 297, 481. 00	0
施工机械及其他 生产设备	9, 750, 751. 03	8, 373, 336. 16	1, 377, 414. 87

运输工具	660, 353. 98	249, 953. 49	410, 400. 49
办公设备	142, 452. 36	118, 072. 39	24, 379. 97
其他设备	3, 660, 569. 98	3, 073, 619. 93	586, 950. 05
合计	16, 511, 608. 35	14, 112, 462. 97	2, 399, 145. 38

7. 短期借款

截止 2023 年 12 月 31 日,期初余额 2,800,000.00 元,期末余额为 3,000,000.00 元。

项目	期初数	期末数
短期借款	2, 800, 000	3, 000, 000

8. 应付账款

截止 2023 年 12 月 31 日,应付账款余额 19,997,133.18 元。 主要债务人情况:

供应商名称	金 额	占 比
南阳华鑫公路养护有限公司	4, 094, 842. 92	20, 48%
河南金鼎建设工程有限公司	1, 195, 500. 00	5. 98%
西峡县鸿达加油站	419, 767. 00	2. 10%
西峡县创生实业有限公司	455, 152. 62	2.28%
南阳市旭信路桥工程有限公司	800, 147. 00	4.00%
南阳璐飞建筑工程有限公司	711, 676. 00	3.56%

淅川县友恺建筑工程有限公司	630, 873. 00	3. 15%
代晓明	300, 000. 00	1.50%
河南沃通建筑设备有限公司	333, 350. 00	1.67%
陕西盛世乾坤建设工程有限公司	600, 000	3.00%

9. 预收账款

截止 2023 年 12 月 31 日, 预收账款余额 421, 171.7 元。

供应商名称	金 额	占比
卢氏畅通公路养护有限责任公司	11, 171. 70	2. 65%
西峡县金林建筑工程有限公司	210, 000. 00	49. 86%
马晓斌	100, 000. 00	23.74%
陕西智网兴源电力工程有限公司	100, 000. 00	23. 74%
合计	421, 171. 70	100%

10. 应交税费

截止 2023 年 12 月 31 日, 应交税费余额-19,079.69 元。具体构成如下:

税种	期初数	期末数
城建税	4, 756. 96	0.01
教育费附加	2, 854. 17	0
地方教育费附加	1, 902. 77	-0.01

应交增值税	-125, 517. 35	-19, 115. 58
个人所得税	17.64	35. 88
印花税	0. 01	0.01
合计	-115, 985. 80	-19, 079. 69

11. 其他应付款

截止 2023 年 12 月 31 日,其他应付款余额 5,910,756.21 元。具体构成如下:

项 目	期末余额	占比
王海伟	4, 648, 858. 28	78.65%
暂估费用	956, 598. 00	16.18%
李继武	50, 000. 00	0.85%

12. 应付职工薪酬

截止 2023 年 12 月 31 日,应付职工薪酬余额 1,353,087.00 元。

13. 实收资本

截止 2023 年 12 月 31 日,股本余额 10,780,000 元。

投资者名称	期末数	期初数
河南省中州公路工程有限公司	3,060,000	1,000,000
王海伟	5,070,000	2,850,000
李继武	1,200,000	1,000,000
余建忠	400,000	200,000

孙书九	350,000	200,000
黎辉	200,000	200,000
胡博	200,000	200,000
王伟	200,000	200,000
符欢欢	100,000	100,000
合 计	10,780,000	5,950,000

14. 资本公积

截止 2023 年 12 月 31 日,资本公积余额 31,964,063.55 元。

15. 未分配利润

截止 2023 年 12 月 31 日,未分配利润余额 126,653.69 元。

项目	期末数	期初数
利润分配	126,653.69	-979,619.62
合 计	126,653.69	-979,619.62

(二) 利润表项目注释

1. 营业收入

2023 年度业务收入累计发生额为 29,836,239.20 元,项目列示如下:

ka sila	期末余额	
名称	金 额	比例 (%)
工程结算收入	29,836,239.20	100.00%
合 计	29,836,239.20	100.00%

2. 营业成本

2023 年度主营业务成本累计发生额为 24,791,133.05 元,项目列示如下:

名称	期末	余额
名M	金额	比例 (%)
L程结算成本	24,791,133.05	100%
合计	24,791,133.05	100%

3. 税金及附加

2023年度税金及附加累计发生额为115,782.71元,项目列示如下:

税种	本期数	比例 (%)
车船税	5,701.74	4.92%
房产税	14,364.68	12.41%
土地使用税	47,950.16	41.41%
城建税	17,650.05	15.24%
教育费附加	10,572.67	9.13%
地方教育费附加	7,048.45	6.09%
印花税	7,136.94	6.16%
资源税	5,358.02	4.64%
合计	115,782.71	100.00%

4. 管理费用

2023年度管理费用累计发生额为3,500,803.24元,项目列示如下:

—————————————————————————————————————	本期数	比例 (%)
-X FI	·- 1-7913X	PD 13 (70)

职工工资	446, 763	12. 76%
办公费	70, 791. 19	2. 02%
差旅费	11, 157. 37	0. 32%
水电费	36, 952. 18	1.06%
机械费	83, 181. 53	2. 38%
招待费	398, 008. 43	11.37%
福利费	221, 202. 00	6. 32%
折旧费用	619, 352. 42	17.69%
养老金	472, 585. 60	13.50%
医保金	216, 563. 00	6. 19%
住房公积金	133, 053. 00	3. 80%
工会费	63, 894. 11	1.83%
职工教育经费	5, 000.00	0.14%
其他费用	248, 235. 05	7. 09%
保险费用	16, 274. 09	0.46%
职业年金	68, 840. 00	1. 97%
安全费用	338, 256, 00	9. 66%
工伤保险	30, 174. 62	0.86%
失业保险	20, 519. 65	0.58%
合计.	3, 500, 803. 24	100%

5. 财务费用

2023年度财务费用累计发生额为 269,528.48 元,项目列示如下:

项目	本期数	比例 (%)
财务费用	269,528.48	100%

6. 营业外收入

2023年度营业外收入累计发生额为75,998.75元,明细列示如下:

项目	本期数	比例 (%)
营业外收入	75, 998. 75	100%
合 计	75, 998. 75	100%

7. 营业外支出

2023年度营业外支出累计发生额为128,717.16元,明细列示如下:

项目	本期数	比例 (%)
营业外支出	128, 717. 16	100%
合 计	128, 717. 16	100%

(三) 现金流量表有关项目注释

本年总現金流入 43,281,858.09 元, 总现金流出 43,324,044.19 元, 现金净流量-42,186.1 元。其中:

- 1、经营活动现金流入 42,931,858.09 元, 经营活动流出 42,009,345.95 元, 经营活动现金净流量 922,512.14 元;
- 2、投资活动现金流入 0 元,投资活动现金流出 1,045,169.76 元,投资活动现金净流量-1,045,169.76 元;
- 3、筹资活动现金流入 350,000 元, 筹资活动现金流出 269,528.48 元, 筹资活动现金净流量 80,471.52 元。

注释六:或有事项

本公司无需要披露的或有事项。

注释七: 承诺事项

本公司无需要披露的承诺事项。

注释八: 资产负债表日后事项

本公司无需要披露的资产负债表日后事项。

注释九: 其他重要事项、

本公司无需要披露的其他重要事项。

上述二〇二二年度公司会计报表和会计报表有关附注,**系我们按**《企业会计准则》、《企业会计制度》和有关规定及补充规定编制。

企业名称: 南阳华岳路桥工程有限公司

单位负责人: 王海伟

财务负责人: 张远远

其他重大事项

本报告书已按照有关规定对有关信息作了如实披露, 无其他为避 免对本报告书内容产生误解而必须披露的信息。

声明

本人(以及本人所代表的机构)承诺本报告及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

南阳华岳路桥工建筑设公司《盖章》
法定代表人(签表)





H 完

《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政 部门依法审批,准予执行注册会计师法定业务的

会计师事务所

- 《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 应当向财政部门申请换发。
- 《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、 租、出借、转让。
- 会计师事务所终止或执业许可注销的,应当向财 政部门交回《会计师事务所执业证书》。



河南省城政厅

发证机关。

內別別的不会计师事务所有限公司

夕

首席合伙人:

主任会计师:宋建敏

西峡县莲花北路 所: 经营场

组织形式;有限责任

执业证书编号: 41160007

批准执业文号; 豫财会协字(1999)35号。 批准执业日期: 1999年09月10日

中华人民共和国财政部制





411600070001 证书编号: No. of Certificate

批准注册协会:河南省注册会计师协会 Authorized Institute of CPAs

发证日期: Date of Issuance 2020

年度检验和话户 Annual Renewal Registration ECPA DD 本证书经经验合格业知知,一年. This certificate is ratio for another year after this renewal.

2021年6月30日









赵五福 411600070003

证书编号: No of Certificate

411600070003

批准证明协会: Authorized Institute of CPAs

河南省注册会计师协会

发证日期: Date of Issuance

1986_{.4}


年度检 Annual Renewal Registration
中国 CPA 对
本证书经验查查查量量等
This certificate is rained for another, this renewal Annual Reng This certific this renewal.

2021年6月30日

年少

月 /m El 1

2024年财务报表

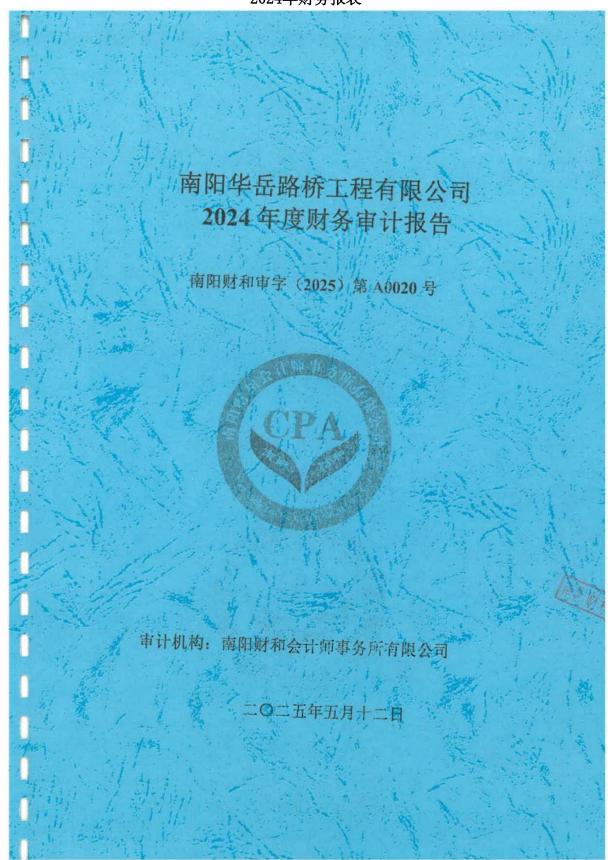

<u>南阳财和会计师事务所有限公司</u> 地址: 南阳市西峡县莲花北路 369 号 电话: (0377) 69663651 13703412775

目 录

_内	容	页	次
-,	审计报告	1-	5
Ξ,	已审财务报表		
	1. 资产负债表		
	2. 利润表		
	3. 现金流量表		
	4. 所有者权益变动表		
	5. 财务报表附注	1-1	3
三、	资格证明		
	1. 营业执照		
	2. 执业证书		

3. 注册会计师证书

审计报告

南阳财和审字[2025]第 A0020 号

南阳华岳路桥工程有限公司全体股东:

一、审计意见

我们审计了后附的南阳华岳路桥工程有限公司(以下简称华岳路桥工程公司)财务报表,包括 2024年12月31日资产负债表,2024年度利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及财务报表附注。

我们认为,华岳路桥工程公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了华岳路桥工程公司 2024 年 12 月 31 日的财务状况以及 2024 年度经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于华岳路桥工程公司,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

三、管理层和治理层对财务报表的责任

华岳路桥工程公司管理层(以下简称管理层)负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时,管理层负责评估华岳路桥工程公司的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非管理层计划清算华岳路桥工程公司、终止运营或别无其他现

实的选择。

治理层负责监督华岳路桥工程公司的财务报告过程。

四、其他信息

华岳路桥工程公司管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息,我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计,我们的责任是阅读其他信息,在此过程中,考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。基于我们已执行的工作,如果我们确定其他信息存在重大错报,我们应当报告该事实。在这方面,我们无任何事项需要报告。

五、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的 重大错报获取合理保证,并出具包含审计意见的审计报告。合理保证 是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大 错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致,如果合理预期 错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的 经济决策,则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判断,并保持职业怀疑。同时,我们也执行以下工作:

(1)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险,设计和实施审计程序以应对这些风险,并获取充分、适当的审计证据,作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上,未能发现由于舞弊导致的重大错报

的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

- (2)了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
- (3)评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
- (4)对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获取的审计证据,就可能导致对华岳路桥工程公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而,未来的事项或情况可能导致华岳路桥工程公司不能持续经营。
- (5)评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露),并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
- (6)就华岳路桥工程公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据,以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计,并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通,包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

南阳财和会计师事务所有限公司

PUBLIC

河南·西峡

中国注册会计师:

铁庙

中国注册会计师

二〇二五年五月十二日

	1	(期末数 5,800,000.00 14,685,992.97 5,489,944.57 9,098,316.45 2,186,769.00 262,943.53
2 289,130.20		2 889,130.20 3 45,151,992.49 50,743,334.86 6 5,177,835.78 3,642,892.05 6 5,177,835.78 3,642,892.05 6 5,177,835.78 3,642,892.05 11 15,302,293.29 19,287,500.33 18 7 19 71,134,640.26 76,107,421.61 金 22 20,441,130.17	46		5,800,000.00 14,685,992.97 5,489,944.57 9,098,316.45 2,186,769.00 262,943.53
(2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (3) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4		2 3 4 45,151,992.49 50,743,334.86 立款 7 6 5,177,835.78 3,642,892.05 文 9 5,416,558.28 2,144,564.17 10 15,302,293.29 19,287,500.33 工程 12 15,302,293.29 19,287,500.33 中 20 71,134,640.26 76,107,421.61 金 22 20,441,130.17			14,685,992,97 5,489,944.57 9,098,316.45 2,186,769.00 262,943.53
	(1) 3 45,151,992.49 50,743,334.86 所依保証 54 55 (2) 5 5 4 45,151,992.49 50,743,334.86 所依收款 54 65 54 65 54 65 55 65 74 65 74 75	3 45,151,992.49 50,743,334.86 6 5,177,835.78 3,642,892.05 立款 7 3,642,892.05 京 9 5,416,558.28 2,144,564.17 市 10 15,302,293.29 19,287,500.33 上程 12 19,287,500.33 市 19 71,134,640.26 76,107,421.61 金 22 が 25 16,511,608.35 20,441,130.17	***		14,685,992.97 5,489,944.57 9,098,316.45 2,186,769.00 262,943.53
		(大学学者) (12) (134,640.26	*		5,489,944.57 9,098,316.45 2,186,769.00 262,943.53
(2) (2) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4	 5 5,177,835.78 3,642,892.05 成付商単位数 55 5 5,177,835.78 3,642,892.05 成付商単位数 56 5 6 5,177,835.78 3,642,892.05 双位商利数 56 1 10 5,302,283.29 19,287,500.33 末代利润 61 1 11 15,302,283.29 19,287,500.33 末化利润 61 1 12	(大学学) 25 147,835.78 3,642,892.05 (2.5 mm) 2 144,564.17 (3.5 mm) 2 144,564.17 (3.5 mm) 2 144,564.17 (4.5 mm) 2 1 1 (4.5 mm) 2 (4.5 mm	*		9,098,316.45 2,186,769.00 262,943.53
		立義 5,177,835.78 3,642,892.05 立義 7 5,416,558.28 2,144,564.17 10 15,302,293.29 19,287,500.33 工程 12 19,287,500.33 (債券投資 18 71,134,640.26 76,107,421.61 全 22 20,441,130.17	46		9,098,316.45 2,186,769.00 262,943.53
		上級 (10	46		262,943.53
	(次 9 5,416,558.28 2,144,564.17 10 15,302,293.29 19,287,500.33 工程 12 15,302,293.29 19,287,500.33 単規失 13 19 71,134,640.26 76,107,421.61 全 22 2 2 441,130.17 位 25 16,511,608.35 20,441,130.17	*		262,943.53
1		(4) 25 16,508.28 2,144,564.17 174,564.17 174 15,302,293.29 19,287,500.33			262,943.53
17 15,302,293.29 19,287,500.33 未交配金 60 -19,079.69 12 12 15,302,293.29 19,287,500.33 未付利润 61 -19,079.69 18 12 71,134,640.26 76,107,421.61 流动负债合计 70 30,663,068.40 2 22 45,511,608.36 20,441,130.17 其他长期负债合计 71 4 25 16,511,608.36 20,441,130.17 其他长期负债合计 73 6 22 44,102.462.97 14,682,403.64 其中依期负债合计 73 6 27 2,399,145.38 5,748,726.53 基施税负债合计 82 6 41 28 5,748,726.53 基施税负债合计 86 30,663,068.40 6 41 40 5,748,726.53 基施税负债合计 86 30,663,068.40 6 41 40 5,748,726.53 基施税负债 60 10,780,000.00 7 40 41 42 60 10,780,000.00 10,780,000.00 1 44 46 46	17 15,302,293.29 19,287,500.33 未交积金 60 工程 12 16,302,293.29 19,287,500.33 未交积金 60 扩充 13 大杉利润 62 有限表別 62 14 12 71,134,640.26 76,107,421.61 流域股份 64 21 20 71,134,640.26 76,107,421.61 流域股份 65 22 22 22 长期负债 77 24 14,112,462.97 14,692,403.64 其中、专期应付款 77 25 2,399,145.38 5,748,726.53 长期负债 77 26 14,112,462.97 14,692,403.64 其中、专项应付款 77 27 2,399,145.38 5,748,726.53 建建建制负债 77 28 2,399,145.38 5,748,726.53 建建建制负债 77 29 2,399,145.38 5,748,726.53 建建建制负债 6 20 4 4 6 6 6 20 4 4 6 6 6 6	11 15,302,293.29 19,287,500.33 T.程 12 (樹等投資 18 (竹等投資 18 20 71,134,640.26 76,107,421.61 金 22 16,511,608.35 20,441,130.17			262,943.53
工程 11 12,302,293.29 19,287,500.33 其他未交額 62 市場長後 13 13 134,640.26 76,107,421.61 素均低級的 64 62 市 19 77,134,640.26 76,107,421.61 素均低級的 64 65 市 20 77,134,640.26 76,107,421.61 素均低級的 64 70 30,663,068.40 金 22 22 20,441,130.17 长期借款 77 不均低的 73 的 26 16,511,608.35 20,441,130.17 其他长期应付款 77 不均隔的 73 位有数类 29 14,112,462.37 14,692,403.64 其中专项应付款 77 20 中域 27 2,399,145.38 5,748,726.53 基施稅資金 82 30,683,068.40 73 中域 4 40 1,448,726.53 基施稅資本 87 10,780,000.00 1.286,000.00 中域 44 45 46 27 28 27 28 30,683,068.40 30 42,870,777.24 47 中域 48 49 40 40 40 40	12 15,302,253.29 19,287,500.33 末付利润 62 (債券投資 18) (62) (63) (63) (63) (63) (63) (63) (64) (63) (64) (65) (67) (67) (67) (67) (65) (67) (67) (67) (67) (67) (67) (65) (67)	工程 11 19,302,293.29 19,287,500.33 (
12	連携表 12 其他流之负债 62 13 有機要 13 有機要 62 14 20 71,134,640.26 76,107,421.61 基地流动负债合计 70 21 大期借款 77 大期债款 77 72 22 大期债款 77 大期债款 77 73 4 25 16,511,608.35 20,441,130.17 其他光均债合计 73 73 4 25 14,112,482.97 14,682,403.64 其中、专项应付款 77 74 4 25 14,112,482.97 14,682,403.64 其中、专项应付款 77 76 4 25 2,399,145.38 5,748,726.53 递延税款 66 77 26 14,112,482.97 14,682,403.64 其中、专项应付款 77 26 28 2,399,145.38 5,748,726.53 递延税款 66 32 29 2,399,145.38 5,748,726.53 递延税款 73 受收资本公积 32 4 4 4 2 2 2 2 3 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 <td>A 25 16,511,608.35 20,441,130.17</td> <td></td> <td></td> <td></td>	A 25 16,511,608.35 20,441,130.17			
(中級大 13	13	(債券投) 18 (債券投) 18 (力) 20 71,134,640.26 76,107,421.61 金 22 22 (分) 25 16,511,608.35 20,441,130.17			
15	19	19			
19 71,134,640.26 76,107,421.61 無效负值合计 70 30,663,088.40 21 长期伯款 77 长期伯款 72 6 22 成均值合计 72 成付债券 72 6 14,112,462.97 14,692,403.64 其中、专项应付债券 77 76 6 27 2,399,145.38 5,748,726.53 长期负债合计 82 30,663,068.40 6 28 2,399,145.38 5,748,726.53 基施稅債 47 86 30,663,068.40 30,663,068.40 7 32 2,399,145.38 5,748,726.53 基施稅稅 82 30,663,068.40 30,663,068.40 6 41 42 6,748,726.53 基施稅稅 82 30,663,068.40 30,66	15 77,134,640.26 76,107,421.61 流均位倍計 下が向位音 70 21 大期倍数 77 6 22 大期倍数 77 6 12 大期倍数 77 6 14,112,462.97 14,682,403.64 其中·专项应付款 77 7 28 2,399,145.38 5,748,726.53 柱地负债合计 82 28 2,399,145.38 5,748,726.53 地遊苑将项 83 29 2,399,145.38 5,748,726.53 地遊苑将项 87 20 41 42 所有者权益 87 20 42 5,748,726.53 地遊苑的 89 20 44 42 所有者权益 80 20 46 万48,726.53 地遊苑的 60 20 46 大分型利润 50 其中·公益会 90 20 46 大名 大名 大名 大名 20 46 大名 大名 大名 大名 20 73,533,785.64 81,856,148.14	(1) 25 16,511,608.35 20,441,130.17	=======================================	-	
17 20 71,134,640,26 76,107,421,61 流动负债合計 70 30,663,068,40 21 长期伯談 72 大期应付款 72 大期应付款 72 6 22 大期应付款 72 大期应付款 73 6 26 14,112,462,37 14,692,403.64 其中卡切应付款 76 7 27 14,692,403.64 其中卡切应付款 77 7 2,399,145.38 5,748,726.53 比期负债合计 82 7 2,399,145.38 5,748,726.53 地域合计 83 7 32 2,399,145.38 5,748,726.53 地域合计 82 7 40 大名8,726.53 地域合计 88 30,663,088.40 7 42 大名8,726.53 地域大系 89 31,964,063.55 7 46 大名8,726.54 89 31,964,063.55 31 7 46 大名6 大会6 大会6 42,870,717.24 44 7 46 大名6 大金6 大金6 42,870,717.24	 20 (7,134,640.26) 76,107,421,61 流动负债合计 70 21 (大期借款 77 22 (大期借款 77 23 (2,441,130.17) 其他长期负债 78 24 (1,412,462.97) 14,692,403.64 其中・专项应付款 77 25 (1,508,145.38) 5,748,726.53 建越税债项 83 26 (1,511,608.35) 5,748,726.53 建越税债价项 83 27 (2,399,145.38) 5,748,726.53 建越税债价项 83 28 (上期负债合计 82 29 (2,399,145.38) 5,748,726.53 建越税债价项 83 32 (2,399,145.38) 5,748,726.53 建越税债价项 83 34 (4) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2	立 21 金 22 22 22 (4.41,608.35 20,441,130.17	200		
 上級投入後 大期点付 大期点付 大期点付 大期点付 大月におり 大月におり 大月におり 大月に大り 大り 大月に大り 大り <li< td=""><td>金 21 长期位债券 71 企付债券 72 板期位债券 72 价 25 16,511,608.35 20,441,130.17 其他长期应付款 76 1山 26 14,112,462.97 14,692,403.64 其中·专项应付款 76 1里 28 5,748,726.53 长期负债合计 82 增期 28 5,748,726.53 建度税款 78 沙哈计 40 5,748,726.53 建度税款 88 24 40 万分松份合计 86 25 41 万分松份合计 89 26 42 万分松份合计 89 27 2,399,145.38 5,748,726.53 建度税款 89 26 43 5,748,726.53 建度税款 89 27 2,399,145.38 5,748,726.53 建度税款 89 26 43 5,748,726.53 建度税款 89 26 44 6 6 6 6 27 2,399,145.38 5,748,726.53 2 2 6 28 43 7 2 2 2 2 29 73,533,785.64 81,856,148.14 4 4 4 6 20 73,533,785.64 81,856,148.14</td><td>金 22 22 介 25 16,511,608.35 20,441,130.17</td><td>25</td><td></td><td>37,523,966.52</td></li<>	金 21 长期位债券 71 企付债券 72 板期位债券 72 价 25 16,511,608.35 20,441,130.17 其他长期应付款 76 1山 26 14,112,462.97 14,692,403.64 其中·专项应付款 76 1里 28 5,748,726.53 长期负债合计 82 增期 28 5,748,726.53 建度税款 78 沙哈计 40 5,748,726.53 建度税款 88 24 40 万分松份合计 86 25 41 万分松份合计 89 26 42 万分松份合计 89 27 2,399,145.38 5,748,726.53 建度税款 89 26 43 5,748,726.53 建度税款 89 27 2,399,145.38 5,748,726.53 建度税款 89 26 43 5,748,726.53 建度税款 89 26 44 6 6 6 6 27 2,399,145.38 5,748,726.53 2 2 6 28 43 7 2 2 2 2 29 73,533,785.64 81,856,148.14 4 4 4 6 20 73,533,785.64 81,856,148.14	金 22 22 介 25 16,511,608.35 20,441,130.17	25		37,523,966.52
金 21 长期倍款 71 6 16,511,608.35 20,441,130.17 其他长期负债 72 11 26 14,112,462.97 14,692,403.64 其中专项应付款 77 12 27 2,399,145.38 5,748,726.53 长期负债合计 82 14 28 5,748,726.53 基地税款价值合计 82 14 40 5,748,726.53 建板税合计 86 30,663,068.40 15 41 82 10,780,000.00 10,780,000.00 16 42 20 10,780,000.00 10,780,000.00 16 43 44 20 20,441,48.14 20,465,46 88 31,984,063.55 16 43 44 20 20,441,48.14 20,465,46 89 31,984,063.55 20,441,48.14 10 48 48 31,886,148.14 40,405,406.55 30,465,148.14 40,405,177.24 40,405,177.24 10 48 60 73,533,785,64 88 126,653,69 42,870,717.24 40,405,777.72 10 48 73,533,785,64 81,856,148.14 40,405,777.72 40,405,777.72 40,405,777.72 10 73,533,785,64 81,856,148.14 148,757.77 148,777.77 148,777.77	金 27 木切倍款 77 が 25 16,511,608.35 20,441,130.17 其他长期负债 75 間 26 14,112,462.97 14,692,403.64 其中等项的付款 77 理 28 1,748,726.53 长期负债合计 82 净损失 29 5,748,726.53 地遊遊稅所 83 中 32 2,399,145.38 5,748,726.53 地遊稅的合計 86 市台市省内益 14 14 14 86 88 海崎 40 万人48,726.53 地境台小院 88 市台市省内 14 80 88 88 市台市省内 43 大小院市 86 88 市台市省内 14 24 大小配稅 88 88 市台市省内 43 大小配稅 30 30 30 30 市台市省内 47 46 大小配利 30 30 30 30 30 30 市台市省内 47 46 大小配稅 大小配稅 46 50 47 46 47 46 47 46 47 46 47 46 47 46 47 46 47 48 48 48 48 48 48 48 48 </td <td>金 22 介 26 16,511,608.35 20,441,130.17</td> <td></td> <td></td> <td></td>	金 22 介 26 16,511,608.35 20,441,130.17			
金 22 位 たりに511,608.35 20,441,130.17 其他长期负债 73 (1) 26 16,511,608.35 20,441,130.17 其他长期负债 77 (1) 26 14,112,462.97 14,692,403.64 其中、专项应付款 77 理 28 5,748,726.53 长期负债合计 82 中损失 29 2,399,145.38 5,748,726.53 建延税款价项 83 市 32 2,399,145.38 5,748,726.53 建延税款价 86 30,663,068.40 市 40 所有者权益 87 10,780,000.00 市 41 所有者权益 89 31,964,063.55 連載 43 五 五 五 市 43 五 五 五 市 46 五 五 五 市 47 五 五 五 市 48 五 五 五 五 市 48 五 五 五 五 市 48 五 五 五 五 市 40 五 五 五 五 市 48 五 五 五 五 市 50 73,533,785.64 31,364,053	金 22 区付債券 72 价 26 16,511,608.35 20,441,130.17 其他长期负债券 73 价 26 14,112,462.97 14,652,403.64 其中·专项应付款 77 理 28 5,748,726.53 长期负债合计 82 排稿 29 2,399,145.38 5,748,726.53 遊遊稅衛子 86 广合计 40 所有者权益 87 12,399,145.38 5,748,726.53 遊遊稅衛子 87 市台市 41 42 所有者权益 87 12,399,145.38 89 工場報 42 5,748,726.53 遊遊稅入發金 88 89 26 43 43 5,748,726.53 英收资本公积 89 27 46 5 5 5 6 <t< td=""><td>彦 22 介 25 16,511,608.35 20,441,130.17</td><td></td><td></td><td></td></t<>	彦 22 介 25 16,511,608.35 20,441,130.17			
上記	19 19 19 19 19 19 19 19	25 16,511,608.35 20,441,130.17			
16 5 16 5 16 6 20 441, 130 17	15	35 16,511,608.35 20,441,130.17			
(指) 26 14,112,462.97 14,682,403.64 其中·专项应付款 77 理 27 2,399,145.38 5,748,726.53 供助负债合计 82 净损失 29 5,748,726.53 递速税款所 83 产合计 40 万48,726.53 递速税款价 86 30,663,068.40 海衛 42 10,748,726.53 通域投资本 87 10,780,000.00 增档 42 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 25,333,785.64 81,856,148.14 46 25,337,785.64 81 87,577.7.24	14	100001			
(車) 27 2,389,145.38 5,748,726.53 住房周转金 78	(権) (45.38 2.399,145.38 5.748,726.53 住房周转金 78	11, 112,462.97 14,692,403.64			
理 28 长期负债合计 82 净损失 29 違極税项: 3 广合计 40 所有者权益: 86 30,663,068.40 产合计 40 水胶资本 87 10,780,000.00 上級拨入资金 88 31,964,063.55 3 增 42 養本公积 90 31,964,063.55 市 44 大分配利润 95 126,653.69 市 45 大分配利润 95 126,653.69 市 47 所有者权益合计 99 42,870,717.24 4 ボ 48 所有者权益合计 100 73,533,785.64 8 財务负责人: 北远远 財务负责人: 北远远 財務方人: 北远远 財務方法: 日本	理 28 长期负债合计 82 净损失 29 2,399,145.38 5,748,726.53 递递税项 83 产合计 40 所有者权益 86 排析 41 於本公积 89 通本公积 30 其业资本公积 89 点 43 其本公积 80 点 46 其本公积 80 点 46 其本公积 80 点 46 其本公租 80 点 46 其本分配利润 95 市 47 有益收益合計 96 前 48 所有者权益合計 90 原業 50 73,533,785.64 81,856,148.14 负债及所有者权益合计 90 財务负责人: 张远远 46 47 48 48 48	(章 27 2,399,145.38 5,748,726.53	转金		
P	持元 146	理 28	1		
	计 32 2,399,145.38 5,748,726.53 遊遊苑線/飲頭 83 产合计 40 所有者权益: 86 連結 42 以收收入资金 88 連載 44 資本公积 90 連載 44 資本公积 90 正 45 東外配利润 95 下 46 東外配利润 95 下 47 所有者权益台计 99 京 48 所有者权益台计 99 京 50 73,533,785.64 81,856,148.14 负债及所有者权益台计 100 京洋 50 73,533,785.64 81,856,148.14 负债及所有者权益台计 100	学损失 29	证税项:		
产合计 40 所有者权益: 86 30,663,068.40 产合计 40 英校资本 87 10,780,000.00 堆積 42 資本公积 89 31,964,063.55 堆 43 英校公报 90 126,653.69 产 46 未分配利润 95 126,653.69 下 47 所有者权益合计 99 42,870,717.24 4 頭 48 所有者权益合计 99 42,870,717.24 4 財务负责人: 张远远 財务负责人: 张远远 制表人: 王晶晶 財務方式: 五晶晶	亦合计 40 所有者权益: 86 游台计 40 原有者权益: 87 排精 42 股级人资金 88 增 43 股级人资金 92 增 44 股本公积 90 增 45 基本公积 90 产 46 大分配利润 95 下 47 大名配利润 95 项 48 所有者权益台计 99 成位及所有者权益台计 100 演译 所有者权益台计 100 演述 財务负责人: 张远远	72,399,145.38 5,748,726.53			
产合计 40 所有者权益: 7 10,780,000.00 建模 41 (2.000.00) (3.000.00) 推模 42 (3.000.00) (3.000.00) (3.000.00) 工業 43 (3.000.00) (3.000.00) (3.000.00) 工業 44 (4.000.00) (3.000.00) (3.000.00) 工業 46 (4.000.00) (4.000.00) (4.000.00) (4.000.00) 工業 (4.000.00) (4.000.00) (4.000.00) (4.000.00) (4.000.00) (4.000.00) (4.000.00) 工業 (4.000.00) (4.000.00) (4.000.00) (4.000.00) (4.000.00) (4.000.00) (4.000.00) (4.000.00) (4.000.00) (4.000.00) (4.000.00) (4.000.00) (4.000.00) (4.000.00) (4.000.00) (4.000.00) (4.000.00) (4.000.00) <td>产合计 40 所有者权益: 87 排析 42 24 88 排析 42 24 89 理 44 24 24 正 46 24 24 正 46 24 24 正 47 47 25 正 48 24 24 正 47 25 233,785.64 81,856,148.14 46 原有者权益合计: 50 73,533,785.64 81,856,148.14 46 66 原有者权益合计: 84 66 66 73,533,785.64 81,856,148.14 46 66</td> <td></td> <td></td> <td>30,663,068.40</td> <td>37,523,966.52</td>	产合计 40 所有者权益: 87 排析 42 24 88 排析 42 24 89 理 44 24 24 正 46 24 24 正 46 24 24 正 47 47 25 正 48 24 24 正 47 25 233,785.64 81,856,148.14 46 原有者权益合计: 50 73,533,785.64 81,856,148.14 46 66 原有者权益合计: 84 66 66 73,533,785.64 81,856,148.14 46 66			30,663,068.40	37,523,966.52
連結 42 2枚次資本 87 70,780,000,000 連結 42 20 31,964,063.55 32 重 43 34 364,063.55 32 市 46 未分配利润 95 126,653.69 市 47 50 73,533,785.64 81,856,148.14 ú後及所有者校益台下 99 42,870,717.24 4 財务负责人: 张远远 財务负责人: 张远远 利表人: 王晶晶 財务方式人: 张远远 財表元: 王晶晶	連結 42 上級稅入資金 88 連結 42 資本公积 89 連 43 夏水公积 90 連 44 東外配利約 95 下 46 東分配利約 95 下 47 東方配利約 95 京 48 所有者权益台中 99 京 50 73.533,785.64 81,856,148.14 负债及所有者权益总中 99 京洋 50 73.533,785.64 81,856,148.14 负债及所有者权益总中 100	(A)			
41 上級並入內室 86 31,964,063.55 2 資本公租 89 31,964,063.55 2 2 2 2 3 44 未分配利润 95 126,653.69 4 47 50 42,870,717.24 4 5 73,533,785.64 81,856,148.14 负债及所有者权益总计 100 73,533,785.64 8 8 5 73,533,785.64 81,856,148.14 负债及所有者权益总计 100 73,533,785.64 8 8	離销 41 近本公积 89 離析 42 盈余公积 89 重 44 盈余公积 90 ※ 46 未分配利润 95 ※ 47 方面 方面 方面 页 48 所有者权益台计 99 資本 所有者权益台计 99 ※ 50 73,533,785.64 81,856,148.14 负债及所有者权益总计 99 ※ 財务负责人: 张远远	2		10,780,000.00	10,780,000.00
#輯 42	42	147		24 OCA OCO EE	23 000 100 10
直 43 其中公益金 92 # 46 未分配利润 95 126,653.69 # 47 50 73,533,785.64 99 42,870,717.24 # 50 73,533,785.64 81,856,148.14 46,60,000 100 73,533,785.64 # 50 73,533,785.64 100 73,533,785.64	並 43 其中公益金 92 ※ 46 未分配利润 95 ※ 47 专项储备 50 73,533,785.64 81,856,148.14 负债及所有者权益总计 99 ※ 50 73,533,785.64 81,856,148.14 负债及所有者权益总计 99 ※ 50 73,533,785.64 81,856,148.14 负债及所有者权益总计 100	雄锐 42		01,500,400,10	01,904,000.00
単 44 未分配利潤 95 126,653.69 本 46 专项储备 专项储备 項 48 所有者权益合计 99 42,870,717.24 素 50 73,533,785.64 財务负责人: 王晶晶 財务负责人: 张远远 財表近 18,250,717.24	単 44 未分配利润 95	43	+		
※ 46 中央価格 47 所有者权益合计 99 42,870,717.24 所有者权益合计 99 73,533,785.64 ※ 50 73,533,785.64 財务负责人: 王晶晶	※ 46 专项储备 47 所有者权益合计 99 類 50 73,533,785.64 81,856,148.14 负债及所有者权益总计 100 系等 财务负责人: 张远远		+	128 853 8Q	1 588 118 07
页 48 所有者权益合计 99 42.870,717.24 系 50 73,533,785.64 81,856,148.14 负债及所有者权益总计 100 73,533,785.64 解答负责人: 王晶晶 財务负责人: 张远远 制表人: 王晶晶	第 47 第 533,785.64 81,856,148.14 所有者权益合计 99 解务负责人: 张远远 斯务负责人: 张远远) ²⁴ 46	t	000000	1000
页 48 所有者权益台计 99 42.870,717.24 50 73,533,785.64 81,856,148.14 负债及所有者权益总计 100 73,533,785.64 聚养 财务负责人: 张远远 附表人: 王晶晶	页 所有者权益合计 99 系等 73,533,785.64 81,856,148.14 负债及所有者权益总计 100	47	m #1%		
页 48 所有者权益台计 99 42.870,717.24 50 73,533,785.64 81,856,148.14 负债及所有者权益总计 100 73,533,785.64 聚养 财务负责人: 张远远 制表人: 王晶晶	页 48 所有者权益合计 99 50 73,533,785.64 81,856,148.14 负债及所有者权益总计 100 《详》 财务负责人: 张远远	遠延税项:			
50 73,533,785.64 81,856,148.14 负债及所有者权益总计 100 73,533,785.64 N 財务负责人: 张远远 制表人: 王晶晶	50	页 48		L	44 332 181 62
以注 财务负责人: 张远远 制表人: 王晶晶 张远远	N. Y. W.	50 73,533,785.64 81,856,148.14		+	81 856 148 14
温泉			1	-	1000,10
	はなが	X	张远近		

项目	行次	上年数	本年累计数
一,营业收入	1	29,836,239.20	32,874,684.90
减:营业成本	2	24,791,133.05	26,161,911.61
税金及附加	3	115,782.71	1,069,692.38
其中: 消费税	4	0.00	0.00
营业税	5	0.00	0.00
城市维护建设税	6	0.00	0.00
资源税	7	0.00	0.00
土地增值税	8	0.00	0.00
城镇土地使用税、房产税、车船税、印花税	9	0.00	0.00
教育费附加、矿产资源补偿费、排污费	10	0.00	0.00
销售费用	11	0.00	0.00
其中商品维修费	12	0.00	0.00
广告费和业务宣传费	13	0.00	0.00
管理费用	14	3,500,803.24	3,967,858.31
其中: 开办费	15	0.00	0.00
业务招待费	16	0.00	0.00
研究费用	17	0.00	0.00
财务费用	18	269,528.48	218,583.96
其中: 利息费用(收入以"-"填列)	19	0.00	0.00
加:投资收益(亏损以"-"填列)	20	0.00	0.00
二、营业利润(亏损以"-"填列)	21	1,158,991.72	1,456,638.64
加:营业外收入	22	75,998.75	5,016.32
其中; 政府补助	23	0.00	0.00
减:营业外支出	24	128,717.16	190.58
其中: 坏账损失	25	0.00	0.00
无法收回的长期债券投资损失	26	0.00	0.00
无法收回的长期股权投资损失	27	0.00	0.00
自然灾害等不可抗力因素造成的损失	28	0.00	0.00
税收滞纳金	29	0.00	0.00
三、利润总额(亏损以"-"填列)	30	1,106,273.31	1,461,464.38
减:所得税费用	31	0.00	0.00
四、净利润(净亏损以"一"填列)	32	1,106,273.31	1,461,464.38

单位负责人: 刘溪洋

财务负责人: 张远远 张远远

制表人: 王晶晶

1	A selection of	计图片 计数数数据	Œ		人 一 上 一 上 一 上 一 上 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一
203,169.78	83	现金及现金等价物净增加额	203,168.89	56	五、現金及現金等价物净增加顺
	82	减:现金等价物的期初余额		22	四、汇率变动对现金的影响
	81	加: 现金等价物的期末余额	5,575,565.78	54	筹资活动产生的现金流量净额
85,960.42	80	减;现金的期初余额	224,434.22	53	现金流出小计
289,130.20	62	现金的期末余额	224,434.22	52	支付的其他与筹资活动有关的现金
		3、现金及现金等价物净增加情况;		46	分配股利、利润或偿付利息所支付的现金
				45	偿还债务所支付的现金
			5,800,000.00	44	现金流入小计
				43	收到的其他与筹资活动有关的现金
	78	融资租入固定资产	5,800,000.00	40	借款所收到的现金
	77	一年内到期的可转换公司债券	1	38	吸收投资所收到的现金
	92	债务转为资本			三、筹资活动产生的现金流量;
		2、不涉及现金收支的投资和筹资活动;	-3,929,521.82	37	投资活动产生的现金流量净额
			3,929,521.82	36	现金流出小计
				35	支付的其他与投资活动有关的现金
				31	投资所支付的现金
-1,442,874.18	75	经营活动产生的现金流量净额	3,929,521.82	30	购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
-2,837,215.13	74	其他	t	59	现金流入小计
4,060,898.12	73	经营性应付项目的增加(减:减少)		28	收到的其他与投资活动有关的现金
-784,404.53	72	经营性应收项目的减少(减:增加)		25	处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额
-3,985,207.04	71	存货的减少(减:增加)		23	取得投资收益所收到的现金
	20	递延税款贷项(减:借项)		22	收回投资所收到的现金
	69	投资损失(减:收益)			二、投资活动产生的现金流量;
62,654.57	89	财务费用	-1,442,875.07	21	经营活动产生的现金流量净额
	67	固定资产报废损失	47,136,988.15	20	现金流出小计
	99	处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)	13,284,949.30	18	支付的其他与经营活动有关的现金
	65	预提费用增加(减; 减少)	3,747,834.02	13	支付的各项税费
	64	待摊费用减少(减:增加)	2,495,243.22	12	支付给职工以及为职工支付的现金
	61	长期待摊费用摊销	27,608,961.61	10	购买商品、接受劳务支付的现金
	09	无形资产摊销	45,694,113.08	6	现金流入小计
579,940.67	59	固定资产折旧	22,000,989.26	8	收到的其他与经营活动有关的现金
	58	加: 计提的资产减值准备		3	收到的税费返还
1,460,459.16	57	净利润	23,693,123.82	-	销售商品、提供劳务收到的现金
		1、将净利润调节为经营活动现金流量:	_		一、经营活动产生的现金流量。
金额	行次	补充资料	金额	行次	一
单位: 元		H	编制日期: 2024年12月31日	编制日	编制单位: 南阳华岳路桥卫程有限公司
		流 量 表	俎	別	\$100 PM
					が開び
					The state of the s

所有者权益(股东权益)变动表

2024年度

编制单位:南阳华岳路桥工程有限公司

单位: 元

	年期未余職 東收资本(或 股本) (优先股 股本) 中国東京 10,780,000,00 学情更正 10,780,000,00 年期初余額 10,780,000,00 所有者投入和減少資本 - 校益工具持有者投入資本 - 支付计入所有者权益的金額 -	25	資本公积	掛 数	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
10.780,000,00 10.780,000	年期末余額 股本) 优先股 永续億 年財政策変更 10,786,000.00 - 全情更正 10,786,000.00 - 年期初余額 10,786,000.00 - 第合收益总額 - - 有投入和減少資本 - - 校位工具持有者投入資本 - - 支付计入所有者权益的金額 - -		以 本公於	故	毎米な校	不分配付用	所有有权益合订
年期未会職 11.5780,000.00<	年期末余額 10,786,000.00 計政策变更 10,786,000.00 全期初余額 10,786,000.00 明增减逐功金額(減少以","号填列) - 综合收益总额 - 权益工具持有者投入资本 - 支付计入所有者权益的金额 -	-					
計政策変更 計政策変更 10.786,000.00 10.786,000.00 10.786,000.00 10.786,000.00 10.56651.00 4 発情更正 10.786,000.00 10.786,000.00 10.786,000.00 10.786,000.00 10.786,000.00 4 発情更正 10.786,000.00 10.786,000.00 10.786,000.00 10.786,000.00 4 10.786,000.00 4 発情更大的確認 10.786,000.00	计政策变更 差错更正 年期初余额 10,786,000.00 9間構成变动金額(減少以"-"号填列) 综合收益总额 所有者投入和減少资本 7位正具持有者投入资本 2位计入所有者权益的金额		31,964,163.55	1	r	126,653.69	42,870,817.24
発情更正 発情更正 31,944,16.25 4 空情更正 31,944,16.25 4 126,653.69 4 財産を受めを観察してい。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	注 错更正 (4期初余额 (4期初余額 10,789,000.00 (6) (6) (6) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7						
	年期初余額 10,780,000.00 明增減変动金額 (減少以"-"号填列) - 综合收益总额 - 所有者投入和減少資本 - 权益工具持有者投入资本 - 文付计入所有者权益的金额 -						1
年期初余額 10.780,000.00 1 126,653.69 4 126,653.19 4 126,653.19 4 126,653.19 4 126,653.19 4 126,653.19 4 126,653.19 4 126,653.19 4 126,653.19 4 126,653.19 4 126,653.19 4 126,653.19 4 126,653.19 4 126,653.19 4 126,653.19 4 126,	年期初余额 10,789,000.00 場場域変动金額(減少以"-"号填列) - 综合收益总额 - 所有者投入和減少資本 - 存益人的普通股 - 权益工具持有者投入资本 - 支付计入所有者权益的金额 -						
明構成受动金額 (減少以19 填列) 1,461,464.38 場合收益总額 1,461,464.38 所有者投入和減少資本 1,461,464.38 查投入的普通股 1,461,464.38 查收入的普通股 1,461,464.38 查收入的普通股 1,461,464.38 查收入的普通股 1,461,464.38 有效公司 1,461,464.38 有效公司 1,461,464.38 有效公司 1,461,464.38 自身人的普通股 1,461,464.38 自身人的普通股 1,461,464.38 自身人的普通股 1,461,464.38 自身人的主意 1,461,464.18,507 自身人的主意 1,461,464.38	\$		31,964,163,55	1	1	126,653.69	42,870,817.24
综合收益总额 所有者投入和減少資本 1.461,461.38 育技人的普通股 -	综合收益总额 所有者投入和减少资本 者投入的普通股 权益工具特有者投入资本 支付计入所有者权益的金额			,	1	1,461,464.38	1,461,464.38
所有者投入和減少資本 一 一 <t< td=""><td>所有者投入和减少资本 者投入的普通股 权益工具特有者投入资本 支付计入所有者权益的金额</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>1,461,464.38</td><td>1,461,464.38</td></t<>	所有者投入和减少资本 者投入的普通股 权益工具特有者投入资本 支付计入所有者权益的金额					1,461,464.38	1,461,464.38
查投入的普通股 - 每投入的普通股 交付计入所有者权益的金额 -	者投入的普通股 权益工具特有者投入资本 支付计入所有者权益的金额				,	1	1
Q並工具持有者投入資本 Q並工具持有者投入资本 有付入所有者权益的金额	2.其他权益工具持有者投入资本 3.股份支付计入所有者权益的金额 4.其他						1
文付计入所有者权益的金额 有利的分配 商金公积 一 有者(或股本)的分配 一 所有者权益内部结转 一 公积转增资本(或股本) 一 公积转增资本(或股本) 一 会现转增资本(或股本) 一 专项储备 一 是取 一 使用 10,780,000,00 加期末余額 10,780,000,00	3.股份支付计入所有者权益的金额 4.其他						
利润分配 Aling ABL	4.其他						1
A) 相角分配 A) 相角分配 应条公积 百者(或股条)的分配 A) B B							1
CAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA			,			'	,
自者(或股东)的分配 有者权益内部结转	1.提取盈余公积						1
所有者权益内部结转 -	2.对所有者(或股东)的分配						ī
所有者权益内部结转 -	3.其他						1
公积转增资本(或股本) (2) <			1	1	,		'
公积转增资本(或股本) (2) (2) (3) (4) <	1.资本公积转增资本(或股本)						1
公积弥补亏损 一 一 一 一 一 一 一 专项储备 一	2.盈余公积转增资本(或股本)						1
专项储备 - <td>3.盈余公积弥补亏损</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>!</td>	3.盈余公积弥补亏损						!
10,780,000,00	4.其他						1
10,780,000,00			T.	1	1		į
10,780,000,00	1.本期提取						1
10,780,000,000	2.本期使用						į
10,780,000.00	(六) 其他						
	10,780,000.00		31,964,163,55	6	ı	1,588,118.07	44,332,281.62

会计报表附注

截止 2024年12月31日

金额单位: 人民币元

注释一: 公司简介

南阳华岳路桥工程有限公司(以下简称本公司)于 2016年6月 14日取得西峡县市场监督管理局核发的营业执照,注册号 91411323MA3XARWX4L,法定代表人:刘溪洋;注册资本 4000万元,经营范围:建设工程施工,输电、供电、受电电力设施的安装维修和试验,地质灾害治理工程施工,电气安装服务:建筑劳务分包,公路管理与养护,建筑物拆除作业 (爆破作业除外)等。

注释二: 财务报表的编制基础

一、编制基础

本公司财务报表以《企业会计准则》为编制基础。

二、遵循企业会计准则的声明

本公司声明,本公司编制的财务报表已按《企业会计准则》及相 关的规定编制,符合《企业会计准则》及规定的要求,真实、完整地 反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量情况。

三、重要会计政策、会计估计的说明

本财务报表所载财务信息根据下列主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法编制。

1、会计制度 -

公司执行《企业会计准则》的规定。

2、会计年度

本公司会计年度采用公历年度,即每年自1月1日起至12月31日止。

3、记账本位币

本公司记账本位币和编制本财务报表所采用的货币为人民币。除 有特别说明外,金额单位均以人民币元表示。

4、记账基础及计价原则

公司采用借贷记账法,以权责发生制为记账基础,以历史成本为 计价原则。

5、现金流量表之现金及现金等价物的确定标准

本公司现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。 现金流量表之现金等价物指持有期限短(一般是指从购买日起六个月 内到期)、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小 的投资及银行承兑汇票。

- 6、应收款项坏账损失核算方法
- (1) 坏账损失确认标准:
- A、因债务人破产或死亡,以其破产财产或遗产清偿后,仍然不 能收回的应收款项;
- B、因债务人逾期未履行偿债义务,超过三年仍然不能收回的应收款项;
 - C、有确凿的证据表明不能收回的应收款项。
 - 以上确实不能收回的应收款项,按国家规定的审批核销权限分级

批准后,作为坏账核销。

(2)公司坏账核算方法:采用直接转销法核算。不计提坏账准备,在实际发生坏账损失时直接计入当期损益。

7、存货计价方法

本公司存货主要包括原材料、在产品、产成品及商品、低值易耗品。

- (1) 存货取得的计价方法: 购入原材料以买价加运输、装卸、保险等费用作为实际成本; 产成品以制造和生产过程中发生的实际数量乘以计划价核算。
 - (2) 存货发出的计价方法: 采用计划价法计价。
 - (3) 低值易耗品和包装物的摊销方法: 采用一次转销法。
 - (4) 存货的盘存制度: 永续盘存制。
- (5)期末存货计价原则及存货跌价准备确认标准和计提方法: 期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价;期末,在对存货进行全 面盘点的基础上,对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售 价格低于成本等原因,预计其成本不可收回的部分,提取存货跌价准 备。存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提 取,可变现净值按估计售价减去估计完工成本、销售费用和税金后确 定。

8、长期投资核算方法

债券投资的收益按照投资债券的面值及债券利率计算当年应计利息, 计入当年损益。

长期股权投资,投资额占被投资单位权益资本 20%以下的采用成本法核算,20%-50%采用权益法,50%以上的采用成本法核算。

9、固定资产

- (1) 固定资产标准: 固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的,使用寿命超过一个会计年度的有形资产。
 - (2) 固定资产的确认条件:

与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业;

该固定资产的成本能够可靠计量。

- (3) 固定资产分类: 固定资产包括房屋建筑物、生产设备、运输设备、电子设备及其他等。
 - (4) 固定资产计价:

外购的固定资产,以实际支付的购买价款、相关税费、使固定资产达到预定可使用状态前所发生的归属于该项资产的运输费、装卸费、安装费和专业人员服务费等作为该项固定资产的初始成本。

自行建造的固定资产,以建造该项资产达到预定可使用状态前所 发生的必要支出作为该项固定资产的初始成本。

投资者投入的固定资产,以投资合同或协议约定的价值为该项固定资产的初始成本。

(5) 固定资产折旧:

固定资产折旧以预计使用年限在预留 5%的残值后采用直线法计算,并按固定资产类别,预计使用年限确定折旧率。

固定资产分类预计折旧年限及年折旧率如下表:

类别	折旧年限(年)	_ 年折旧率 (%)
房屋建筑物	20	4.75
生产设备	10	9.50
运输设备	5	19.00
电子设备及其他	5	19.00

(6)固定资产后续支出的处理:固定资产后续支出在同时满足下面条件时计入固定资产成本,如有替换部分,应扣除其账面价值: (1)与该支出有关的经济利益很可能流入企业;(2)该后续支出的成本能可靠地计量。不符合上述条件的固定资产后续支出,在发生时计入当期损益。

以经营租赁方式租入固定资产发生的改良支出,予以资本化,作为长期待摊费用,在合理的期间摊销。

10、在建工程

- (1) 在建工程的计价:按实际发生的支出确定工程成本。自营工程按直接材料、直接工资、直接施工费等计量;出包工程按应支付的工程价款等计量;设备安装工程按所安装设备的价值、安装费用、工程试运转等所发生的支出确定工程成本。
- (2) 在建工程结转固定资产的时点:本公司建造的固定资产在 达到预定可使用状态之日起,根据工程预算、造价或工程实际成本等, 按估计的价值结转固定资产,次月起开始计提折旧。

11、借款费用的会计处理方法

借款费用包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因

外币借款而发生的汇兑差额等。公司发生的借款费用,可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的,予以资本化,计入相关资产成本;其他借款费用,在发生时根据其发生额确认为费用,计入当期损益。

(1) 资本化条件

在同时具备下列三个条件时, 借款费用予以资本化:

资产支出已经发生;

借款费用已经发生:

为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。

(2) 资本化金额的确定

资本化金额按以下原则确定:

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的,以专门借款当期实际发生的利息费用,减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。

为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的,根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率,计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

(3) 暂停资本化

若固定资产的购建活动发生非正常中断,并且中断时间连续超过 3 个月,则暂停借款费用的资本化,将其确认为当期费用,直至资产 的购建活动重新开始。

(4) 停止资本化

当所购建的固定资产达到预定可使用状态时,停止其借款费用的 资本化,以后发生的借款费用于发生当期确认为费用。

12、无形资产

(1) 无形资产计价: 无形资产按实际成本进行初始计量。自行 开发的无形资产,其成本包括自满足一定条件后达到预定用途前所发 生的支出总额。

(2) 无形资产摊销:

公司无形资产自取得当月起在预计使用年限内分期平均摊销,计 入损益。合同规定有受益期限的,在受益期限内平均摊销;合同没有 规定受益期限而法律规定有效期限的,按不超过法律规定的有效期限 平均摊销;合同规定了受益期限而法律也规定了有效期限的,摊销年 限不超过两者之中较短者;合同和法律均未规定受益期限或有效期限 的,按不超过 10 年的期限摊销。

13、收入确认原则

本公司的营业收入主要包括销售商品收入,其收入确认原则如下:

- (1)本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方:
- (2)本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权,也 没有对已售出的商品实施有效控制;
 - (3) 收入的金额能够可靠地计量:
 - (4) 相关的经济利益很可能流入企业;
 - (5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

14、成本费用的确认原则

本公司在生产经营中发生的各项费用,以实际发生数计入成本、 费用。期间费用直接计入当期损益,成本计入所生产的产品、提供劳 务的成本。

15、员工社会保障及福利的内容、计提方法和会计处理方法

本公司员工社会保障及福利主要根据国家和当地政府有关规定 及公司的制度按比例提取并向指定机构缴付社会保险统筹,所需费用 直接计入成本费用。

16、所得税的会计处理方法

本公司所得税的会计核算采用应付税款法核算。

17、利润分配方法

利润分配由本公司依据《中华人民共和国公司法》及本公司章程 决议制定,在弥补以前年度未弥补亏损后按以下比例分配:

- (1) 按净利润的 10%提取法定盈余公积金;
- (2)按净利润的 5%提取法定公益金(2006 年 1 月 1 日执行新《公司法》后本公司根据修改后的章程不再计提法定公益金,原法定公益金余额根据财政部财企[2006] 67 号文的有关规定转入盈余公积);
 - (3) 提取任意盈余公积, 具体比例由股东会决定:
 - (4) 向投资人分配利润。

四、主要税项

1、增值税

本公司商品销售收入适用的增值税。其中:内销商品销项税率为9%。

本公司购买原材料等所支付的增值税进项税额可以抵扣销项税。本公司的增值税应纳税额为当期销项税抵减当期进项税后的余额。

2、城市维护建设税

按实际缴纳的流转税的5%缴纳。

3、教育费附加、地方教育费附加

教育费附加按实际缴纳的流转税的 3%缴纳, 地方教育费附加按 实际缴纳的流转税的 2%缴纳。

4、企业所得税

本公司企业所得税的适用税率 2007 年以前为 33%, 2008 年以后为 25%。

五、会计政策、会计估计变更的会计处理方法

对于会计政策变更,采用如下两种会计处理方法:

- 1、法律或行政法规、规章要求改变会计政策的同时,也规定了会计政策变更的会计处理方法的,这时按规定的办法处理。
- 2、国家没有规定的相关的会计处理方法,则采用追溯调整法进行会计处理。

对于会计估计变更采用未来适用法。

注释五: 会计报表主要项目注释

(一) 资产负债表项目注释

1. 货币资金

截止 2024 年 12 月 31 日,期末余额 289,130.2 元,比年初上升 236.35%。具体明细项目列示如下:

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
银行存款	289, 130.20	85, 960.42
合 计	289, 130.20	85, 960.42

2. 应收账款

截止 2024 年 12 月 31 日,应收账款期末余额 50,743,334.86 元。 主要债务人情况

单位名称	期末余额	占应收账款余额的 比例
中州公路工程有限公司	39, 331, 945. 16	77.51%
河南万方交通工程有限公司第二分公司	4, 103, 439. 35	8.09%
西峡县交通运输局	4, 540, 455. 75	8.95%
河南路彩建材有限公司	256, 484. 54	0.51%
付军建	100, 000. 00	0.20%
西峡县福联建设工程有限公司	1, 454, 751. 8	2.87%
岭南生态文旅股份有限公司	698, 043. 89	1.38%

3. 预付款项

截止 2024 年 12 月 31 日, 预付账款余额 3,642,892.05 元, 比年 初数下降 29.64%。

主要债务人情况:

		占预付账
单位名称	期末余额	款余额的
		比例
西峡县房产管理中心	1, 493, 553	41%
南阳海川路桥建设工程有限公司	756, 568	20.77%
栾川县广宇混凝土有限公司	522, 359. 9	14. 34%
西峡县山城物资产业有限公司	146, 708. 48	4.03%
庞振、柴玉红	110, 700	3.04%
河南省中施展建筑劳务有限公司	94, 857	2.60%
刘东旺	100,000	2.75%
封振强	40,000	1.10%
南阳傲翔建设集团有限公司	40,000	1.10%

4. 其他应收款

截止 2024 年 12 月 31 日, 其他应收款余额 2, 144, 564. 17 元, 比 年初数下降 60.4%。

主要债务人情况:

単位名称	期末数	占其他应收款余额的 比例	
刘敏	2, 534, 631	118. 18%	
中虔建设集团有限公司	1, 996, 562. 06	93. 09%	
余建忠	147, 239. 00	6.86%	

杨占敏	400, 000. 00	18.65%
张保国 (张贵杰)	220, 000	10.25%
王伟	237, 017	11.05%
张祖建	247, 631	11.54%

5. 存货

截止 2024 年 12 月 31 日,存货余额 19,287,500.33 元,比年初数上升 26.04%,具体构成如下:

项 目	期末数	比例	期初数	比例
库存材料	281, 984. 1	1.46%	512, 661. 92	3. 35%
库存产成品	966, 280. 23	5. 00%	1, 154, 203. 91	7. 54%
工程施工	16, 747, 266. 89	86. 83%	12, 904, 877. 26	84. 33%
辅助生产	1, 288, 367. 34	6. 68%	726, 948. 43	4. 75%
低值易耗品	3, 601. 77	0.03%	3, 601. 77	0.03%
合计	19, 287, 500. 33	100.00%	15, 302, 293. 29	100.00%

6. 固定资产及累计折旧

截止 2024 年 12 月 31 日,固定资产原值 20,441,130.17 元,累 计折旧 14,692,403.64 元,固定资产净值 5,748,726.53 元。具体构 成如下:

项 目	原 值	累计折旧	净 值
房屋建筑物及附 属设施	6, 112, 220. 45	2, 297, 481. 00	3, 814, 739. 45
施工机械及其他 生产设备	9, 774, 643. 07	8, 671, 861. 71	1, 102, 781. 36

运输工具	1, 072, 148. 85	807, 836. 84	264, 312. 01
办公设备	162, 018. 34	127, 211. 9	34, 806. 44
其他设备	3, 320, 099. 46	2, 788, 012. 19	532, 087. 27
合计	20, 441, 130. 17	14, 692, 403. 64	5, 748, 726. 53

7. 短期借款

截止 2024 年 12 月 31 日,期初余额 3,000,000.00 元,期末余额为 5,800,000.00 元。

项目	期初数	期末数
短期借款	3,000,000	5, 800, 000

8. 应付账款

截止 2024 年 12 月 31 日,应付账款余额 14,685,992.97 元。 主要债务人情况:

供应商名称	金 额	占比
河南省淅川水泥有限公司	1, 438, 538. 15	9.79%
西峡县源杰路桥有限公司	1, 400, 916. 49	9. 53%
西峡县鹏宇建筑工程有限公司	775, 436. 00	5. 28%
回车祥瑞机械租赁部	730, 196. 00	4. 97%
西峡县永固混凝土有限公司	634, 768. 95	4.32%
西峡县辰邦建材经营部	1, 133, 162. 00	7.72%
西峡县绿满园园林绿化有限公司	904, 960. 00	6. 16%

西峡县锦海工程有限公司	909, 955. 18	6.19%
河南金鼎建设工程有限公司西		4 5 400
峡县一分公司	695, 500. 00	4.74%

9. 预收账款

截止 2024 年 12 月 31 日, 预收账款余额 5,489,944.57 元。

金 额	占比
545, 199. 70	9. 94%
4, 344, 744. 87	79. 14%
100, 000. 00	1.82%
300, 000. 00	5. 46%
200, 000. 00	3. 64%
5, 489, 944. 57	100%
	545, 199. 70 4, 344, 744. 87 100, 000. 00 300, 000. 00 200, 000. 00

10. 应交税费

截止 2024 年 12 月 31 日,应交税费余额 262,943.53 元。具体构成如下:

税种	期初数	期末数
城建税	0.01	12, 718. 54
教育费附加		7, 631. 12
地方教育费附加	-0.01	5, 087. 41

应交增值税	-19, 115. 58	222, 923. 96
个人所得税	35.88	24. 10
印花税	0.01	12, 596. 60
资源税		1, 961. 80
合计	-19, 079. 69	262, 943. 53

11. 其他应付款

截止 2024 年 12 月 31 日,其他应付款余额 9,098,316.45 元。具体构成如下:

项目	期末余额	占比
王海伟	2, 255, 000. 20	24.78%
黄波	2, 410, 000. 00	26. 49%
暂估应付款	956, 598. 00	10.51%

12. 应付职工薪酬

截止 2024 年 12 月 31 日,应付职工薪酬余额 2,186,769.00 元。

13. 实收资本

截止 2024 年 12 月 31 日,股本余额 10,780,000 元。

投资者名称	期末数	期初数
河南省中州公路工程有限公司	3, 060, 000	3, 060, 000
王海伟	5, 070, 000	5, 070, 000
李继武	1, 200, 000	1, 200, 000

余建忠	400, 000	400, 000
孙书九	350, 000	350, 000
黎辉	200, 000	200,000
胡博	200, 000	200,000
王伟	200, 000	200,000
符欢欢	100, 000	100,000
合 计	10,780,000	10, 780, 000

14. 资本公积

截止 2024 年 12 月 31 日,资本公积余额 31,964,063.55 元。

15. 未分配利润

截止 2024 年 12 月 31 日,未分配利润余额 1,588,118.07 元。

项 目	期末数	期初数
利润分配	1, 588, 118.07	126,653.69
合 计	1, 588, 118.07	126,653.69

(二) 利润表项目注释

1. 营业收入

2024 年度业务收入累计发生额为 32,874,684.90 元,项目列示如下:

名称	期末余额	比例 (%)
工程结算收入	28, 972, 522.15	88.13%
合 计	28, 972, 522.15	88.13%

2. 营业成本

2024 年度主营业务成本累计发生额为 26, 161, 911.61 元, 其中: 工程结算成本 22, 522, 990.37 元, 其他业务支出 3, 638, 921.24 元, 项目列示如下:

名称	期末	余额
石你	金额	比例 (%)
工程结算成本	22, 522, 990.37	86.09%
合计	22, 522, 990.37	86.09%

3. 税金及附加

2024年度税金及附加累计发生额为1,069,692.38元,项目列示如下:

税种	本期数	比例 (%)
车船税	420.00	0.04%
房产税	14,364.68	1.39%
土地使用税	47,950.16	4.48%
城建税	32, 162.26	3%
教育费附加	19, 250.43	1.8%
地方教育费附加	12, 833.61	1.2%
印花税	32, 814.68	3.07%
资源税	11, 318.76	1.06%
契税	864, 916.21	80.86%
残疾人就业保证金	33, 661.59	3.1%
合计	1, 069, 692.38	100.00%

4. 管理费用

2024年度管理费用累计发生额为 3,967,858.31 元,项目列示如下:

项目	本期数	比例 (%)
职工工资	696, 437	17.55%
办公费	61, 160. 51	1.54%
差旅费	321. 32	0.01%
水电费	20, 648. 96	0. 52%
机械费	203, 310. 94	5. 12%
招待费	482, 606. 06	12. 2%
税金	4, 579. 50	0. 12%
福利费	281, 277. 33	7.01%
折旧费用	327, 004. 38	8. 24%
养老金	602, 485. 5	15. 18%
医保金	263, 216. 82	6. 63%
住房公积金	144, 105. 00	3. 63%
工会费	66, 968. 58	1. 69%
职工教育经费	15, 780. 00	0.4%
其他费用	204, 990. 16	5. 17%
职业年金	101, 907. 00	2. 57%
安全费用	455, 040. 69	11. 47%

工伤保险	21, 727. 35	0.55%
失业保险	14, 291. 21	0.4%
合计	3, 967, 858. 31	100%

5. 财务费用

2024年度财务费用累计发生额为218,583.96元,项目列示如下:

项目	本期数	比例 (%)
财务费用	218, 583.96	100%

6. 营业外收入

2024年度营业外收入累计发生额为5016.32元,明细列示如下:

项 目	本期数	比例 (%)
营业外收入	5, 016. 32	100%
合 计	5, 016. 32	100%

7. 营业外支出

2024年度营业外支出累计发生额为190.58元,明细列示如下:

项 目	本期数	比例 (%)
营业外支出	190. 58	100%
合 计	190. 58	100%

(三) 现金流量表有关项目注释

本年总现金流入 51, 494, 113.08 元, 总现金流出 51, 290, 943.30 元, 现金净流量 203, 169.78 元。其中:

1、经营活动现金流入 45, 694, 113.08 元, 经营活动流出 47, 136, 987.26 元, 经营活动现金净流量-1, 442, 874.18 元;

- 2、投资活动现金流入 0 元,投资活动现金流出 3,929,521.82 元,投资活动现金净流量-3,929,521.82 元;
- 3、筹资活动现金流入 5,800,000.00 元,筹资活动现金流出 224,434.22 元,筹资活动现金净流量 5,575,565.78 元。

注释六:或有事项

本公司无需要披露的或有事项。

注释七: 承诺事项

本公司无需要披露的承诺事项。

注释八:资产负债表日后事项

本公司无需要披露的资产负债表日后事项。

注释九: 其他重要事项、

本公司无需要披露的其他重要事项。

上述二〇二四年度公司会计报表和会计报表有关附注,系我们按《企业会计准则》、《企业会计制度》和有关规定及补充规定编制。

企业名称: 南阳华岳路桥工程有限公司

单位负责人: 刘溪洋

财务负责人: 张远远

其他重大事项:本报告书已按照有关规定对有关信息作了如实披露,无其他为避免对本报告书内容产生误解而必须披露的信息。

声明: 本人(以及本人所代表的机构)承诺本报告及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

南阳华岳路桥工程有限公司(盖章)

法定代表人(签字):3000020

二〇二五年四月二十九



(三) 近年完成的类似项目情况表

项目名称	西峡县2024年农村公路桥梁建设项目第一标段(施工标)
项目所在地	西峡县
发包人名称	西峡县交通运输局
发包人地址	西峡县灌河路
发包人电话	张先生0377-69663492
合同价格	12387142.87元
开工日期	2024. 8. 15
交工日期	2024. 12. 15
承担的工作	由回车镇杜店桥等13座桥梁组成,全长466.163米,桥梁 设 计荷载采用公路-II级标准。
工程质量	 合格
项目经理	杜伟刚
项目总工	王伟
总监理工程师及 电话	刘佩洋 13803870810
项目描述	西峡县2024年农村公路桥梁建设项目施工1标由黑漆河界岭桥、寨根乡双水磨桥、回车镇杜店桥、桑坪镇半沟桥、桑坪镇西沟口桥、桑坪镇下湾桥、桑坪镇岭根桥、桑坪镇、玉皇岈桥、田关镇河上桥、丁河镇东岗桥、丁河镇凤山桥、丁河镇庄口桥、五里桥镇白河湾桥13三座桥梁组成。
备注	第一项 共四项
备注	

- 注: 1. 每张表格只填写一个项目,并标明序号。
 - 2. 本表后附中标通知书、合同协议书的复印件。
 - 3. 如近年来,投标人法人机构发生合法变更或重组或法人名称变更时,应提供相关部门的合法批件或其他相关证明材料来证明其所附业绩的继承性。

中标通知书(工程类)

致 南阳华岳路桥工程有限公司:

西峡县交通运输局委托西峡县交投总民工程管理有限责任公司对西峡县 2024年农村公路桥梁建设项目《项目编号: E41010 05206003617001标段名称:西峡县2024年农村公路桥梁建设证 11标段》组织招标。通过评标委员会评审,并经招标人确认,贵单位喜欢该项目的中标人。

贵单位接到本通知后,尽道与招标人联系、治谈合同事宜。中标内容如下:

西峡县2024年农村公路桥梁建设项目
E4101005206003617001
河南省-南阳市-西峡县
大写:壹仟贰佰叁拾捌万柒仟壹佰肆拾贰圆捌角柒分 (小写:12387142.87)
杜伟刚 豫241181942400
120
符合国家、地方相关规范及要求,达到合格及以上标准

贵单位在收到中标通知书后 30 日历天内,与招标人签订合同等相关事

宜。

招标人類映县交通运输局(盖章

招标代理机构、西峡县交货惠民工程管理有限 表节公司 (盖章)

见证单位:西峡县公共资源交易中心

(盖章)

2024年08月13日

★正 本

西峡县 2024 年农村公路桥梁建设项目

合同协议书

西峡县交通运输局二0二四年八月

合同协议书

西峡县交通运输局(以下简称"紫包人")为实施西峡县 2024 年农村公路桥梁建设项目施工人标,已接受南阳华岳路桥工程有限公司(以下简称"承包人")对该项目。工的投标 发包人和承包人共同达成如下协议。

1. 西峡县 2024 年农村公路桥梁建设项目施工 1 标由黑漆河界岭 桥、寨根乡双水磨桥、回车镇杜店桥、桑坪镇半沟桥、桑坪镇西沟口 桥、桑坪镇下湾桥、桑坪镇岭根桥、桑坪镇玉皇岈桥、田关镇河上桥、 丁河镇东岗桥、丁河镇凤山桥、丁河镇庄口桥、五里桥镇白河湾桥 13 三座桥梁组成: (1) 黑漆河界岭桥, 采用 2×20m 预应力钢筋混 凝土空心板,桥梁全长 52.08m,全宽 7.0m,桥梁设计荷载采用公路 二级: (2) 寨根乡双水磨桥,采用 3×16m 预应力钢筋混凝土空心 板,桥梁全长 60.04m, 全宽 8.5m,桥梁设计荷载采用公路二级: (3) 回车镇杜店桥,采用 2×7.55m 钢筋混凝土现浇板,桥梁全长 17.1m, 全宽 7.5m, 桥梁设计荷载采用公路二级: (4) 桑坪镇半沟桥, 采用 1×5m 钢筋混凝土现浇板, 桥梁全长 6.434m, 全宽 7.0m, 桥梁设计 荷载采用公路二级: (5)桑坪镇西沟口桥,采用1×8m 钢筋混凝土 现浇板,桥梁全长8.08m,全宽3.0m,桥梁设计荷载采用公路二级; (6) 桑坪镇下湾桥, 采用 1×5m 钢筋混凝土现浇板, 桥梁全长 6.175m, 全宽 8.0m, 桥梁设计荷载采用公路二级; (7) 桑坪镇岭根 桥, 采用 1×5m 钢筋混凝土现浇板, 桥梁全长 6.454m, 全宽 8.0m, 桥梁设计荷载采用公路二级; (8) 桑坪镇玉皇岈, 采用 1×20m 预 应力钢筋混凝土空心板,桥梁全长 30.04m,全宽 8.0m,桥梁设计荷 载采用公路二级: (9) 田关镇河上桥,采用 3×16m 预应力混凝土 空心板,桥梁全长 59.08m,全宽 8.5m,桥梁设计荷载采用公路二级:

- (10) 丁河镇东岗桥,采用1×16m 预应力钢筋混凝土空心板,桥梁全长26.04m,全宽8.0m,桥梁设计荷载采用公路二级; (11) 丁河镇凤山桥,采用4×10m 预应力混凝土至心板,桥梁全长50.08m,全宽8.5m,桥梁设计荷载采用公路二级; (12) 丁河镇庄口桥,采用2×13m 预应力混凝土空心板,桥梁全长2平4n,全宽8.5m,桥梁设计荷载采用公路二级; (13) 五里桥镇户河湾桥,采用5×20m 预应力混凝土空心板,桥梁全长117.12m,金宽8.0m,桥梁设计荷载采用公路二级。
 - 2. 下列文件应视为构成合同文件的组成部分:
- (1) 本协议书及各种合同附件(含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料):
 - (2) 中标通知书;
 - (3) 投标函及投标函附录:
 - (4) 项目专用合同条款:
 - (5) 公路工程专用合同条款:
 - (6) 通用合同条款:
 - (7) 技术规范:
 - (8) 图纸:
 - (9) 己标价工程量清单:
- (10) 承包人有关人员、设备投入的承诺及投标文件中的施工组织设计:
 - (11) 其他合同文件。
- 3. 上述文件互相补充和解释,如有不明确或不一致之处,以合同约定次序在先者为准。
- 4. 根据工程量清单所列的预计数量和单价或总额价计算的签约 合同价: 人民币(大写) 壹仟贰佰叁拾捌万柒仟壹佰肆拾贰元捌角柒 分(¥12387142.87)。

- 5. 承包人项目经理: 杜伟刚; 技术负责人: 王伟。
- 6. 工程质量符合合格标准。
- 7. 承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。
- 8. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。本项目付款办法为,合同签计后,根据资金到位情况支付合同总价款的 30%作为预付款,项目完立后支付到合同价的 98%,剩余 2% 在缺陷责任期到期后支付
 - 9. 承包人应按照监理人者 等 重 工期为 120 日历天。
- 10. 本协议书由双方法定代表人或其委托代理人签署与加盖公章,在承包人交纳农民工工资保障金后生效。承包人未能在规定时间内交纳农民工资保障金(或签订补充协议),本合同失效,招标人取消其中标资格,发包人将按排名依次通知第二、三名中标候选人;全部工程完工后经竣工验收合格、缺陷责任期满及保修期终止分别签发缺陷责任终止证书及保修期终止证书后失效。
- 11. 不超过此合同价款的 5%作为质量和工期的奖罚资金。若承包 人没按承诺要求达不到合格及以上质量,且没按合同工期完工的,发 包人有权依此规定扣除此奖罚资金进行处罚。
- 12. 承包人应按合同工期保质保量完成,若因承包人原因致使工期延期,由此给发包人造成的一切损失(如监理费用增加等)均由承包人承担。
- 13. 本项目要求原材料碎石为山石破碎,水泥为 P042. 5 水泥,不 少于 3 仓混凝土强制搅拌站,混凝土摊铺为三辊轴机组和插入式振捣 棒组的排式振捣机。
- 14. 施工单位要文明施工,料场、拌和场、施工现场等施工范围内要按相关要求采取相关措施,全面落实工地扬尘十个100%,避免扬尘,污染环境。特别是料场、拌和站要全部围挡,重型货车及非道路移动机械必须达到国家规定的排放要求,达不到要求的禁止进行工地等。若由此造成的一切法律责任及经济损失均由承包人负责。

15. 承包人不得拖欠农民工工资。否则, 违背国家政策, 拖欠农 民工工资及其引发的纠纷和法律、经济责任概由承包人负责, 发包人 有权从履约保证金、交纳的农民工资保障金和工程结算款中扣取。

16. 本协议书正本二份、副泰立份、含同双方各执正本一份,副 本一份,当正本与副本的物容不一致时,以正本为准。

17. 合同未尽事宜, 减力另行 可补充协议。补充协议是合同的组成部分。

组成部分。	9300002073 H
发包人: 運快县 新疆	承包人: 南醫华嘉路桥工程有限公司
法定代表人: 一天 注	法定代表人: 文 文 2
或	或
其委托代理人:	其委托代理人:
年	2024年 <u>8</u> 月13日
单位地址:	单位地址:河南省南阳市西峡县五里桥镇工
	业大道中段东侧
电 话:	电 话: 13503902657
开户银行:	开户银行: 中国建设银行西峡支行
帐 号:	帐 号: 41050175690800000073

(三) 近年完成的类似项目情况表

项目名称	*************************************
项目所在地	西峡县米坪镇
发包人名称	西峡县交通运输局
发包人地址	西峡县灌河路
发包人电话	张先生0377-69663492
合同价格	5108700.81元
开工日期	2024. 5. 31
交工日期	2024. 7. 31
承担的工作	图纸及工程量清单所有内容
工程质量	合格
项目经理	王伟
项目总工	王义磊
总监理工程师及 电话	张进涛 13703412706
项目描述	本项目为改建工程,全长6.25公里,路面宽6.5米,沥青混凝 土路面。
备注	第二项 共四项

- 注: 1. 每张表格只填写一个项目,并标明序号。
 - 2. 本表后附中标通知书、合同协议书的复印件。
 - 3. 如近年来,投标人法人机构发生合法变更或重组或法人名称变更时,应提供相关部门的合法批件或其他相关证明材料来证明其所附业绩的继承性。

中标通知书

中标通知书(工程类)

致 南阳华岳路桥工程有限公司:

西峡县交通运输局(停用)委托西峡县交投惠民工程管理有限责任公司 对米坪大庄村至军马河鱼库(二期道路改造等项目)(项目编号:E4101005206003540001 标段名称:米坪大庄村至军马河鱼库(二期道路改造等项目))组织招标。通过评标委员会评审,并经招标人确认,贵单位喜获该项目的中标人。

贵单位接到本通知后,尽速与招标人联系、洽谈合同事宜。中标内容如下:

项目名称	米坪大庄村至军马河鱼库 (二期道路改造等项目)
项目编号	E4101005206003540001
建设地点	河南省-南阳市-西峡县
中标价	大写:伍佰壹拾万捌仟柒佰圆捌角壹分 (小写:5108700.81)
项目经理	王伟 豫241202154735
注册编号	
工期	60
质量	合格
其它	

贵单位在收到中标通知书后 **60** 日历天内,与招标人签订合同等相关事宜。

招标人:西峡夏交通

用)

(盖章)

招标代理机构:西峡县交投惠民工程管理有限责任公司。

见证单位:西峡县公共资源交易中心

(盖章)

合同协议书

★正 本

米坪大庄村至军马河鱼库 (二期道路改造等项目) (施工标)

合同协议书

西峡县交通运输局二0二四年五月

合同协议书

西峡县交通运输局(以下简称"装包人")为实施米坪大庄村至军 马河鱼库(二期道路改造等项目),已接受南阳华岳路桥工程有限公 司(以下简称"承包人")对该项、施工额投标。发包人和承包人共 同达成如下协议。

- 1. 米坪大庄村至军马河鱼库(二期道路改造等项目),本项目为 改建工程,全长 6.25 公里,路面宽 6.5 米,沥青混凝土路面。
 - 2. 下列文件应视为构成合同文件的组成部分:
- (1)本协议书及各种合同附件(含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料):
 - (2) 中标通知书:
 - (3) 投标函及投标函附录;
 - (4) 项目专用合同条款:
 - (5) 公路工程专用合同条款:
 - (6) 通用合同条款:
 - (7) 技术规范;
 - (8) 图纸:
 - (9) 已标价工程量清单:
- (10) 承包人有关人员、设备投入的承诺及投标文件中的施工组织设计;
 - (11) 其他合同文件。
- 3. 上述文件互相补充和解释,如有不明确或不一致之处,以合同约定次序在先者为准。

4. 根据工程量清单所列的预计数量和单价或总额价计算的签约 合同价: 人民币(大写)伍佰壹拾万零捌仟柒佰元捌角壹分

(¥5108700.81) 。

- 5. 承包人项目经理: 主焦; 技术负责人, 王义磊。
- 6. 工程质量符合合格标准
- 7. 承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。
- 8. 发包人承诺按合同约定部多种。时间和方式向承包人支付合同价款。本项目付款办法为,合同签订后支付合同总价款的 30%作为预付款,项目完工后支付到合同价的 97%,剩余 3%在缺陷责任期到期后支付。
 - 9. 承包人应按照监理人指示开工,工期为60日历天。
- 10. 本协议书由双方法定代表人或其委托代理人签署与加盖公章,在承包人交纳农民工工资保障金后生效。承包人未能在规定时间内交纳农民工资保障金(或签订补充协议),本合同失效,招标人取消其中标资格,发包人将按排名依次通知第二、三名中标候选人;全部工程完工后经竣工验收合格、缺陷责任期满及保修期终止分别签发缺陷责任终止证书及保修期终止证书后失效。
- 11. 不超过此合同价款的 5%作为质量和工期的奖罚资金。若承包 人没按承诺要求达不到合格及以上质量,且没按合同工期完工的,发 包人有权依此规定扣除此奖罚资金进行处罚。
- 12. 承包人应按合同工期保质保量完成,若因承包人原因致使工期延期,由此给发包人造成的一切损失(如监理费用增加等)均由承包人承担。
- 13. 本项目要求原材料碎石为山石破碎,水泥为 P042. 5 水泥,不 少于 3 仓混凝土强制搅拌站,混凝土摊铺为三辊轴机组和插入式振捣

棒组的排式振捣机。

- 14. 施工单位要文明施工,料场、拌和场、施工现场等施工范围内要按相关要求采取相关措施,全面落实工地扬尘十个100%,避免扬尘,污染环境。特别是科场、拌和站要全部围挡,重型货车及非道路移动机械必须达到国家规定的排放要求以达不到要求的禁止进行工地等。若由此造成的一切法律责任及经济损失均由承包人负责。
- 16. 本协议书正本二份、副本二份,合同双方各执正本一份,副 本一份,当正本与副本的内容不一致时,以正本为准。

法定代表人或	式定代表人 200002013
其委托代理人:	其委托代理人:
年月日	2024年5月28日
单位地址:	单位地址:河南省南阳市西峡县五里桥镇工业大
	道中段东侧
电 话:	电 话: _13503902657
开户银行:	开户银行: 中国建设银行股份有限公司西峡支行
帐 县.	帐 号, 41050175690800000073

(三) 近年完成的类似项目情况表

项目名称	西峡县2024年农村公路桥梁建设项目第二标段(施工标)					
项目所在地	西峡县					
发包人名称	西峡县交通运输局					
发包人地址	西峡县灌河路					
发包人电话	张先生0377-69663492					
合同价格	7489190. 35元					
开工日期	2024. 8. 16					
交工日期	2024. 12. 16					
承担的工作	双龙镇杨河大桥,全长202.16米,桥梁设计荷载采用公路 - II 级标准					
工程质量	合格					
项目经理	李阳					
项目总工	赵洋晨					
总监理工程师及 电话	王恕奎 16637728916					
项目描述	西峡县2024年农村公路桥梁建设项目施工2标由西峡县 Y026线杨河大桥危桥改建工程一座桥梁组成,采用9X20m 预 应力混凝土空心板,桥梁全长202.16m,全宽8.5m,桥梁 设计荷载采用公路二级。					
备注	第三项 共四项					

- 注: 1. 每张表格只填写一个项目, 并标明序号。
 - 2. 本表后附中标通知书、合同协议书的复印件。
 - 3. 如近年来,投标人法人机构发生合法变更或重组或法人名称变更时,应提供相关部门的合法批件或其他相关证明材料来证明其所附业绩的继承性。

中标通知书

中标通知书(工程类)

致 南阳华岳路桥工程有限公司:

西峡县交通运输局委托西峡县交投照民工程管理有限责任公司对西峡县 2024年农村公路桥梁建设项目(项目编号: E4101)05206003617001标段名称:西峡县2024年农村公路桥梁建设。 3-2标段) 组织招标。通过评标委员会评审,并经招标人确认,贵单位喜获该项目的中标人。

贵单位接到本通知后,尽速与招标人联系、治谈合同事宜。中标内容如下:

西峡县2024年农村公路桥梁建设项目
E4101005206003617001
河南省-南阳市-西峡县
大写:柒佰肆拾捌万玖仟壹佰玖拾圆叁角伍分 (小写:7489190.35)
李阳 豫241212293138
120
符合国家、地方相关规范及要求,达到合格及以上标准

贵单位在收到中标通知书后 30 日历天内,与招标人签订合同等相关事

宜。

招标人

(盖章)

招标代理方数:西峡县委设惠民工 程管理有限委任200

(盖章)

见证单位:西峡县公共资源交易中心

(盖章)

2024年08月13日

合同协议书

★正 本

西峡县 2024 年农村公路桥梁建设项目



合同协议书

西峡县交通运输局二0二四年八月

合同协议书

西峡县交通运输局(以下简称"紫包人")为实施西峡县 2024 年农村公路桥梁建设项目施工之标,已接受南阳华岳路桥工程有限公司(以下简称"承包人")对该项目工的投标。发包人和承包人共同达成如下协议。

- 1. 西峡县 2024 年农村公路桥梁建设项目施工 2 标由西峡县 Y026 线杨河大桥危桥改建工程一座桥梁组成,采用 9×20m 预应力混凝土空心板,桥梁全长 202. 16m,全宽 8.5m,桥梁设计荷载采用公路二级。
 - 2. 下列文件应视为构成合同文件的组成部分:
- (1) 本协议书及各种合同附件(含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料):
 - (2) 中标通知书:
 - (3) 投标函及投标函附录;
 - (4) 项目专用合同条款:
 - (5) 公路工程专用合同条款;
 - (6) 通用合同条款;
 - (7) 技术规范;
 - (8) 图纸;
 - (9) 已标价工程量清单:
- (10) 承包人有关人员、设备投入的承诺及投标文件中的施工组织设计:
 - (11) 其他合同文件。
- 3. 上述文件互相补充和解释,如有不明确或不一致之处,以合同约定次序在先者为准。
- 4. 根据工程量清单所列的预计数量和单价或总额价计算的签约 合同价: 人民币(大写) 柒佰肆拾捌万玖仟壹佰玖拾元叁角伍分

(Y7489190.35) a

- 5. 承包人项目经理: 李阳: 技术负责人: 赵洋晨。
- 6. 工程质量符合合格标准 数 添
- 7. 承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。
- 8. 发包人承诺按合同约定的采生,时间和方式向承包人支付合同价款。本项目付款办法为,参同签订后,根据资金到位情况支付合同总价款的 30%作为预付款,项目完工后支付到合同价的 98%,剩余 2% 在缺陷责任期到期后支付。
 - 9. 承包人应按照监理人指示开工,工期为120日历天。
- 10. 本协议书由双方法定代表人或其委托代理人签署与加盖公章,在承包人交纳农民工工资保障金后生效。承包人未能在规定时间内交纳农民工资保障金(或签订补充协议),本合同失效,招标人取消其中标资格,发包人将按排名依次通知第二、三名中标候选人;全部工程完工后经竣工验收合格、缺陷责任期满及保修期终止分别签发缺陷责任终止证书及保修期终止证书后失效。
- 11. 不超过此合同价款的 5%作为质量和工期的奖罚资金。若承包 人没按承诺要求达不到合格及以上质量,且没按合同工期完工的,发 包人有权依此规定扣除此奖罚资金进行处罚。
- 12. 承包人应按合同工期保质保量完成,若因承包人原因致使工期延期,由此给发包人造成的一切损失(如监理费用增加等)均由承包人承担。
- 13. 本项目要求原材料碎石为山石破碎,水泥为 P042. 5 水泥,不少于 3 仓混凝土强制搅拌站,混凝土摊铺为三辊轴机组和插入式振捣棒组的排式振捣机。
- 14. 施工单位要文明施工,料场、拌和场、施工现场等施工范围 内要按相关要求采取相关措施,全面落实工地扬尘十个100%,避免 扬尘,污染环境。特别是料场、拌和站要全部围挡,重型货车及非道 路移动机械必须达到国家规定的排放要求,达不到要求的禁止进行工

地等。若由此造成的一切法律责任及经济损失均由承包人负责。

15. 承包人不得拖欠农民工工资。否则, 违背国家政策, 拖欠农 民工工资及其引发的纠纷和法律、经济责任概由承包人负责,发包人 有权从履约保证金、交纳的农民工资保障金和工程结算款中扣取。

16. 本协议书正本二份、副本二份、会同双方各执正本一份、副 本一份, 当正本与副本的内容不一、时, 对于本为准。

17. 合同未尽事宜,双方另行签订补充协议。补充协议是合同的

组成部分。	9300002073
发包人: 基 县 交 运输局	承包人:南阳华盖路桥工程有限公司
法定代表人: 147 7	法定代表人:
或	或
其委托代理人:	其委托代理人:
年年月13日	2024年8月13日
单位地址:	单位地址: 河南省南阳市西峡县五里桥镇工
	业大道中段东侧
电 话:	电 话: 13503902657
开户银行:	开户银行: <u>中国建设银行西峡支行</u>
帐 号:	帐 号: 41050175690800000073_

(三) 近年完成的类似项目情况表

项目名称	Y005线两河口至大庙道路改建工程				
项目所在地	西峡县境内				
发包人名称	西峡县交通运输局				
发包人地址	西峡县灌河路				
发包人电话	张先生0377-69663492				
合同价格	4030964. 29元				
开工日期	2024. 5. 30				
交工日期	2024. 7. 30				
承担的工作	图纸及工程量清单所有内容				
工程质量	合格				
项目经理	杜伟刚				
项目总工	王伟				
总监理工程师及 电话	刘佩洋 13803870810				
项目描述	本项目为改建工程,路基宽7.5米,四级公路,沥青混凝土路 面。				
备注	第四项 共四项				

- 注: 1. 每张表格只填写一个项目,并标明序号。
 - 2. 本表后附中标通知书、合同协议书的复印件。
 - 3. 如近年来,投标人法人机构发生合法变更或重组或法人名称变更时,应提供相关部门的合法批件或其他相关证明材料来证明其所附业绩的继承性。

中标通知书

中标通知书(工程类)

致 南阳华岳路桥工程有限公司:

西峡县交通运输局(停用)委托西峡县交投惠民工程管理有限责任公司 对Y005线两河口至大庙道路改建工程(项目编号: 54101005206003539001 标段名称: Y005线两河口至大庙道路(次十工程)组只招标。通过评标委员会评审,并经招标人确认,贵单位喜获该项目的中标人。

贵单位接到本通知后,尽速与招标人联系、治谈合同事宜。中标内容如下:

项目名称	Y005线两河口至大庙道路改建工程
项目编号	E4101005206003539001
建设地点	河南省-南阳市-西峡县
中标价	大写:肆佰零叁万零玖佰陆拾肆圆贰角玖分 (小写:4030964.29)
项目经理	杜伟刚 豫241181942400
注册编号	
工期	60
质量	合格
其它	
	The state of the s

贵单位在收到中标通知书后 30 日历天内,与招标人签订合同等相关事

宜。

招标人:西峡县

用)

(盖章)

招标代理机构:西峡道交投惠民工程管理有遗责(人)司

(盖章

见证单位:西峡县公共资源交易中心

(盖章)

2024年05月27日

★正 本

Y005 线两河口至大庙道路改建工程项目

(施工标)

合同协议书

西峡县交通运输局二0二四年五月

合同协议书

西峡县交通运输局(以下简称"及包人")为实施 Y005 线两河口至大庙道路改建工程项目,已接受南阳华岳路桥工程有限公司 (以下简称"承包人")对该项目。工的投标 发包人和承包人共同 达成如下协议。

- 1. Y005 线两河口至大<u>南</u>道路改建工程项目,全长 5 公里,路基 宽 7.5 米,四级公路,沥青混凝土路面。
 - 2. 下列文件应视为构成合同文件的组成部分:
- (1) 本协议书及各种合同附件(含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料):
 - (2) 中标通知书:
 - (3) 投标函及投标函附录:
 - (4) 项目专用合同条款:
 - (5) 公路工程专用合同条款:
 - (6) 通用合同条款;
 - (7) 技术规范;
 - (8) 图纸:
 - (9) 已标价工程量清单;
- (10) 承包人有关人员、设备投入的承诺及投标文件中的施工组织设计;
 - (11) 其他合同文件。
- 3. 上述文件互相补充和解释,如有不明确或不一致之处,以合同约定次序在先者为准。

4. 根据工程量清单所列的预计数量和单价或总额价计算的签约 合同价: 人民币(大写)肆佰零叁万零玖佰陆拾肆元贰角玖分

(¥4030964.29) 。

- 5. 承包人项目经理《程序》, 技术负责人: 王伟。
- 6. 工程质量符合合格标准。
- 7. 承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。
- 8. 发包人承诺按合同约定数条件 的间和方式向承包人支付合同价款。本项目付款办法为,合同签订后支付合同总价款的 30%作为预付款,项目完工后支付到合同价的 97%,剩余 3%在缺陷责任期到期后支付。
 - 9. 承包人应按照监理人指示开工,工期为60日历天。
- 10. 本协议书由双方法定代表人或其委托代理人签署与加盖公章,在承包人交纳农民工工资保障金后生效。承包人未能在规定时间内交纳农民工资保障金(或签订补充协议),本合同失效,招标人取消其中标资格,发包人将按排名依次通知第二、三名中标候选人;全部工程完工后经竣工验收合格、缺陷责任期满及保修期终止分别签发缺陷责任终止证书及保修期终止证书后失效。
- 11. 不超过此合同价款的 5%作为质量和工期的奖罚资金。若承包 人没按承诺要求达不到合格及以上质量,且没按合同工期完工的,发 包人有权依此规定扣除此奖罚资金进行处罚。
- 12. 承包人应按合同工期保质保量完成,若因承包人原因致使工期延期,由此给发包人造成的一切损失(如监理费用增加等)均由承包人承担。
- 13. 本项目要求原材料碎石为山石破碎,水泥为 P042. 5 水泥,不 少于 3 仓混凝土强制搅拌站,混凝土摊铺为三辊轴机组和插入式振捣

棒组的排式振捣机。

14. 施工单位要文明施工,料场、拌和场、施工现场等施工范围内要按相关要求采取相关措施,全面落实工地扬尘十个100%,避免扬尘,污染环境。特别是科场、拌和站要全部围挡,重型货车及非道路移动机械必须达到国家规定的排放要求,还不到要求的禁止进行工地等。若由此造成的一切法律责任及经济损失均由承包人负责。

16. 本协议书正本二份、副本二份,合同双方各执正本一份,副本一份,当正本与副本的内容不一致时,以正本为准。

17. 合同未尽事宜,双方另行签订补充协议。补充协议是合同的 组成部分。 承包人:南阳华岳路林工程李枫公司 发包人: 西崃县 法定代表人: 或 或 其委托代理人: 其委托代理人: _____ _____年____月___日 2024年5月27日 单位地址: 单位地址:河南省南阳市西峡县五里桥镇工业 大道中段东侧 话: _____ 电 话: _13503902657 电 开户银行: 开户银行: 中国建设银行股份有限公司西峡支行 号: 帐 号: 41050175690800000073

(四)投标人的信誉情况表

项 目	投标人情况说明
"投标人须知"附录 4 资格审查条件(项目经理和项目总工最低要求)	1.1 项目经理及项目总工程师符合资格审查条件 1.2 项目经理无在建承诺书
"投标人须知"正文1.4.4投标人(包括联合体各成员)不得存在的不良状况或不良信用记录	2 我单位不存在1.4.4 情形的承诺书
"投标人须知"1.4.3 投标人不得存在下列情形	3 我单位不存在1.4.3 情形的承诺书
资格审查资料:应按照投标人须知前附表1.4.1要求对投标企业资质条件、财务要求、信誉要求、项目经理资格及其他要求提供相关证明材料。	4 我单位符合资格审查资料要求承诺书
按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库〔2016〕125 号)的要求,对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人,拒绝参与本项目招标。投标人需提供规范的信用报告和《无行贿犯罪记录承诺函》,信用报告应通过"信用中国"网站(www.creditchina.gov.cn)下载。在河南省注册的市场主体仅需提供规范的《无违法违规记录证明版专项信用报告》,无需提供《无行贿犯罪记录承诺函》,专项信用报告》,无需提供《无行贿犯罪记录承诺函》,专项信用报告》,无需提供《无行贿犯罪记录承诺函》,专项信用报告》,无需提供《无行贿犯罪记录承诺函》,专项信用报告的值,近"信用河南"网站(https://credit.henan.gov.cn)下载。上述信用报告的生成日期为本项目递交投标文件截止时间前10日内。	5.1 我公司未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单相关截图 5.2 信用报告 5.3 无违法违规记录证明版专项信用报告 5.4 无行贿犯罪记录承诺函
本项目不接受联合体投标,不得分包转包。	6 本次招标不是联合体投 标承诺
投标人所有资料无虚假、无隐瞒	7 投标人所有资料无虚假、 无隐瞒承诺书

抄	设标人应有具备履行合同所必须的设备和专业能力	8 具备履行合同所必须的设备和专业能力的声明

注:

- 1. 投标人应按照招标文件第二章"投标人须知"前附表附录 4 和"投标人须知"正文第 1. 4. 4 项规定,逐条说明其信誉情况。
- 2. 投标人应根据招标文件第二章"投标人须知"第 3.5.4 项的要求在本表后附相关证明 材料。

1.1项目经理及项目总工程师符合资格审查条件 项目经理建造师及安全证



公路水运工程施工企业主要负责人和安全生产 管理人员安全生产考核合格证书



姓名: 张职杨

性别: 男

出生年月: 1990-02-26 身份证号: 411330199002264513

经公路水运工程施工企业主要负责人和安全生产管理人员安全生产考核 合格,特发此证。

企业名称: 南阳华岳路桥工程有限公司

证书编号: 豫交安B22G00134


有效期: 2022-02-24

2028-02-24

考核部门: 河南省交通运输厅

中华人民共和国交通运输部监制

项目总工程师中级及以上职称

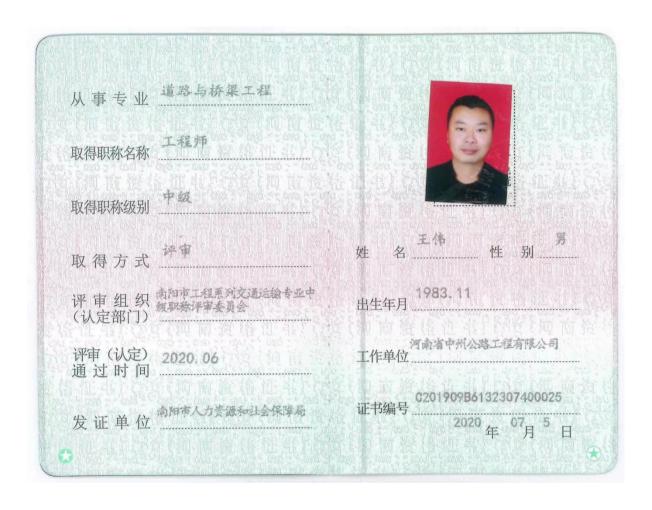

1.2 项目经理无在建承诺书

西峡县交通运输局	(招标人名称)	

我方在此承诺,我方拟派往<u>西峡县交通运输局2025年农村公路桥梁改建(造)项目</u>(项目名称)<u>E4113231323000094</u>(项目编号)的项目经理<u>张职杨</u>(项目经理姓名)现阶段没有担任任何在建建设工程项目的项目经理,一旦查出自愿放弃中标资格。

我方保证上述信息的真实和准确,并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。 特此承诺

投标人(电子	签章	章):	南	阳华岳路桥工程有限公司
法定代表	長人(电寸	子签名	四):	
2025	年	9	月	10	

2、我单位不存在1.4.4 情形的承诺书

我公司承诺,参与本次投标,我公司不存在下列情形中的任何一种,若有不属实,我公司愿意被取消投标资格,并承担一切后果。

- 1.4.4投标人(包括联合体各成员)不得存在下列不良状况或不良信用记录:
 - (2)被省级及以上交通运输主管部门取消招标项目所在地的投标资格且处于有效期内;
 - (3)被责令停业,暂扣或吊销执照,或吊销资质证书;
 - (4)进入清算程序,或被宣告破产,或其他丧失履约能力的情形;
- (5)在国家企业信用信息公示系统(http://www.gsxt.gov.cn/)中被列入严重违法失信企业名单;
 - (6)在"信用中国"网站(http://www.creditchina.gov.cn/)中被列入失信被执行人名单:
 - (7) 法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

投标人(电子	签章	Ē):	南	阳华岳路桥工程有限公司
法定代表	き人(电子	公签名	四):	
2025	年	9	月	10	В

3、我单位不存在1.4.3 情形的承诺书

我公司承诺,参与本次投标,我公司不存在下列情形中的任何一种,若有不属实,我公司愿意被取消投标资格,并承担一切后果。

- 1.4.3 投标人不得存在下列情形之一:
- (1) 为招标人不具有独立法人资格的附属机构(单位);
- (2) 为本标段前期准备提供设计或咨询服务的,但设计施工总承包的除外;
- (3) 为本标段的监理人:
- (4) 为本标段的代建人;
- (5) 为本标段提供招标代理服务的;
- (6) 与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的;
- (7) 与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的;
- (8) 与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的;
- (9) 被责令停业的:
- (10)被暂停或取消投标资格的;
- (11) 财产被接管或冻结的;
- (12) 在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。

投标人(电子签章): 南阳华岳路桥工程有限公司
法定代表人(电子签名):
2025 年 9 月 10 日

4、我单位符合资格审查资料要求承诺书


我公司承诺,参与本次投标,按照投标人须知前附表1.4.1要求对投标企业资质条件、财务要求、信誉要求、项目经理资格及其他要求提供相关证明材料。若有不属实,我公司愿意被取消投标资格,并承担一切后果。

- 3.5.1 "投标人基本情况表"应附企业法人营业执照副本、施工资质证书副本、安全生产许可证副本、基本账户开户许可证的复印件。
- 3.5.2 "财务状况表"应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表,具体年份要求见投标人须知前附表。投标人的成立时间少于投标人须知前附表规定年份的,应提供成立以来的财务状况表。
 - 3.5.3 "投标人的信誉情况表"应附投标人在"信用中国"网站下载的信用报告;
- 3.5.4 "拟委任的项目经理表"应附项目经理的身份证、建造师注册证书、安全生产考核合格证书等复印件;
- 3.5.5 招标人有权核查投标人在资格预审申请文件和投标文件中提供的资料,若在评标期间发现投标人提供了虚假资料,其投标将被否决;若在签订合同前发现作为中标候选人的投标人提供了虚假资料,招标人有权取消其中标资格;若在合同实施期间发现投标人提供了虚假资料,招标人有权从工程支付款或履约保证金中扣除不超过10%签约合同价的金额作为违约金。同时招标人将投标人上述弄虚作假行为上报省级交通运输主管部门,作为不良记录纳入公路建设市场信用信息管理系统。

投标人(电子签章): 南阳华岳路桥工程有限公司
法定代表人(电子签名):
2025 年 9 月 10 日

5.1 我公司未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单相关截图



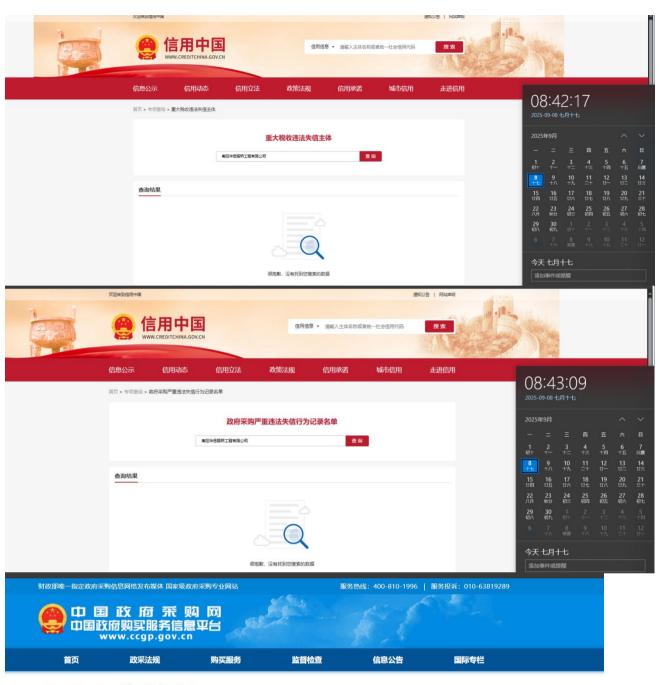

当前位置: 首页 » 政府采购严重违法失信行为记录名单 »



版权所有 © 2025 中华人民共和国财政部

5.2 信用报告





法人和非法人组织 公共信用信息报告

版本号V2.0

机构名称: 南阳华岳路桥工程有限公司

统一社会信用代码: 91411323MA3XARWX4L

报告编号: 202509080807408782S489

报告生成日期	2025年09月08日	
报告出具单位	国家公共信用和地理空间信息中心	



公共信用信息概览



南阳华岳路桥工程有限公司

存续

守信激励对象

登记注册基本信息

基础信息

统一社会信用代码	91411323MA3XARWX4L	法定代表人/负责 人/执行事务合伙 人	刘溪洋	
企业类型	其他有限责任公司	成立日期	2016-06-14	
住所	西峡县五里桥镇工业大道中段东侧			

信用信息概要

行政管理	4条	诚实守信	5条
严重失信	0条	经营异常	0条
信用承诺	110条	信用评价	0条
司法判决	0条	其他	0条
报告生成日期	2025年09月08日	报告出具单位	国家公共信用和地理空间信息中心

第1页 共49页



报告说明



1.本报告所展示的数据和资料为公共信用信息,"信用中国"网站承诺在数据汇总、加工、整合的过程中保持客观中立,不主动编辑或修改信息的内容。

2.受限于现有技术水平等原因,对此报告信息的展示,并不视为"信用中国"对其内容的真实性、准确性、完整性、时效性作出任何形式的确认或担保。请在依据本报告信息作出判断或决策前,自行进一步核实此类信息的完整或准确性,并自行承担使用后果。

3.如认为本报告所展示信息存在错误、遗漏、重复公示、不应公示、超期公示或与认定机关信息不一致等情况,请以数据源单位的信息为准,并可按照网站"信用信息异议申诉指南"提出异议申诉;如需对相关行政处罚信息进行信用修复,可按照网站"行政处罚信息信用修复流程指引"提出信用修复申请;如需对相关严重失信主体名单进行信用修复,请咨询名单认定单位。

4.本报告已添加"信用中国"水印、生成唯一的报告编号和报告核验码。如需对内容的真实性进行核验,可通过扫一扫报告首页"核验码",查看本报告生成时的内容与纸质版报告内容是否一致。

5.本报告展示行政管理、诚实守信、严重失信、经营异常、信用承诺、信用评价、司法判决以及其他 类等信息,因篇幅有限,单类信息仅按更新程度展示最近日期的100条。如有特殊需求,请与我们联系。

第2页 共49页



正文



存结

守信激励对象

第1条

南阳华岳路桥工程有限公司

一、登记注册基础信息

基础信息

企业名称: 南阳华岳路桥工程有限公司

统一社会信用代码: 91411323MA3XARWX4L

法定代表人/负责人/执行事务 刘溪洋

合伙人:

企业类型: 其他有限责任公司

成立日期: 2016-06-14

住所: 西峡县五里桥镇工业大道中段东侧

二、行政管理信息 (共4条)

| 行政处罚

行政处罚决定书文号: 西水罚决字(2022)第14号

处罚类别: 罚款

处罚决定日期: 2022-12-28

处罚内容: 罚款10000元整

罚款金额 (万元): 1.0

没收违法所得、没收非法财物

的金额(万元):

暂扣或吊销证照名称及编号: 无

违法行为类型: 当事人违犯了《河南省河道采砂管理办法》第十二条

违法事实: 2022年57月27日南阳华岳路桥工程有限公司未经水行政主管部门批准,擅自在太平镇

细辛河河道采砂

处罚依据: 依据《河南省河道采砂管理办法》第二十七条进行处罚

第3页 共49页



处罚机关: 西峡县水利局

处罚机关统一社会信用代码: 11411323006052194N

数据来源: 西峡县水利局

数据来源单位统一社会信用代

以)点不*||*| 宋二 [

11411323006052194N

| 行政许可

行政许可决定文书名称: 西峡县水利局关于南阳华岳路桥工程有限公司取水许可延续的批复

许可证书名称: 取水许可证

许可类别: 普通

许可编号: D411323G2021-0101

许可决定日期: 2024-04-16

有效期自: 2024-04-16

有效期至: 2029-04-15

许可内容: 年取地下水0.6万立方米

许可机关: 西峡县水利局

许可机关统一社会信用代码: 11411323006052194N

数据来源单位: 西峡县水利局

数据来源单位统一社会信用代 11411323006052194N

码:

| 行政许可

行政许可决定文书号: 西水许准 (2024) 29号 第 3 条

行政许可决定文书名称: 西峡县水利局关于南阳华岳路桥工程有限公司取水许可变更的批复

许可证书名称: 取水许可证

许可类别: 普通

许可编号: D411323G2021-0101

第4页 共49页



许可决定日期: 2024-04-16

有效期自: 2024-04-16

2029-04-15 有效期至:

许可内容: 年取地下水0.6万立方米

许可机关: 西峡县水利局

许可机关统一社会信用代码: 11411323006052194N

数据来源单位: 西峡县水利局

数据来源单位统一社会信用代 11411323006052194N

| 行政许可

行政许可决定书文号:

许可有效期:

许可决定日期: 2016-06-14 许可截止日期: 2016-06-14

承担公路工程施工、公路养护工程施工、市政公用工程施工、桥梁、涵洞及隧道工程施工、绿化工程施工、水泥制品、机械设备租赁 许可内容:

南阳市西峡县工商行政管理局 许可机关:

审核类型: 登记

三、诚实守信相关荣誉信息 (共5条)

| 纳税信用A级纳税人

南阳华岳路桥工程有限公司 第1条 纳税人名称:

纳税人识别号: 91411323MA3XARWX4L

2024 评价年度:

数据来源: 国家税务总局

第5页 共49页



第2条

| 纳税信用A级纳税人

纳税人名称: 南阳华岳路桥工程有限公司

纳税人识别号: 91411323MA3XARWX4L

评价年度: 2021

数据来源: 国家税务总局

| 纳税信用A级纳税人

纳税人名称: 南阳华岳路桥工程有限公司 第3条

纳税人识别号: 91411323MA3XARWX4L

评价年度: 2020

数据来源: 国家税务总局

| 纳税信用A级纳税人

纳税人名称: 南阳华岳路桥工程有限公司 第4条

纳税人识别号: 91411323MA3XARWX4L

评价年度: 2023

数据来源: 国家税务总局

| 纳税信用A级纳税人

纳税人名称: 南阳华岳路桥工程有限公司 第5条

纳税人识别号: 91411323MA3XARWX4L

评价年度: 2022

数据来源: 国家税务总局

四、严重失信信息 (共 0 条)

第6页 共49页



查询期内无相关记录

五、经营(活动)异常名录(状态)信息(共0条)

查询期内无相关记录

六、信用承诺信息 (共 100 条)

| 企业信用承诺信息

承诺编码: 41132320230412001676

001676 第1条

承诺类型: 主动型

承诺事由: 主动作出承诺

承诺内容: 承诺依法按照规定的期限申报办理税务登记、变更或者注销登记。

承诺作出日期: 2023-04-12

承诺履行状态: 全部履行

承诺受理单位: 国家税务总局西峡县税务局

承诺受理单位统一社会信用代 11411323MB19515617

码:

| 企业信用承诺信息

承诺编码: 41132320230413001162 第2条

承诺类型: 主动型

承诺事由: 遵守劳动法

承诺内容: 承诺遵守用工制度,及时全量支付农民工工资

承诺作出日期:2023-04-13承诺履行状态:全部履行

承诺受理单位: 西峡县人力资源和社会保障局

承诺受理单位统一社会信用代 11411323006052899X

码:

第7页 共49页



| 企业信用承诺信息

承诺编码: 41132320230111001149 第3条

承诺类型: 主动型

承诺事由: 主动承诺

承诺内容: 自愿遵守环保法律法规

承诺作出日期: 2023-01-11

承诺履行状态: 全部履行

承诺受理单位: 南阳市生态环境局西峡分局

承诺受理单位统一社会信用代 114113230060528801

码

| 企业信用承诺信息

承诺编码: 41132320230406000912 第4条

承诺类型: 主动型

承诺事由: 主动型,自愿作出承诺

承诺内容: 严格依法开展生产经营活动,建立健全并严格落实安全生产责任制度,确保职工生命健

康安全。

承诺作出日期: 2023-04-06

承诺履行状态: 全部履行

承诺受理单位: 西峡县市场监督管理局

承诺受理单位统一社会信用代 11411323006052792J

码:

| 企业信用承诺信息

承诺编码: 41132320230410001300 第5条

承诺类型: 主动型

承诺事由: 主动型,自愿作出承诺

第8页 共49页



承诺内容: 节约用水, 杜绝浪费

承诺作出日期: 2023-04-10

承诺履行状态: 全部履行

承诺受理单位: 西峡县水利局

承诺受理单位统一社会信用代 11411323006052194N

码:

| 企业信用承诺信息

承诺编码: 41132320230625003991 第6条

承诺类型: 主动型

承诺事由: "围绕联合奖惩构建网络诚信"诚信经营承诺书

承诺内容: 同意将信用承诺纳入信用中国各级网站并上网公示,接受社会监督。

承诺作出日期: 2023-06-25

承诺履行状态: 全部履行

承诺受理单位: 西峡县发展和改革委员会

承诺受理单位统一社会信用代 11411323737439886W

码:

| 企业信用承诺信息

承诺编码: 41132320230110001162 第7条

承诺类型: 主动型

承诺事由: 主动型, 自愿作出承诺

承诺内容: 遵守法律法规,诚信经营,确保产品质量

承诺作出日期: 2023-01-10

承诺履行状态: 全部履行

承诺受理单位: 西峡县市场监督管理局

第9页 共49页



承诺受理单位统一社会信用代 11411323006052792J

| 企业信用承诺信息

承诺编码:

41132320220704534670

第8条

承诺类型:

主动型

承诺事由:

主动型,自愿作出承诺

承诺内容:

1.严格遵守法律、法规和规章,积极落实企业安全生产主体责任,扎实有效地开展安全生产工作,不断提升企业安全生产本质水平,努力塑造企业诚实守信的良好形象,促进企业健康有序发展。2.提供给应急管理部门的所有资料均合法、真实、有效,无伪造、

承诺作出日期:

2022-07-04

承诺履行状态:

全部履行

承诺受理单位:

西峡县应急管理局

承诺受理单位统一社会信用代

11411323MB15367040

| 企业信用承诺信息

承诺编码:

41132320230110007438

第9条

承诺类型:

主动型

承诺事由:

主动型,自愿作出承诺

承诺内容:

依法缴纳职工医保费用

承诺作出日期:

2023-01-10

承诺履行状态:

全部履行

承诺受理单位:

西峡县人力资源和社会保障局

承诺受理单位统一社会信用代

11411323006052899X

码:

| 企业信用承诺信息

第10页 共49页



承诺编码: 41132320230512004183 第10条

承诺类型: 主动型

承诺事由: 主动型,自愿作出承诺

承诺内容: 关于依法履行纳税义务的承诺

承诺作出日期: 2023-05-12

承诺履行状态: 全部履行

承诺受理单位: 国家税务总局西峡县税务局

承诺受理单位统一社会信用代 11411323MB19515617

码:

企业信用承诺信息

承诺编码: 41132320230510030944 第11条

承诺类型: 主动型

承诺事由: 主动型, 自愿作出承诺

承诺内容: 遵守法律法规,诚信经营,确保产品质量

承诺作出日期: 2023-05-10

承诺履行状态: 全部履行

承诺受理单位: 西峡县市场监督管理局

承诺受理单位统一社会信用代 11411323006052792J

码:

| 企业信用承诺信息

承诺编码: 41132320230325001257 第12条

承诺类型: 主动型

承诺事由: 主动型,自愿作出承诺

第11页 共49页



承诺内容:

1.传承传统美德。自觉传承爱物知恩、尊重劳动、勤俭节约、珍惜幸福的传统美德,踊跃参与"光盘行动",努力打造温馨和谐的就餐环境,享受"文明用餐、节俭惜福"的快乐。2.引导理性消费。主动引导接待对象节约用餐,合理设计菜单,调整菜品分量,提供小份菜,半份菜,餐后主动帮助打包,避免餐桌上的浪费。914.营造良好氛围。在醒目位置张贴"浪费可耻、节约光荣"、"光盘行动"宣传标语、海报,营造节约用

餐的良好氛围。

承诺作出日期: 2023-03-25

全部履行 承诺履行状态:

承诺受理单位: 西峡县发展和改革委员会

承诺受理单位统一社会信用代 11411323737439886W

| 企业信用承诺信息

承诺编码: 41132320220718581365 第13条

承诺类型: 主动型

承诺事由: 主动型,自愿作出承诺

承诺内容:

1.严格遵守法律、法规和规章,积极落实企业安全生产主体责任,扎实有效地开展安全生产工作,不断提升企业安全生产本质水平,努力塑造企业城实守信的良好形象,促进企业健康有序发展。2.提供给应急管理部门的所有资料均合法、真实、有效,无伪造、修改、虚假成份,并对所提供资料的真实性负责。3.严格依法开展生产经营活动,建立健全并严格落实安全生产责任制度,确保职工生命健康安全。4.主动接受应急管理部门

的监管,自愿接受依法开展的日常检查并严格执行执法指令。

2022-07-18 承诺作出日期:

承诺履行状态: 全部履行

承诺受理单位: 西峡县应急管理局

承诺受理单位统一社会信用代 11411323MB15367040

码:

| 企业信用承诺信息

41132320230105014559 第14条 承诺编码:

承诺类型: 主动型

承诺事由: 主动型,自愿作出承诺

承诺内容: 依法保护区域内环境卫生

第12页 共49页



承诺作出日期: 2023-01-05

承诺履行状态: 全部履行

承诺受理单位: 南阳市生态环境局西峡分局

承诺受理单位统一社会信用代 114113230060528801

码:

| 企业信用承诺信息

承诺编码: 41132320230110040829 第15条

承诺类型: 主动型

承诺事由: 主动型, 自愿作出承诺

承诺内容: 主动接受应急管理部门的监管,自愿接受依法开展的日常检查并严格执行执法指令。

承诺作出日期: 2023-01-10

承诺履行状态: 全部履行

承诺受理单位: 西峡县应急管理局

承诺受理单位统一社会信用代 11411323MB15367040

码:

企业信用承诺信息

承诺编码: 41132320230510037378 第16条

承诺类型: 主动型

承诺事由: 主动型,自愿作出承诺

承诺内容: 对所提供的项目备案资料合法性、真实性、准确性、完整性和有效性负责

承诺作出日期: 2023-05-10

承诺履行状态: 全部履行

承诺受理单位: 西峡县发展和改革委员会

承诺受理单位统一社会信用代 11411323737439886W

码:

第13页 共49页



| 企业信用承诺信息

承诺编码: 41132320230612000953 第17条

承诺类型: 主动型

承诺事由: 主动作出承诺

承诺内容: 网络文明

承诺作出日期: 2023-06-12

承诺履行状态: 全部履行

承诺受理单位: 西峡县公安局

承诺受理单位统一社会信用代 11411323006051941E

码:

| 企业信用承诺信息

承诺编码: 41132320230516018074 第18条

承诺类型: 主动型

承诺事由: 自愿作出承诺

承诺内容: 切实保证产品质量,维护消费者的合法权益

承诺作出日期: 2023-05-16

承诺履行状态: 全部履行

承诺受理单位: 西峡县市场监督管理局

承诺受理单位统一社会信用代 11411323006052792J

码:

| 企业信用承诺信息

承诺编码: 41132320230516017859 第19条

承诺类型: 审批替代型

承诺事由: 自愿作出承诺

承诺内容: 本单位(人)已认真学习了相关法律法规规章和规范性文件,了解了该项行政许可的有要

第14页 共49页



求,对有关规定的内容已经知晓和全面理解,承诺自身能够满足办理该事项的条件、标

准技术要求。

承诺作出日期: 2023-05-16

承诺履行状态: 全部履行

承诺受理单位: 西峡县市场监督管理局

承诺受理单位统一社会信用代 11411323006052792J

码:

| 企业信用承诺信息

承诺编码: 41132320230510044661 第 20 条

承诺类型: 主动型

承诺事由: 主动型, 自愿作出承诺

承诺内容: 严格依法开展生产经营活动,建立健全并严格落实安全生产责任制度,确保职工生命健

康安全。

承诺作出日期: 2023-05-10

承诺履行状态: 全部履行

承诺受理单位: 西峡县应急管理局

承诺受理单位统一社会信用代 11411323MB15367040

码:

| 企业信用承诺信息

承诺编码: 41132320230312001574 第 21条

承诺类型: 主动型

承诺事由: 主动型, 自愿作出承诺

承诺内容: 严格依法开展生产经营活动,建立健全并严格落实安全生产责任制度,确保职工生命健

康安全。

承诺作出日期: 2023-03-12

承诺履行状态: 全部履行

第15页 共49页



承诺受理单位: 西峡县市场监督管理局

承诺受理单位统一社会信用代 11411323006052792J

码:

| 企业信用承诺信息

承诺编码: 41132320230320001120 第 22 条

承诺类型: 主动型

承诺事由: 主动型, 自愿作出承诺

承诺内容: 诚信参与政府采购

承诺作出日期: 2023-03-20

承诺履行状态: 全部履行

承诺受理单位: 西峡县财政局

承诺受理单位统一社会信用代 11411323006052004P

码:

| 企业信用承诺信息

承诺编码: 41132320230109001154 第23条

承诺类型: 主动型

承诺事由: 主动型,自愿作出承诺

承诺内容: 严格依法开展生产经营活动,建立健全并严格落实安全生产责任制度,确保职工生命健

康安全。

承诺作出日期: 2023-01-09

承诺履行状态: 全部履行

承诺受理单位: 西峡县应急管理局

承诺受理单位统一社会信用代 11411323MB15367040

码:

企业信用承诺信息

第16页 共49页



承诺编码: 41132320230309212252 第 24条

承诺类型: 主动型

承诺事由: 主动型, 自愿作出承诺

承诺内容: 按照环境保护法要求,在生产经营中达标排放

承诺作出日期: 2023-03-09

承诺履行状态: 全部履行

承诺受理单位: 南阳市生态环境局西峡分局

承诺受理单位统一社会信用代 114113230060528801

码:

| 企业信用承诺信息

承诺编码: 41132320220315M00912 第25条

承诺类型: 主动型

承诺事由: 主动承诺

承诺内容: 依法履行纳税义务

承诺作出日期: 2022-03-15

承诺履行状态: 全部履行

承诺受理单位: 国家税务总局西峡县税务局

承诺受理单位统一社会信用代 11411323MB19515617

码:

| 企业信用承诺信息

承诺编码: 41132320230412029190 第 26 条

承诺类型: 主动型

承诺事由: 主动作出承诺

承诺内容: 承诺节约用水,节约社会资源。

第17页 共49页



承诺作出日期: 2023-04-12

承诺履行状态: 全部履行

承诺受理单位: 西峡县住房和城乡建设局

承诺受理单位统一社会信用代

3:

11411323006052864B

| 企业信用承诺信息

承诺编码: 41132320230110022262 第 27 条

承诺类型: 主动型

承诺事由: 主动型,自愿作出承诺

承诺内容: 遵守商业道德,承担社会责任

承诺作出日期:2023-01-10承诺履行状态:全部履行

承诺受理单位: 西峡县市场监督管理局

承诺受理单位统一社会信用代 11411323006052792J

码:

| 企业信用承诺信息

承诺编码: 41132320230420000912 第 28 条

承诺类型: 主动型

承诺事由: 主动型,自愿作出承诺

承诺内容: 严格依法开展生产经营活动,建立健全并严格落实安全生产责任制度,确保职工生命健

康安全。

承诺作出日期: 2023-04-20

承诺履行状态: 全部履行

承诺受理单位: 西峡县应急管理局

承诺受理单位统一社会信用代 11411323MB15367040

码:

第18页 共49页



第29条

| 企业信用承诺信息

41132320230614000932 承诺编码:

承诺类型: 主动型

承诺事由: 主动承诺

关于守法诚信经营的承诺 承诺内容:

承诺作出日期: 2023-06-14

承诺履行状态: 全部履行

承诺受理单位: 西峡县人力资源和社会保障局

承诺受理单位统一社会信用代 11411323006052899X

码:

| 企业信用承诺信息

41132320220708553348 承诺编码: 第30条

承诺类型: 主动型

承诺事由: 主动型,自愿作出承诺

承诺内容:

1.严格遵守法律、法规和规章,积极落实企业安全生产主体责任,扎实有效地开展安全生产工作,不断提升企业安全生产本质水平,努力塑造企业诚实守信的良好形象,促进企业健康有序发展。2.提供给应急管理部门的所有资料均合法、真实、有效,无伪造、修改、虚假成份,并对所提供资料的真实性负责。3.严格依法开展生产经营活动,建立健全并严格落实安全生产责任制度,确保职工生命健康安全。4.主动接受应急管理部门的监管,自愿接受依法开展的日常检查并严格执行执法指令。

承诺作出日期: 2022-07-08

承诺履行状态: 全部履行

承诺受理单位: 西峡县应急管理局

承诺受理单位统一社会信用代 11411323MB15367040

| 企业信用承诺信息

第19页 共49页



承诺编码: 41132320220614M00912 第31条

承诺类型: 主动型

承诺事由: 主动承诺

承诺内容: 关于守法诚信经营的承诺

承诺作出日期: 2022-06-14

承诺履行状态: 全部履行

承诺受理单位: 西峡县人力资源和社会保障局

承诺受理单位统一社会信用代 11411323006052899X

码:

| 企业信用承诺信息

承诺编码: 41132320230610004204 第 32 条

承诺类型: 主动型

承诺事由: 主动型,自愿作出承诺

承诺内容: 主动接受应急管理部门的监管,自愿接受依法开展的日常检查并严格执行执法指令。

承诺作出日期: 2023-06-10

承诺履行状态: 全部履行

承诺受理单位: 西峡县应急管理局

承诺受理单位统一社会信用代 11411323MB15367040

石· 石·

| 企业信用承诺信息

承诺编码: 41132320230110007735 第 33 条

承诺类型: 主动型

承诺事由: 主动型, 自愿作出承诺

承诺内容: 安全生产

承诺作出日期: 2023-01-10

第20页 共49页



承诺履行状态: 全部履行

承诺受理单位: 西峡县应急管理局

承诺受理单位统一社会信用代 11411323MB15367040

码:

| 企业信用承诺信息

承诺编码: 41132320230614022645 第 34 条

承诺类型: 主动型

承诺事由: 主动作出承诺

承诺内容: 承诺在从事财务工作中诚实守信,遵守会计法律、行政法规和国家统一的会计制度规定

承诺作出日期: 2023-06-14

承诺履行状态: 全部履行

承诺受理单位: 西峡县财政局

承诺受理单位统一社会信用代 11411323006052004P

码:

| 企业信用承诺信息

承诺编码: 41132320230610000989 第 35 条

承诺类型: 主动型

承诺事由: 主动型, 自愿作出承诺

承诺内容: 严格依法开展生产经营活动,建立健全并严格落实安全生产责任制度,确保职工生命健

康安全。

承诺作出日期: 2023-06-10

承诺履行状态: 全部履行

承诺受理单位: 西峡县应急管理局

承诺受理单位统一社会信用代 11411323MB15367040

码:

第21页 共49页



| 企业信用承诺信息

承诺编码: 41132320220510M00912 第 36 条

承诺类型: 主动型

承诺事由: 主动承诺

承诺内容: 对所提供的项目备案资料合法性、真实性、准确性等。

承诺作出日期: 2022-05-10

承诺履行状态: 全部履行

承诺受理单位: 西峡县发展和改革委员会

承诺受理单位统一社会信用代 11411323737439886W

码:

| 企业信用承诺信息

承诺编码: 41132320230621000937 第37条

承诺类型: 主动型

承诺事由: 主动作出承诺

承诺内容: 节约用电

承诺作出日期: 2023-06-21

承诺履行状态: 全部履行

承诺受理单位: 国网河南省电力公司西峡县供电公司

承诺受理单位统一社会信用代 91411323MA40WCR971

码:

| 企业信用承诺信息

承诺编码: 41132320230509420328 第 38 条

承诺类型: 主动型

承诺事由: 主动型,自愿作出承诺

承诺内容: 按照环境保护法要求,在生产经营中达标排放

第22页 共49页



承诺作出日期: 2023-05-09

承诺履行状态: 全部履行

承诺受理单位: 南阳市生态环境局西峡分局

承诺受理单位统一社会信用代 114113230060528801

码:

| 企业信用承诺信息

承诺事由: 主动公示型 **承诺作出日期**: 2021-12-31

承诺受理单位: 国家税务总局西峡县税务局

承诺履行状态: ——

| 企业信用承诺信息

承诺编码: 41132320230412019851 第40条

承诺类型: 主动型

承诺事由: 主动作出承诺

承诺内容: 承诺积极加入全县反诈行动,做诚信商户、诚信居民

承诺作出日期: 2023-04-12

承诺履行状态: 全部履行

承诺受理单位: 西峡县公安局

承诺受理单位统一社会信用代 11411323006051941E

码:

| 企业信用承诺信息

承诺编码: 41132320230515038570 第41条

第23页 共49页



承诺类型: 主动型

承诺事由: 主动作出承诺

承诺内容: 法定代表人、自然人股东身份真实性诚信承诺

承诺作出日期: 2023-05-15

承诺履行状态: 全部履行

承诺受理单位: 西峡县市场监督管理局

承诺受理单位统一社会信用代 11411323006052792J

码:

企业信用承诺信息

承诺编码: 41132320230625048072 第42条

承诺类型: 主动型

承诺事由: 主动作出承诺

承诺内容: 承诺响应政府号召,净化城市环境,做文明市民

承诺作出日期: 2023-06-25

承诺履行状态: 全部履行

承诺受理单位: 西峡县城市管理局(西峡县城市综合执法局)

承诺受理单位统一社会信用代 124113237967999027

码:

| 企业信用承诺信息

承诺编码: 41132320230620001060 第43条

承诺类型: 主动型

承诺事由: 主动作出承诺

承诺内容: 严格遵守环保法规,贯彻落实环境保护政策

承诺作出日期: 2023-06-20

承诺履行状态: 全部履行

承诺受理单位: 南阳市生态环境局西峡分局

第24页 共49页



第44条

第45条

承诺受理单位统一社会信用代 114113230060528801

| 企业信用承诺信息

承诺编码: 41132320230605046562

承诺类型: 证明事项型

证明事项型,申请办理河南省企业投资项目备案证明 承诺事由:

承诺内容: 承诺规定时间内提交证明材料

承诺作出日期: 2023-06-05 承诺履行状态: 全部履行

承诺受理单位: 西峡县发展和改革委员会

承诺受理单位统一社会信用代 11411323737439886W

| 企业信用承诺信息

41132320230614031984 承诺编码:

承诺类型: 主动型

主动作出承诺 承诺事由:

承诺内容: 做到法务诚信

承诺作出日期: 2023-06-14

承诺履行状态: 全部履行

承诺受理单位: 西峡县司法局

1141132300605283XM 承诺受理单位统一社会信用代

企业信用承诺信息

第25页 共49页



承诺编码: 41132320220712M00912 第 46 条

承诺类型: 主动型

承诺事由: 主动型, 自愿作出承诺

承诺内容: 严格依法开展生产经营活动,建立健全并严格落实安全生产责任制度,确保职工生命健

康安全。

承诺作出日期: 2022-07-12

承诺履行状态: 全部履行

承诺受理单位: 南阳市西峡县市场监督管理局

承诺受理单位统一社会信用代 11411323006052792J

码:

| 企业信用承诺信息

承诺类型: 主动型 第47条

承诺事由: 证明事项告知承诺,申请办理住所证明文件

承诺作出日期: 2021-03-01

承诺受理单位: 南阳市西峡县市场监督管理局

承诺履行状态: ———

| 企业信用承诺信息

承诺编码: 41132320230619014525 第 48 条

承诺类型: 主动型

承诺事由: 主动作出承诺

承诺内容: 承诺减少排放,进行绿色生产

承诺作出日期: 2023-06-19

承诺履行状态: 全部履行

承诺受理单位: 南阳市生态环境局西峡分局

承诺受理单位统一社会信用代 114113230060528801

码:

第26页 共49页



| 企业信用承诺信息

承诺编码: 41132320230409019644 第49条

承诺类型: 主动型

承诺事由: 主动型, 自愿作出承诺

承诺内容: 自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督。

承诺作出日期: 2023-04-09

承诺履行状态: 全部履行

承诺受理单位: 西峡县文化广电和旅游局

承诺受理单位统一社会信用代 11411323569840549X

码:

| 企业信用承诺信息

承诺编码: 41132320230625022545 第50条

承诺类型: 审批替代型

承诺事由: 申请办理项目备案

承诺内容: 对所提供的资料合法性、真实性、准确性、完整性和有效性负责。

承诺作出日期: 2023-06-25

承诺履行状态: 全部履行

承诺受理单位: 西峡县发展和改革委员会

承诺受理单位统一社会信用代 11411323737439886W

码:

| 企业信用承诺信息

承诺编码: 41132320230613001047 第51条

承诺类型: 主动型

第27页 共49页



承诺事由: 主动作出承诺

承诺内容: 创建文明城市

承诺作出日期: 2023-06-13

承诺履行状态: 全部履行

承诺受理单位: 西峡县市容环卫中心

承诺受理单位统一社会信用代 12411323419290270J

码:

| 企业信用承诺信息

承诺编码: 41132320230410005319 第 52条

承诺类型: 主动型

承诺事由: 主动型, 自愿作出承诺

承诺内容: 遵守商业道德,承担社会责任

承诺作出日期: 2023-04-10

承诺履行状态: 全部履行

承诺受理单位: 西峡县市场监督管理局

承诺受理单位统一社会信用代 11411323006052792J

码:

| 企业信用承诺信息

承诺编码: 41132320230616000945 第53条

承诺类型: 主动型

承诺事由: 诚信兴商承诺

承诺内容: 承诺遵守法律法规,诚信经营

承诺作出日期: 2023-06-16

承诺履行状态: 全部履行

承诺受理单位: 西峡县商务局

承诺受理单位统一社会信用代 11411323795740386Y

第28页 共49页



码:

| 企业信用承诺信息

41132320230411001173 承诺编码:

第54条

承诺类型:

承诺内容:

承诺履行状态:

主动型

全部履行

承诺事由:

主动作出承诺

、隐瞒。

承诺作出日期: 2023-04-11

承诺受理单位: 国家税务总局西峡县税务局

承诺受理单位统一社会信用代

11411323MB19515617

承诺依法接受税务机关依法进行的税务检查,如实反映情况,提供有关资料,不得拒绝

| 企业信用承诺信息

41132320230127000508 承诺编码:

第55条

承诺类型:

主动型

承诺事由:

主动型,自愿作出承诺

承诺内容:

诚信参与政府采购

承诺作出日期:

2023-01-27

承诺履行状态:

全部履行

承诺受理单位:

西峡县财政局

承诺受理单位统一社会信用代

11411323006052004P

企业信用承诺信息

第29页 共49页



承诺编码: 41132320230504000912 第56条

承诺类型: 主动型

承诺事由: 主动承诺

承诺内容: 关于守法诚信经营的承诺

承诺作出日期: 2023-05-04

承诺履行状态: 全部履行

承诺受理单位: 西峡县人力资源和社会保障局

承诺受理单位统一社会信用代 11411323006052899X

码:

| 企业信用承诺信息

承诺编码: 41132320220620478636 第57条

承诺类型: 主动型

承诺事由: 主动型,自愿作出承诺

承诺内容:

1.严格按照国家、省市相关规定,落实企业主体责任,对来自或去过疫情重点地区的返工人员,实行从严管控。如发现可疑病例,及时报告相关信息,协助做好医学观察、隔离等措施。2.全面加强复工后返工人员登记管理,严密关注其健康状况,确保"早发现、早报告、早隔离、早处置"。3.本承诺书交由所在地卫生防疫部门留存。

2022-06-20 承诺作出日期:

承诺履行状态: 全部履行

承诺受理单位: 西峡县卫生健康委员会

承诺受理单位统一社会信用代 11411323006051984U

| 企业信用承诺信息

第58条 承诺编码: 41132320220626506653

承诺类型: 主动型

承诺事由: 主动型,自愿作出承诺

 严格按照国家、省市相关规定,落实企业主体责任,对来自或去过疫情重点地区的返工人员,实行从严管控。如发现可疑病例,及时报告相关信息,协助做好医学观察、隔 承诺内容:

第30页 共49页



离等措施。2.全面加强复工后返工人员登记管理,严密关注其健康状况,确保"早发现

、早报告、早隔离、早处置"。3.本承诺书交由所在地卫生防疫部门留存。

承诺作出日期: 2022-06-26

承诺履行状态: 全部履行

承诺受理单位: 西峡县卫生健康委员会

承诺受理单位统一社会信用代 11411323006051984U

| 企业信用承诺信息

41132320220214M00912 第59条 承诺编码:

主动型 承诺类型:

承诺事由: 主动型,自愿作出承诺

承诺内容: 关于提供资料的及时性、真实性、完整性的承诺

承诺作出日期: 2022-02-14

承诺履行状态: 全部履行

承诺受理单位: 西峡县审计局

承诺受理单位统一社会信用代 11411323006052776W

| 企业信用承诺信息

第60条 承诺编码: 41132320220630525331

承诺类型: 主动型

承诺事由: 主动型,自愿作出承诺

1.严格遵守法律、法规和规章,积极落实企业安全生产主体责任,扎实有效地开展安全 承诺内容:

生产工作,不断提升企业安全生产本质水平,努力塑造企业诚实守信的良好形象,促进企业健康有序发展。2.提供给应急管理部门的所有资料均合法、真实、有效,无伪造、修改、虚假成份,并对所提供资料的真实性负责。3.严格依法开展生产经营活动,建立 健全并严格落实安全生产责任制度,确保职工生命健康安全。4.主动接受应急管理部门的监管,自愿接受依法开展的日常检查并严格执行执法指令。

承诺作出日期: 2022-06-30

第31页 共49页



承诺履行状态: 全部履行

承诺受理单位: 西峡县应急管理局

承诺受理单位统一社会信用代

11411323MB15367040

码:

| 企业信用承诺信息

承诺编码: 41132320220411M00912 第 61条

承诺类型: 主动型

承诺事由: 主动型,自愿作出承诺

承诺内容: 严格依法开展生产经营活动,建立健全并严格落实安全生产责任制度,确保职工生命健

康安全。

承诺作出日期: 2022-04-11

承诺履行状态: 全部履行

承诺受理单位: 西峡县应急管理局

承诺受理单位统一社会信用代 11411323MB15367040

码:

| 企业信用承诺信息

承诺编码: 41132320220711M00912 第 62 条

 承诺李田:
 主动型

承诺内容: 关于提供资料的及时性、真实性、完整性的承诺

承诺作出日期: 2022-07-11

承诺履行状态: 全部履行

承诺受理单位: 西峡县审计局

承诺受理单位统一社会信用代 11411323006052776W

码:

| 企业信用承诺信息

第32页 共49页



承诺编码: 41132320230614041324 第 63 条

 承诺李田:
 审批替代型

 承诺事由:
 自愿作出承诺

承诺内容: 承诺坚决抵制不合格产品的经营销售,发现不合格的产品后,及时更改

承诺作出日期: 2023-06-14

承诺履行状态: 全部履行

承诺受理单位: 西峡县市场监督管理局

承诺受理单位统一社会信用代 11411323006052792J

码:

企业信用承诺信息

承诺编码: 41132320230116RL5552 第 64条

承诺类型: 主动型

承诺事由: 主动型, 自愿作出承诺

承诺内容: 按照劳动法及时发放工资报酬

承诺作出日期: 2023-01-16

承诺履行状态: 全部履行

承诺受理单位: 西峡县人力资源和社会保障局

承诺受理单位统一社会信用代 11411323006052899X

码:

| 企业信用承诺信息

承诺编码: 41132320230112A00912 第 65 条

承诺类型: 主动型

承诺事由: 主动型,自愿作出承诺

第33页 共49页



承诺内容: 疫情防控

承诺作出日期: 2023-01-12

承诺履行状态: 全部履行

承诺受理单位: 西峡县卫生健康委员会

承诺受理单位统一社会信用代 11411323006051984U

码:

| 企业信用承诺信息

承诺编码: 41132320220512M00912 第 66条

承诺类型: 主动型

承诺事由: 主动型, 自愿作出承诺

承诺内容: 严格按照疫情防控要求,做好来访人员登记等工作。

承诺作出日期: 2022-05-12

承诺履行状态: 全部履行

承诺受理单位: 西峡县卫生健康委员会

承诺受理单位统一社会信用代 11411323006051984U

码:

| 企业信用承诺信息

承诺编码: 41132320230510044377 第 67 条

承诺类型: 主动型

承诺事由: 主动型, 自愿作出承诺

承诺内容: 依法保护区域内环境卫生

承诺作出日期: 2023-05-10

承诺履行状态: 全部履行

承诺受理单位: 南阳市生态环境局西峡分局

承诺受理单位统一社会信用代 114113230060528801

码:

第34页 共49页



第68条

| 企业信用承诺信息

承诺编码: 41132320230216001164

承诺类型: 主动型

承诺事由: 自愿作出承诺

承诺内容: 切实保证产品质量,维护消费者的合法权益

承诺作出日期: 2023-02-16

承诺履行状态: 全部履行

承诺受理单位: 西峡县市场监督管理局

承诺受理单位统一社会信用代 11411323006052792J

码:

| 企业信用承诺信息

承诺编码: 41132320230118015882 第69条

承诺类型: 主动型

承诺事由: 主动型,自愿作出承诺

承诺内容: 依法设立应急设施,并保证可随时使用

承诺作出日期: 2023-01-18

承诺履行状态: 全部履行

承诺受理单位: 西峡县应急管理局

承诺受理单位统一社会信用代 11411323MB15367040

码:

| 企业信用承诺信息

承诺编码: 41132320220624497314 第70条

承诺类型: 主动型

第35页 共49页



承诺事由: 主动型,自愿作出承诺

承诺内容:

1.严格按照国家、省市相关规定,落实企业主体责任,对来自或去过疫情重点地区的返工人员,实行从严管控。如发现可疑病例,及时报告相关信息,协助做好医学观察、隔离等措施。2.全面加强复工后返工人员登记管理,严密关注其健康状况,确保"早发现、早报告、早隔离、早处置"。3.本承诺书交由所在地卫生防疫部门留存。

承诺作出日期: 2022-06-24

承诺履行状态: 全部履行

承诺受理单位: 西峡县卫生健康委员会

承诺受理单位统一社会信用代 11411323006051984U

| 企业信用承诺信息

承诺编码: 41132320220622487975 第71条

承诺类型: 主动型

主动型,自愿作出承诺 承诺事由:

1.严格按照国家、省市相关规定,落实企业主体责任,对来自或去过疫情重点地区的返工人员,实行从严管控。如发现可疑病例,及时报告相关信息,协助做好医学观察、隔 承诺内容:

离等措施。2.全面加强复工后返工人员登记管理,严密关注其健康状况,确保"早发现

、早报告、早隔离、早处置"。3.本承诺书交由所在地卫生防疫部门留存。

承诺作出日期: 2022-06-22

承诺履行状态: 全部履行

承诺受理单位: 西峡县卫生健康委员会

承诺受理单位统一社会信用代 11411323006051984U

企业信用承诺信息

41132320230114009652 第72条 承诺编码:

承诺类型: 审批替代型 承诺事由: 自愿作出承诺

承诺内容: 承诺坚决抵制不合格产品的经营销售,发现不合格的产品后,及时更改

承诺作出日期: 2023-01-14

第36页 共49页



承诺履行状态: 全部履行

承诺受理单位: 西峡县市场监督管理局

11411323006052792J 承诺受理单位统一社会信用代

| 企业信用承诺信息

41132320230510035171 承诺编码: 第73条

承诺类型: 主动型

承诺事由: 主动型,自愿作出承诺

依法设立应急设施,并保证可随时使用 承诺内容:

承诺作出日期: 2023-05-10

承诺履行状态: 全部履行

承诺受理单位: 西峡县应急管理局

承诺受理单位统一社会信用代 11411323MB15367040

| 企业信用承诺信息

41132320230116002074 承诺编码: 第74条

承诺类型: 审批替代型

承诺事由: 自愿作出承诺

本单位(人)已认真学习了相关法律法规规章和规范性文件,了解了该项行政许可的有要求,对有关规定的内容已经知晓和全面理解,承诺自身能够满足办理该事项的条件、标 承诺内容:

准技术要求。

2023-01-16 承诺作出日期:

承诺履行状态: 全部履行

承诺受理单位: 西峡县市场监督管理局

承诺受理单位统一社会信用代 11411323006052792J

第37页 共49页



| 企业信用承诺信息

承诺编码: 41132320230412038529 第75条

承诺类型: 主动型

承诺事由: 主动作出承诺

承诺内容: 承诺爱护林木,积极种植,为改善生态环境做贡献

承诺作出日期: 2023-04-12

承诺履行状态: 全部履行

承诺受理单位: 西峡县林业局

承诺受理单位统一社会信用代 11411323006052354X

码:

| 企业信用承诺信息

承诺编码: 41132320230516017153 第76条

承诺类型: 主动型

承诺事由: 自愿作出承诺

承诺内容: 自觉接受政府、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督。

承诺作出日期: 2023-05-16

承诺履行状态: 全部履行

承诺受理单位: 西峡县市场监督管理局

承诺受理单位统一社会信用代 11411323006052792J

码:

| 企业信用承诺信息

承诺编码: 41132320230412002905 第77条

承诺类型: 主动型

承诺事由: 主动作出承诺

承诺内容: 承诺按照规定申领、保管、开具、取得发票。

第38页 共49页



承诺作出日期: 2023-04-12

承诺履行状态: 全部履行

承诺受理单位: 国家税务总局西峡县税务局

11411323MB19515617 承诺受理单位统一社会信用代

| 企业信用承诺信息

承诺编码: 41132320230110007881 第78条

承诺类型: 主动型

主动型,自愿作出承诺 承诺事由:

严格遵守法律、法规和规章,积极落实企业安全生产主体责任,扎实有效地开展安全生产工作,不断提升企业安全生产本质水平,努力塑造企业诚实守信的良好形象,促进企 承诺内容:

业健康有序发展。

2023-01-10 承诺作出日期:

承诺履行状态: 全部履行

承诺受理单位: 西峡县应急管理局

承诺受理单位统一社会信用代 11411323MB15367040

| 企业信用承诺信息

承诺编码: 41132320230510001175 第79条

承诺类型: 主动型

承诺事由: 主动承诺

对所提供的项目备案资料合法性、真实性、准确性等。 承诺内容:

承诺作出日期: 2023-05-10

承诺履行状态: 全部履行

承诺受理单位: 西峡县发展和改革委员会

第39页 共49页



承诺受理单位统一社会信用代 11411323737439886W

| 企业信用承诺信息

承诺编码:

41132320220706544009

第80条

承诺类型:

主动型

承诺事由:

主动型,自愿作出承诺

承诺内容:

1.严格遵守法律、法规和规章,积极落实企业安全生产主体责任,扎实有效地开展安全生产工作,不断提升企业安全生产本质水平,努力塑造企业诚实守信的良好形象,促进企业健康有序发展。2.提供给应急管理部门的所有资料均合法、真实、有效,无伪造、

承诺作出日期:

2022-07-06

承诺履行状态:

全部履行

承诺受理单位:

西峡县应急管理局

承诺受理单位统一社会信用代

11411323MB15367040

| 企业信用承诺信息

承诺编码:

41132320230125M00912

第81条

承诺类型:

主动型

承诺事由:

主动型,自愿作出承诺

承诺内容:

关于依法履行纳税义务的承诺

承诺作出日期:

2023-01-25

承诺履行状态:

全部履行

承诺受理单位:

国家税务总局西峡县税务局

承诺受理单位统一社会信用代

11411323MB19515617

码:

| 企业信用承诺信息

第40页 共49页



承诺编码: 41132320221010M00912 第 82 条

承诺类型: 主动型

承诺事由: 主动型,自愿作出承诺

承诺内容: 关于守法诚信经营的承诺

承诺作出日期: 2022-10-10

承诺履行状态: 全部履行

承诺受理单位: 南阳市西峡县市场监督管理局

承诺受理单位统一社会信用代 11411323006052792J

码:

企业信用承诺信息

承诺编码: 41132320230510043752 第83条

承诺类型: 主动型

承诺事由: 主动型, 自愿作出承诺

承诺内容: 构建网络诚信"诚信经营

承诺作出日期: 2023-05-10

承诺履行状态: 全部履行

承诺受理单位: 西峡县公安局

承诺受理单位统一社会信用代 11411323006051941E

码:

| 企业信用承诺信息

承诺编码: 41132320230620028893 第 84 条

承诺类型: 主动型

承诺事由: 主动作出承诺

第41页 共49页



承诺内容: 承诺申报项目时进行环评

承诺作出日期: 2023-06-20

承诺履行状态: 全部履行

承诺受理单位: 南阳市生态环境局西峡分局

承诺受理单位统一社会信用代 114113230060528801

码:

| 企业信用承诺信息

承诺编码: 41132320230110008638 第85条

承诺类型: 主动型

承诺事由: 主动型, 自愿作出承诺

承诺内容: 依法缴纳职工医保费用

承诺作出日期: 2023-01-10

承诺履行状态: 全部履行

承诺受理单位: 西峡县医疗保障局

承诺受理单位统一社会信用代 11411323MB19742103

码:

| 企业信用承诺信息

承诺编码: 41132320230612028786 第86条

 承诺李里:
 行业自律型

 承诺事由:
 主动作出承诺

承诺内容: 行业自律型,参加企业协会组织的信用承诺活动

承诺作出日期: 2023-06-12

承诺履行状态: 全部履行

承诺受理单位: 西峡县民政局

承诺受理单位统一社会信用代 114113230060519761

码:

第42页 共49页



第87条

| 企业信用承诺信息

承诺编码: 41132320230310003060

承诺类型: 主动型

承诺事由: 主动型,自愿作出承诺

承诺内容: 依法设立应急设施,并保证可随时使用

2023-03-10 承诺作出日期:

承诺履行状态: 全部履行

承诺受理单位: 西峡县应急管理局

承诺受理单位统一社会信用代 11411323MB15367040

| 企业信用承诺信息

承诺编码: 41132320230215A00912 第88条

承诺类型: 主动型

承诺事由: 主动型,自愿作出承诺

自觉履行保护环境的义务 承诺内容:

承诺作出日期: 2023-02-15

承诺履行状态: 全部履行

承诺受理单位: 南阳市生态环境局西峡分局

承诺受理单位统一社会信用代

114113230060528801

| 企业信用承诺信息

41132320220628515992 第89条 承诺编码:

承诺类型: 主动型

第43页 共49页



主动型,自愿作出承诺 承诺事由:

承诺内容:

1.严格按照国家、省市相关规定,落实企业主体责任,对来自或去过疫情重点地区的返工人员,实行从严管控。如发现可疑病例,及时报告相关信息,协助做好医学观察、隔离等措施。2.全面加强复工后返工人员登记管理,严密关注其健康状况,确保"早发现、早报告、早隔离、早处置"。3.本承诺书交由所在地卫生防疫部门留存。

承诺作出日期: 2022-06-28

承诺履行状态: 全部履行

承诺受理单位: 西峡县卫生健康委员会

承诺受理单位统一社会信用代 11411323006051984U

| 企业信用承诺信息

承诺编码: 41132320220605M00912 第90条

承诺类型: 主动型

承诺事由: 主动型,自愿作出承诺

关于落实安全生产守法诚信的承诺 承诺内容:

承诺作出日期: 2022-06-05

承诺履行状态: 全部履行

承诺受理单位: 南阳市西峡县应急管理局

承诺受理单位统一社会信用代 11411323MB15367040

| 企业信用承诺信息

承诺编码: 41132320230110021913 第91条

承诺类型: 主动型

承诺事由: 主动型,自愿作出承诺

构建网络诚信"诚信经营 承诺内容:

承诺作出日期: 2023-01-10

承诺履行状态: 全部履行

第44页 共49页



承诺受理单位: 西峡县公安局

承诺受理单位统一社会信用代 11411323006051941E

码:

| 企业信用承诺信息

承诺编码: 41132320230116002054 第92条

承诺类型: 主动型

承诺事由: 自愿作出承诺

承诺内容: 自觉接受政府、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督。

承诺作出日期: 2023-01-16

承诺履行状态: 全部履行

承诺受理单位: 西峡县市场监督管理局

承诺受理单位统一社会信用代 11411323006052792J

码:

| 企业信用承诺信息

承诺编码: 41132320230422000912 第93条

承诺类型: 主动型

承诺事由: 主动承诺

承诺内容: 自愿遵守环保法律法规

承诺作出日期: 2023-04-22

承诺履行状态: 全部履行

承诺受理单位: 南阳市生态环境局西峡分局

承诺受理单位统一社会信用代 114113230060528801

码:

| 企业信用承诺信息

第45页 共49页



第94条 承诺编码: 41132320230505000912

承诺类型: 主动型

承诺事由: 主动型,自愿作出承诺

承诺内容: 关于守法诚信经营的承诺

承诺作出日期: 2023-05-05

承诺履行状态: 全部履行

承诺受理单位: 西峡县市场监督管理局

承诺受理单位统一社会信用代 11411323006052792J

| 企业信用承诺信息

承诺编码: 41132320220712562687 第95条

承诺类型: 主动型

主动型,自愿作出承诺 承诺事由:

承诺内容:

1.严格遵守法律、法规和规章,积极落实企业安全生产主体责任,扎实有效地开展安全生产工作,不断提升企业安全生产本质水平,努力塑造企业诚实守信的良好形象,促进企业健康有序发展。2.提供给应急管理部门的所有资料均合法、真实、有效,无伪造、修改、虚假成份,并对所提供资料的真实性负责。3.严格依法开展生产经营活动,建立健全并严格落实安全生产责任制度,确保职工生命健康的。4.主动接受应急管理部门

的监管,自愿接受依法开展的日常检查并严格执行执法指令。

承诺作出日期: 2022-07-12

承诺履行状态: 全部履行

承诺受理单位: 西峡县应急管理局

承诺受理单位统一社会信用代 11411323MB15367040

| 企业信用承诺信息

41132320220112M00912 第96条 承诺编码:

承诺类型: 主动型

第46页 共49页



承诺事由: 主动型, 自愿作出承诺

承诺内容: 严格按照疫情防控要求,做好来访人员登记等工作。

承诺作出日期: 2022-01-12

承诺履行状态: 全部履行

承诺受理单位: 西峡县卫生健康委员会

承诺受理单位统一社会信用代 11411323006051984U

码:

| 企业信用承诺信息

承诺编码: 41132320230516054605 第 97 条

承诺类型: 主动型

承诺事由: 诚信经营

承诺内容: 诚信经营

承诺作出日期: 2023-05-16

承诺履行状态: 全部履行

承诺受理单位: 西峡县市场监督管理局

承诺受理单位统一社会信用代 11411323006052792J

码:

| 企业信用承诺信息

承诺编码: 41132320230225001144 第98条

承诺类型: 行业自律型 **承诺事由**: 行业自律型

承诺内容: 共同维护诚信体系,维护良好市场环境

承诺作出日期: 2023-02-25

承诺履行状态: 全部履行

第47页 共49页



报告编号: 202509080807408782S489 生成时间: 2025年09月08日 08:07:40

承诺受理单位: 西峡县民政局

承诺受理单位统一社会信用代 114113230060519761

| 企业信用承诺信息

承诺编码: 41132320230522001232 第99条

承诺类型: 主动型

承诺事由: 主动型,自愿作出承诺

严格依法开展生产经营活动,建立健全并严格落实安全生产责任制度,确保职工生命健 承诺内容:

2023-05-22 承诺作出日期:

承诺履行状态: 全部履行

承诺受理单位: 西峡县应急管理局

承诺受理单位统一社会信用代 11411323MB15367040

码:

| 企业信用承诺信息

41132320220720590704 第100条 承诺编码:

承诺类型: 主动型

承诺事由: 主动型,自愿作出承诺

1.严格遵守法律、法规和规章,积极落实企业安全生产主体责任,扎实有效地开展安全生产工作,不断提升企业安全生产本质水平,努力塑造企业诚实守信的良好形象,促进 承诺内容:

企业健康有序发展。2.提供给应急管理部门的所有资料均合法、真实、有效,无伪造、修改、虚假成份,并对所提供资料的真实性负责。3.严格依法开展生产经营活动,建立健全并严格落实安全生产责任制度,确保职工生命健康安全。4.主动接受应急管理部门的监管,自愿接受依法开展的日常检查并严格执行执法指令。

承诺作出日期: 2022-07-20

承诺履行状态: 全部履行

承诺受理单位: 西峡县应急管理局

承诺受理单位统一社会信用代 11411323MB15367040

码:

第48页 共49页



报告编号: 202509080807408782S489 生成时间: 2025年09月08日 08:07:40

七、信用评价信息 (共 0 条)

此项信息相关部门暂未提供

八、司法判决及执行信息 (共 0 条)

此项信息相关部门暂未提供

九、其他信息 (共0条)

查询期内无相关记录

十、信用状况提升建议

建议秉持诚信理念,合法有序开展经营活动。

结束

第49页 共49页

5.3 无违法违规记录证明版专项信用报告





法人和非法人组织 公共信用信息报告

版本号V2.0

机构名称: 南阳华岳路桥工程有限公司

统一社会信用代码: 91411323MA3XARWX4L

报告编号: 20250908KDAX01034748

报告生成日期: 2025年09月08日

报告出具单位:河南省营商环境和社会信用建设中心



扫一扫



核验码

公共信用信息概览

南阳华岳路桥工程有限公司

-、基础信息

统一社会信用代码	91411323MA3XARWX4L	法定代表人	刘溪洋
成立日期	2016-06-14	注册机构	西峡县市场监督管理局
企业类型	其他有限责任公司	企业状态	存续
住所	西峡县五里桥镇工业大道	中段东侧	

二、信用信息概要

行政管理信息	4条	诚实守信相关荣誉信息	5条
严重失信主体名单信息	0条	经营(活动)异常名录(状态)信息	0条
信用承诺及其履行情况信息	110条	信用评价信息	0条
司法判决及执行信息	0条	其他信息	0条

第1页,共52页





报告说明



核验码

1.本报告所展示的数据和资料为公共信用信息,"信用中国(河南)"网站(www.credit.hen an.gov.cn)承诺在数据汇总、加工、整合的过程中保持客观中立,不主动编辑或修改信息的内容。

2.受限于现有技术水平等原因,对此报告信息的展示,并不视为"信用中国(河南)"对其内容的真实性、准确性、完整性、时效性作出任何形式的确认或担保。请在依据本报告信息作出判断或决策前,自行进一步核实此类信息的完整或准确性,并自行承担使用后果。

3.如认为本报告所展示信息存在错误、遗漏、重复公示、不应公示、超期公示或与认定机关信息不一致等情况,请以数据源单位的信息为准,并可按照"信用中国(河南)""信用信息异议申诉指南"提出异议申诉;如需对相关行政处罚信息进行信用修复,可按照"信用中国(河南)""行政处罚信息信用修复流程指引"提出信用修复申请;如需对相关严重失信主体名单进行信用修复,请咨询名单认定单位。

4.本报告已添加"信用中国(河南)"水印、生成唯一的报告编号和报告核验码。如需对内容的真实性进行核验,可通过扫一扫报告首页"核验码",查看本报告生成时的内容与纸质版报告内容是否一致。

5.本报告展示行政管理、诚实守信相关荣誉、严重失信主体名单、经营(活动)异常名录(状态)、信用承诺及其履行情况、信用评价、司法判决及执行和其他类等信息,因篇幅有限,单类信息仅按更新程度展示最近日期的100条。如有特殊需求,请与我们联系。

第2页, 共52页



正文



核验码

南阳华岳路桥工程有限公司

一、登记注册基础信息

统一社会信用代码	91411323MA3XARWX4L	法定代表人	刘溪洋
成立日期	2016-06-14	注册机构	西峡县市场监督管理局
企业类型	其他有限责任公司	企业状态	存续
住所	西峡县五里桥镇工业大道	中段东侧	THE CONTRACTOR

二、行政管理信息(共4条)

行政许可(旧标准)共(1)条记录

第1条

许可有效期	
许可截止日期	2016-06-14
行政许可决定书文号	空
许可决定日期	2016-06-14
审核类型	登记而严禁的
许可内容	承担公路工程施工、公路养护工程施工、市政公用工程施工、桥梁、涵洞及隧道工程施工、绿化工程施工、水泥制品、机械设备租赁
许可机关	南阳市西峡县工商行政管理局

行政处罚共(1)条记录

第1条

第3页,共52页



暂扣或吊销证照名称及编号	无
违法事实	2022年57月27日南阳华岳路桥工程有限公司未经水行政主管部门批准,擅自在太平镇辛河河道采砂
处罚内容	罚款10000元整
违法行为类型	当事人违犯了《河南省河道采砂管理办法》第十二条
数据来源	西峡县水利局
行政处罚决定书文号	西水罚决字(2022)第14号
罚款金额 (万元)	
处罚领域	100
没收违法所得、没收非法财 物的金额(万元)	
数据来源单位统一社会信用代码	11411323006052194N
处罚依据	依据《河南省河道采砂管理办法》第二十七条进行处罚
处罚类别	罚款
处罚决定日期	2022-12-28
处罚机关统一社会信用代码	11411323006052194N
备注	无
唯一标识	80206015
处罚机关	西峡县水利局

行政许可(新标准)共(2)条记录

第1条

许可类别	普通	A Way	THE REPORT OF THE PERSON OF TH
有效期自	2024-04-16		

第4页, 共52页



数据来源单位	西峡县水利局	10000000000000000000000000000000000000	1000年1000年100日
许可机关	西峡县水利局		
许可决定日期	2024-04-16	HERPELIND)	war all which
许可证书名称	取水许可证		
行政许可决定文书名称	西峡县水利局关于南阳华岳岛	各桥工程有限公司取水许可	可延续的批复
许可编号	D411323G2021-0101		
有效期至	2029-04-15		
数据来源单位统一社会信用 代码	11411323006052194N		
行政许可决定文书号	西水许准 (2024)28号		
许可机关统一社会信用代码	11411323006052194N	A WHITTHEN	THE PERSON NAMED IN
许可内容	年取地下水0.6万立方米		

第2条

许可类别	普通而用图》	
有效期自	2024-04-16	
数据来源单位	西峡县水利局	
许可机关	西峡县水利局	
许可决定日期	2024-04-16	
许可证书名称	取水许可证	
行政许可决定文书名称	西峡县水利局关于南阳华岳路桥工程有限公司取水许可变更的批复	
许可编号	D411323G2021-0101	
有效期至	2029-04-15	

第5页, 共52页



数据来源单位统一社会信用 代码	11411323006052194N
行政许可决定文书号	西水许准 (2024) 29号
许可机关统一社会信用代码	11411323006052194N
许可内容	年取地下水0.6万立方米

三、诚实守信相关荣誉信息(共0条)

截至出具本报告时间,河南省信用信息平台暂未查询到相关记录

四、严重失信主体名单信息(共0条)

截至出具本报告时间,河南省信用信息平台暂未查询到相关记录

五、经营(活动)异常名录(状态)信息(共0条)

截至出具本报告时间,河南省信用信息平台暂未查询到相关记录

六、信用承诺及其履行情况信息 (共 110 条)

企业信用承诺信息(旧标准)共(2)条记录

第1条

承诺履行状态	基 维用作品	THE WELLS	(1) (1) (1) (1)
承诺受理单位	国家税务总局西峡县税务	-局	
承诺作出日期	2021-12-31	and the second	国际中国研究
承诺类型	主动型	102	
承诺事由	主动公示型		

第2条

承诺履行状态		
承诺受理单位	南阳市西峡县市场监督管理局	Control of the
承诺作出日期	2021-03-01	

第6页,共52页



承诺类型	主动型
承诺事由	证明事项告知承诺,申请办理住所证明文件

企业信用承诺信息(新标准)共(108)条记录

第1条

承诺受理单位统一社会信用 代码	114113230060528801		THE CHARLES
承诺内容	自愿遵守环保法律法规		
承诺履行状态	全部履行	THE OWNERS OF THE PERSON NAMED IN	A China San
承诺受理单位	南阳市生态环境局西峡分局		
承诺作出日期	2023-04-22	an ampainte	AN HIMPERINA
承诺编码	41132320230422000912		
承诺类型	主动型		
承诺事由	主动承诺	THE REPORT OF THE PARTY OF THE	(有用用)

第2条

承诺受理单位统一社会信用 代码	11411323MB15367040		
承诺内容	严格依法开展生产经营活动, 康安全。	建立健全并严格落实安全	生产责任制度,确保职工生命健
承诺履行状态	全部履行	AND THE PROPERTY OF THE PARTY O	MARKET NO.
承诺受理单位	西峡县应急管理局		
承诺作出日期	2023-06-10	a marining	a mental and
承诺编码	41132320230610000989		
承诺类型	主动型		
承诺事由	主动型,自愿作出承诺	国 集用中国	国 (

第7页, 共52页



第3条

承诺受理单位统一社会信用 代码	11411323006052899X	
承诺内容	依法缴纳职工医保费用	
承诺履行状态	全部履行	"我们们是
承诺受理单位	西峡县人力资源和社会保障局	
承诺作出日期	2023-01-10	
承诺编码	41132320230110007438	10000000000000000000000000000000000000
承诺类型	主动型	
承诺事由	主动型,自愿作出承诺	and the party of t

第4条

承诺受理单位统一社会信用 代码	114113230060528801
承诺内容	承诺减少排放,进行绿色生产
承诺履行状态	全部履行
承诺受理单位	南阳市生态环境局西峡分局
承诺作出日期	2023-06-19
承诺编码	41132320230619014525
承诺类型	主动型
承诺事由	主动作出承诺

第5条

承诺受理单位统一社会信用 代码	11411323006052792J	
--------------------	--------------------	--

第8页, 共52页



承诺内容	严格依法开展生产经营活动,建立健全并严格落实安全生产责任制度,确保康安全。	职工生命優
承诺履行状态	全部履行	(4) (2) (3) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4
承诺受理单位	西峡县市场监督管理局	
承诺作出日期	2023-04-06	
承诺编码	41132320230406000912	
承诺类型	主动型	
承诺事由	主动型, 自愿作出承诺	10/0

第6条

承诺受理单位统一社会信用 代码	11411323MB15367040
承诺内容	严格依法开展生产经营活动,建立健全并严格落实安全生产责任制度,确保职工生命健康安全。
承诺履行状态	全部履行。
承诺受理单位	西峡县应急管理局
承诺作出日期	2023-05-22
承诺编码	41132320230522001232
承诺类型	主动型
承诺事由	主动型,自愿作出承诺

第7条

承诺受理单位统一社会信用 代码	11411323MB15367040	of minima man	e granto
承诺内容	严格依法开展生产经营活动, 康安全。	建立健全并严格落实安全生产责任制度,	确保职工生命健

第9页,共52页



承诺履行状态	全部履行
承诺受理单位	西峡县应急管理局
承诺作出日期	2023-05-10
承诺编码	41132320230510044661
承诺类型	主动型
承诺事由	主动型,自愿作出承诺

第8条

承诺受理单位统一社会信用 代码	11411323006052899X
承诺内容	依法用工,同时为员工缴纳社保
承诺履行状态	全部履行
承诺受理单位	西峡县人力资源和社会保障局
承诺作出日期	2023-06-21
承诺编码	41132320230621010279
承诺类型	审批替代型
承诺事由	自愿作出承诺

第9条

承诺受理单位统一社会信用 代码	11411323006052792J
承诺内容	个体、企业自主年报公示承诺
承诺履行状态	全部履行
承诺受理单位	西峡县市场监督管理局
承诺作出日期	2023-04-15

第10页,共52页



承诺编码	41132320230415006860
承诺类型	主动型
承诺事由	主动作出承诺

第10条

承诺受理单位统一社会信用 代码	11411323006052899X
承诺内容	承诺遵守用工制度,及时全量支付农民工工资
承诺履行状态	全部履行
承诺受理单位	西峡县人力资源和社会保障局
承诺作出日期	2023-04-13
承诺编码	41132320230413001162
承诺类型	主动型
承诺事由	遵守劳动法

第11条

承诺受理单位统一社会信用代码	91411323MA40WCR971		
承诺内容	节约用电	4 使用中国(M) (P)	一种用用的
承诺履行状态	全部履行		
承诺受理单位	国网河南省电力公司西峡县供电	公司	
承诺作出日期	2023-06-21	g mm m m	THE CHARLES
承诺编码	41132320230621000937		
承诺类型	主动型		
承诺事由	主动作出承诺		

第11页,共52页



第12条

承诺受理单位统一社会信用 代码	11411323006052899X	
承诺内容	关于守法诚信经营的承诺	A million
承诺履行状态	全部履行	THE PROPERTY OF THE PARTY OF TH
承诺受理单位	西峡县人力资源和社会保障局	
承诺作出日期	2023-05-04	通用用中国的
承诺编码	41132320230504000912	
承诺类型	主动型	
承诺事由	主动承诺	A China Car

第13条

承诺受理单位统一社会信用 代码	114113230060519761	
承诺内容	共同维护诚信体系,维护良好市场环境	
承诺履行状态	全部履行。以外的企工,但有可可以外的企工,但有可可以	1/2/
承诺受理单位	西峡县民政局	
承诺作出日期	2023-02-25	
承诺编码	41132320230225001144	
承诺类型	行业自律型	
承诺事由	行业自律型	140

第14条

承诺受理单位统一社会信用 代码	11411323006052792J	
承诺内容	诚信经营	

第12页,共52页



承诺履行状态	全部履行	
承诺受理单位	西峡县市场监督管理局	
承诺作出日期	2023-05-16	
承诺编码	41132320230516054605	
承诺类型	主动型	
承诺事由	诚信经营	

第15条

承诺受理单位统一社会信用 代码	11411323MB15367040	
承诺内容	依法设立应急设施,并保证可随时使用	THE REPORT OF THE PARTY OF THE
承诺履行状态	全部履行	
承诺受理单位	西峡县应急管理局	dimensus.
承诺作出日期	2023-01-18	
承诺编码	41132320230118015882	
承诺类型	主动型	THE THE WAY
承诺事由	主动型,自愿作出承诺	

第16条

承诺受理单位统一社会信用 代码	11411323006052776W	A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH
承诺内容	关于提供资料的及时性、真实性、完整性的承诺	Lamber (p)
承诺履行状态	全部履行	
承诺受理单位	西峡县审计局	
承诺作出日期	2022-02-14	国际中国内

第13页,共52页



承诺编码	41132320220214M00912
承诺类型	主动型 中国 (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
承诺事由	主动型,自愿作出承诺

第17条

承诺受理单位统一社会信用 代码	11411323MB15367040	AR WELLER	AN MINISTER
承诺内容	依法设立应急设施,并保证	正可随时使用	
承诺履行状态	全部履行	1981年月月	THE CONTRACTOR OF THE PARTY OF
承诺受理单位	西峡县应急管理局		
承诺作出日期	2023-03-10	建筑中国(水)	a merimum tr
承诺编码	41132320230310003060		
承诺类型	主动型		
承诺事由	主动型, 自愿作出承诺		

第18条

承诺受理单位统一社会信用代码	11411323MB19515617
承诺内容	关于依法履行纳税义务的承诺
承诺履行状态	全部履行
承诺受理单位	国家税务总局西峡县税务局
承诺作出日期	2023-05-12
承诺编码	41132320230512004183
承诺类型	主动型
承诺事由	主动型,自愿作出承诺

第14页,共52页



第19条

承诺受理单位统一社会信用 代码	11411323737439886W	(A)
承诺内容	对所提供的项目备案资料合法性、真实性、准	确性、完整性和有效性负责
承诺履行状态	全部履行	
承诺受理单位	西峡县发展和改革委员会	13 作用中型
承诺作出日期	2023-05-10	
承诺编码	41132320230510037378	
承诺类型	主动型	
承诺事由	主动型,自愿作出承诺	

第20条

承诺受理单位统一社会信用 代码	1141132300605283XM	
承诺内容	做到法务诚信	
承诺履行状态	全部履行	
承诺受理单位	西峡县司法局	estation (*)
承诺作出日期	2023-06-14	
承诺编码	41132320230614031984	
承诺类型	主动型	de la
承诺事由	主动作出承诺	

第21条

承诺受理单位统一社会信用 代码	11411323MB19515617
承诺内容	承诺按照规定申领、保管、开具、取得发票。

第15页,共52页



承诺履行状态	全部履行
承诺受理单位	国家税务总局西峡县税务局
承诺作出日期	2023-04-12
承诺编码	41132320230412002905
承诺类型	主动型
承诺事由	主动作出承诺

第22条

承诺受理单位统一社会信用 代码	11411323737439886W	
承诺内容	对所提供的资料合法性、真实性、准确性、完整性和有效性负责。	
承诺履行状态	全部履行	
承诺受理单位	西峡县发展和改革委员会	
承诺作出日期	2023-06-25	
承诺编码	41132320230625022545	
承诺类型	审批替代型	
承诺事由	申请办理项目备案	

第23条

承诺受理单位统一社会信用 代码	11411323737439886W
承诺内容	同意将信用承诺纳入信用中国各级网站并上网公示,接受社会监督。
承诺履行状态	全部履行
承诺受理单位	西峡县发展和改革委员会
承诺作出日期	2023-06-25

第16页,共52页



承诺编码	41132320230625003991
承诺类型	主动型
承诺事由	"围绕联合奖惩构建网络诚信"诚信经营承诺书

第24条

承诺受理单位统一社会信用 代码	11411323006051984U	THE WAY	on Hilliam by
承诺内容	工人员,实行从严管控。如	发现可疑病例,及时报告相后返工人员登记管理,严密	对来自或去过疫情重点地区的返 目关信息,协助做好医学观察、隔 香关注其健康状况,确保"早发现 也卫生防疫部门留存。
承诺履行状态	全部履行		
承诺受理单位	西峡县卫生健康委员会		
承诺作出日期	2022-06-22	AND A DE LA COLOR	THE WASHINGTON
承诺编码	41132320220622487975		
承诺类型	主动型	distribution of the second	to the second se
承诺事由	主动型, 自愿作出承诺	A CHARLES	The department of the second

第25条

承诺受理单位统一社会信用 代码	11411323006052899X	
承诺内容	按照劳动法及时发放工资报酬	
承诺履行状态	全部履行	SOUTH THE PROPERTY OF
承诺受理单位	西峡县人力资源和社会保障局	
承诺作出日期	2023-01-16	
承诺编码	41132320230116RL5552	10000000000000000000000000000000000000

第17页,共52页



承诺类型	主动型
承诺事由	主动型,自愿作出承诺

第26条

承诺受理单位统一社会信用 代码	11411323MB15367040		
承诺内容	严格依法开展生产经营活动, 康安全。	建立健全并严格落实安全	生产责任制度,确保职工生命健
承诺履行状态	全部履行		
承诺受理单位	西峡县应急管理局		
承诺作出日期	2023-01-09	THE REPUBLICATION OF THE PARTY	THE WATER WATER
承诺编码	41132320230109001154		
承诺类型	主动型	o million by	a delimination (Ex
承诺事由	主动型,自愿作出承诺	THE WILLIAM	A Walley

第27条

承诺受理单位统一社会信用 代码	11411323006052776W
承诺内容	关于提供资料的及时性、真实性、完整性的承诺
承诺履行状态	全部履行
承诺受理单位	西峡县审计局
承诺作出日期	2022-07-11
承诺编码	41132320220711M00912
承诺类型	主动型
承诺事由	主动承诺

第28条

第18页,共52页



承诺受理单位统一社会信用 代码	11411323737439886W	建设设置
承诺内容	对所提供的项目备案资料合法性、真实性、准确性等。	
承诺履行状态	全部履行	The state of the s
承诺受理单位	西峡县发展和改革委员会	通 用用思想
承诺作出日期	2022-05-10	
承诺编码	41132320220510M00912	一种中国 中国中心
承诺类型	主动型	
承诺事由	主动承诺	

第29条

承诺受理单位统一社会信用 代码	11411323006051984U	
承诺内容	疫情防控	0.147
承诺履行状态	全部履行	
承诺受理单位	西峡县卫生健康委员会	6/21
承诺作出日期	2023-01-12	
承诺编码	41132320230112A00912	
承诺类型	主动型 ((個用)	0/6,
承诺事由	主动型,自愿作出承诺	

第30条

承诺受理单位统一社会信用代码	11411323006052004P		E (KAL) E
承诺内容	诚信参与政府采购		tri (furm
承诺履行状态	全部履行	10000000000000000000000000000000000000	11 (1) (1)

第19页,共52页





承诺受理单位	西峡县财政局	
承诺作出日期	2023-01-27	
承诺编码	41132320230127000508	Co.
承诺类型	主动型	30 (1) (1)
承诺事由	主动型,自愿作出承诺	

第31条

承诺受理单位统一社会信用 代码	11411323006052354X	
承诺内容	承诺爱护林木,积极种植,为改善生态环境做贡献	电面中国印 斯
承诺履行状态	全部履行	
承诺受理单位	西峡县林业局	
承诺作出日期	2023-04-12	
承诺编码	41132320230412038529	
承诺类型	主动型	
承诺事由	主动作出承诺	

第32条

承诺受理单位统一社会信用代码	124113237967999027	And the ball of the last
承诺内容	承诺响应政府号召,净化城市环境,做文明市民	
承诺履行状态	全部履行	THE PERSON AND THE PE
承诺受理单位	西峡县城市管理局(西峡县城市综合执法局)	
承诺作出日期	2023-06-25	dimme.

第20页,共52页



承诺编码	41132320230625048072
承诺类型	主动型
承诺事由	主动作出承诺

第33条

承诺受理单位统一社会信用 代码	11411323006051984U
承诺内容	1. 严格按照国家、省市相关规定,落实企业主体责任,对来自或去过疫情重点地区的返工人员,实行从严管控。如发现可疑病例,及时报告相关信息,协助做好医学观察、隔离等措施。2. 全面加强复工后返工人员登记管理,严密关注其健康状况,确保"早发现、早报告、早隔离、早处置"。3. 本承诺书交由所在地卫生防疫部门留存。
承诺履行状态	全部履行
承诺受理单位	西峡县卫生健康委员会
承诺作出日期	2022-06-26
承诺编码	41132320220626506653
承诺类型	主动型
承诺事由	主动型,自愿作出承诺

第34条

承诺受理单位统一社会信用 代码	11411323006052194N		
承诺内容	节约用水,杜绝浪费	m to the limiter	a a a a a a a a a a a a a a a a a a a
承诺履行状态	全部履行		
承诺受理单位	西峡县水利局		
承诺作出日期	2023-04-10	THE REPORT OF THE PARTY OF THE	THE WATER WATER
承诺编码	41132320230410001300		

第21页,共52页



承诺类型	主动型
承诺事由	主动型,自愿作出承诺

第35条

承诺受理单位统一社会信用 代码	11411323MB19742103		
承诺内容	依法缴纳职工医保费用	THE PERSON PARTY AND ADDRESS OF THE PERSON PARTY AND ADDRESS O	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
承诺履行状态	全部履行		
承诺受理单位	西峡县医疗保障局		
承诺作出日期	2023-01-10	A CHARLES	(用用)
承诺编码	41132320230110008638		
承诺类型	主动型	一种 信用中国 国内(2)	and the second s
承诺事由	主动型, 自愿作出承诺		

第36条

承诺受理单位统一社会信用 代码	11411323737439886W	
承诺内容	承诺规定时间内提交证明材料	
承诺履行状态	全部履行	AND OF THE PARTY O
承诺受理单位	西峡县发展和改革委员会	
承诺作出日期	2023-06-05	(中国100g)
承诺编码	41132320230605046562	
承诺类型	证明事项型	
承诺事由	证明事项型,申请办理河南省企业投资项目备案证明	国 作用中国 UNIX

第37条

第22页, 共52页



承诺受理单位统一社会信用 代码	11411323006051984U		
承诺内容	严格按照疫情防控要求,仍	数好来访人员登记等工作。	
承诺履行状态	全部履行	AL THE PRINCE	THE REPORT OF THE PARTY OF THE
承诺受理单位	西峡县卫生健康委员会		
承诺作出日期	2022-01-12	on and the second	en Blindi
承诺编码	41132320220112M00912		THE PROPERTY OF
承诺类型	主动型		
承诺事由	主动型,自愿作出承诺	新原用中国 (1000)	国 田田中国 (市)

第38条

承诺受理单位统一社会信用 代码	114113230060519761
承诺内容	共同维护诚信体系,维护良好市场环境
承诺履行状态	全部履行
承诺受理单位	西峡县民政局
承诺作出日期	2022-07-11
承诺编码	41132320220711M00912
承诺类型	行业自律型
承诺事由	行业自律型

第39条

承诺受理单位统一社会信用 代码	11411323MB15367040	
--------------------	--------------------	--

第23页,共52页



承诺内容	1. 严格遵守法律、法规和规章,积极落实企业安全生产主体责任,扎实有效地开展安全生产工作,不断提升企业安全生产本质水平,努力塑造企业诚实守信的良好形象,促进企业健康有序发展。2. 提供给应急管理部门的所有资料均合法、真实、有效,无伪造、修改、虚假成份,并对所提供资料的真实性负责。3. 严格依法开展生产经营活动,建立健全并严格落实安全生产责任制度,确保职工生命健康安全。4. 主动接受应急管理部门的监管,自愿接受依法开展的日常检查并严格执行执法指令。		
承诺履行状态	全部履行		
承诺受理单位	西峡县应急管理局		
承诺作出日期	2022-07-04		
承诺编码	41132320220704534670		
承诺类型	主动型		
承诺事由	主动型,自愿作出承诺		

第40条

承诺受理单位统一社会信用 代码	12411323419290270J	A CHERTON	
承诺内容	创建文明城市		
承诺履行状态	全部履行	THE PROPERTY OF	AL GREEN TO
承诺受理单位	西峡县市容环卫中心		
承诺作出日期	2023-06-13	CONTRACTOR OF THE PERSON AND THE PER	es de la
承诺编码	41132320230613001047		
承诺类型	主动型		
承诺事由	主动作出承诺	AN ALBOMANIA PARTITION OF THE PARTITION	AN HARPENIN

第41条

承诺受理单位统一社会信用 代码	11411323006051941E	建新中国的 拉
--------------------	--------------------	----------------

第24页, 共52页



承诺内容	承诺积极加入全县反诈行	动,做诚信商户、诚信居民	
承诺履行状态	全部履行	THE STREET STREET	B and a
承诺受理单位	西峡县公安局		
承诺作出日期	2023-04-12	and and the same of	mar mark
承诺编码	41132320230412019851		
承诺类型	主动型		
承诺事由	主动作出承诺	有用用用用	新 伊斯中国

第42条

承诺受理单位统一社会信用 代码	11411323MB15367040
承诺内容	1. 严格遵守法律、法规和规章,积极落实企业安全生产主体责任,扎实有效地开展安全生产工作,不断提升企业安全生产本质水平,努力塑造企业诚实守信的良好形象,促进企业健康有序发展。2. 提供给应急管理部门的所有资料均合法、真实、有效,无伪造、修改、虚假成份,并对所提供资料的真实性负责。3. 严格依法开展生产经营活动,建立健全并严格落实安全生产责任制度,确保职工生命健康安全。4. 主动接受应急管理部门的监管,自愿接受依法开展的日常检查并严格执行执法指令。
承诺履行状态	全部履行
承诺受理单位	西峡县应急管理局
承诺作出日期	2022-07-20
承诺编码	41132320220720590704
承诺类型	主动型
承诺事由	主动型,自愿作出承诺

第43条

承诺受理单位统一社会信用	114113230060528801	
代码		

第25页,共52页



承诺内容	自愿遵守环保法律法规
承诺履行状态	全部履行
承诺受理单位	南阳市生态环境局西峡分局
承诺作出日期	2023-01-11
承诺编码	41132320230111001149
承诺类型	主动型
承诺事由	主动承诺。

第44条

承诺受理单位统一社会信用 代码	11411323MB15367040
承诺内容	依法设立应急设施,并保证可随时使用
承诺履行状态	全部履行
承诺受理单位	西峡县应急管理局
承诺作出日期	2023-05-10
承诺编码	41132320230510035171
承诺类型	主动型
承诺事由	主动型,自愿作出承诺

第45条

承诺受理单位统一社会信用 代码	11411323006051941E		
承诺内容	网络文明	國際中國地位	and the transmitter
承诺履行状态	全部履行		
承诺受理单位	西峡县公安局		

第26页,共52页



承诺作出日期	2023-06-12
承诺编码	41132320230612000953
承诺类型	主动型
承诺事由	主动作出承诺

第46条

承诺受理单位统一社会信用 代码	11411323006052004P
承诺内容	承诺在从事财务工作中诚实守信,遵守会计法律、行政法规和国家统一的会计制度规定
承诺履行状态	全部履行
承诺受理单位	西峡县财政局
承诺作出日期	2023-06-14
承诺编码	41132320230614022645
承诺类型	主动型
承诺事由	主动作出承诺

第47条

承诺受理单位统一社会信用 代码	11411323006052792J	
承诺内容	自觉接受政府、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督。	
承诺履行状态	全部履行	
承诺受理单位	西峡县市场监督管理局	
承诺作出日期	2023-05-16	
承诺编码	41132320230516017153	
承诺类型	主动型	

第27页,共52页



承诺事由 自愿作出承诺

第48条

承诺受理单位统一社会信用代码	11411323006052792J		
承诺内容	切实保证产品质量,维护消	费者的合法权益	
承诺履行状态	全部履行	·····································	国 用用中国 (37)
承诺受理单位	西峡县市场监督管理局		
承诺作出日期	2023-05-16	The state of the s	TO THE STATE OF TH
承诺编码	41132320230516018074	THE WALLS	10000000000000000000000000000000000000
承诺类型	主动型		
承诺事由	自愿作出承诺	一种用中国的 的	一种中国 加州

第49条

承诺受理单位统一社会信用 代码	11411323006052899X	展中国 (1917)
承诺内容	关于守法诚信经营的承诺	
承诺履行状态	全部履行	
承诺受理单位	西峡县人力资源和社会保障局	BE COMPENSATION OF THE PERSON
承诺作出日期	2022-06-14	
承诺编码	41132320220614M00912	man man
承诺类型	主动型	Man and a second
承诺事由	主动承诺	

第50条

承诺受理单位统一社会信用 代码	114113230060528801	

第28页,共52页



承诺内容	按照环境保护法要求,在生产经营中达标排放	
承诺履行状态	全部履行	
承诺受理单位	南阳市生态环境局西峡分局	
承诺作出日期	2023-03-09	
承诺编码	41132320230309212252	
承诺类型	主动型 1000000000000000000000000000000000000	
承诺事由	主动型,自愿作出承诺	

第51条

承诺受理单位统一社会信用 代码	11411323MB15367040		
承诺内容	安全生产	The state of the s	
承诺履行状态	全部履行	100 (100)	B (time)
承诺受理单位	西峡县应急管理局		
承诺作出日期	2023-01-10	· (有用中国(2012)	医 (6年) 第四 年
承诺编码	41132320230110007735		
承诺类型	主动型		
承诺事由	主动型,自愿作出承诺	通用作用用	111 信息思想

第52条

承诺受理单位统一社会信用 代码	11411323006051941E
承诺内容	构建网络诚信"诚信经营
承诺履行状态	全部履行
承诺受理单位	西峡县公安局

第29页,共52页



承诺作出日期	2023-01-10
承诺编码	41132320230110021913
承诺类型	主动型
承诺事由	主动型,自愿作出承诺

第53条

承诺受理单位统一社会信用 代码	11411323006051984U
承诺内容	1. 严格按照国家、省市相关规定,落实企业主体责任,对来自或去过疫情重点地区的返工人员,实行从严管控。如发现可疑病例,及时报告相关信息,协助做好医学观察、隔离等措施。2. 全面加强复工后返工人员登记管理,严密关注其健康状况,确保"早发现、早报告、早隔离、早处置"。3. 本承诺书交由所在地卫生防疫部门留存。
承诺履行状态	全部履行
承诺受理单位	西峡县卫生健康委员会
承诺作出日期	2022-06-24
承诺编码	41132320220624497314
承诺类型	主动型(日本)
承诺事由	主动型,自愿作出承诺

第54条

承诺受理单位统一社会信用代码	11411323006052792J		
承诺内容	维护市场正常经营		
承诺履行状态	全部履行		
承诺受理单位	西峡县市场监督管理局		
承诺作出日期	2023-01-21	一种用中国的 的	国 保有中国(MA)

第30页,共52页



承诺编码	41132320230121M00912
承诺类型	主动型
承诺事由	主动型,自愿作出承诺

第55条

承诺受理单位统一社会信用 代码	11411323006052792J	
承诺内容	遵守法律法规,诚信经营,确保产品质量	The state of the s
承诺履行状态	全部履行	
承诺受理单位	西峡县市场监督管理局	
承诺作出日期	2023-05-10	THE DESIGNATION OF THE PERSON
承诺编码	41132320230510030944	
承诺类型	主动型	and the second second
承诺事由	主动型,自愿作出承诺	and the same

第56条

承诺受理单位统一社会信用 代码	11411323006052792J
承诺内容	自觉接受政府、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督。
承诺履行状态	全部履行 国际外边
承诺受理单位	西峡县市场监督管理局
承诺作出日期	2023-01-16
承诺编码	41132320230116002054
承诺类型	主动型
承诺事由	自愿作出承诺

第31页,共52页



第57条

承诺受理单位统一社会信用代码	11411323MB15367040
承诺内容	主动接受应急管理部门的监管,自愿接受依法开展的日常检查并严格执行执法指令。
承诺履行状态	全部履行
承诺受理单位	西峡县应急管理局
承诺作出日期	2023-01-10
承诺编码	41132320230110040829
承诺类型	主动型
承诺事由	主动型,自愿作出承诺

第58条

承诺受理单位统一社会信用 代码	11411323MB19515617
承诺内容	承诺依法接受税务机关依法进行的税务检查,如实反映情况,提供有关资料,不得拒绝、隐瞒。
承诺履行状态	全部履行
承诺受理单位	国家税务总局西峡县税务局
承诺作出日期	2023-04-11
承诺编码	41132320230411001173
承诺类型	主动型
承诺事由	主动作出承诺

第59条

承诺受理单位统一社会信用 代码	11411323006052792J		
--------------------	--------------------	--	--

第32页,共52页



承诺内容	承诺坚决抵制不合格产品的经营销售,发现不合格的产品后,及时更改
承诺履行状态	全部履行
承诺受理单位	西峡县市场监督管理局
承诺作出日期	2023-01-14
承诺编码	41132320230114009652
承诺类型	审批替代型
承诺事由	自愿作出承诺

第60条

承诺受理单位统一社会信用 代码	11411323006052792J	
承诺内容	严格依法开展生产经营活动,建立健全并严格落实安全生产责任制度,确保职工生命健 康安全。	
承诺履行状态	全部履行	
承诺受理单位	南阳市西峡县市场监督管理局	
承诺作出日期	2022-07-12	
承诺编码	41132320220712M00912	
承诺类型	主动型	
承诺事由	主动型,自愿作出承诺	

第61条

承诺受理单位统一社会信用 代码	11411323006051984U	
承诺内容	严格按照疫情防控要求,做好来访人员登记等工作。	国 用用中国(2017)
承诺履行状态	全部履行	
承诺受理单位	西峡县卫生健康委员会	

第33页,共52页



承诺作出日期	2023-05-12
承诺编码	41132320230512000912
承诺类型	主动型
承诺事由	主动型,自愿作出承诺

第62条

承诺受理单位统一社会信用 代码	11411323006052792J	
承诺内容	遵守法律法规,诚信经营,确保产品质量	10000000000000000000000000000000000000
承诺履行状态	全部履行	
承诺受理单位	西峡县市场监督管理局	- 個用中国(1975)
承诺作出日期	2023-01-10	
承诺编码	41132320230110001162	
承诺类型	主动型	
承诺事由	主动型,自愿作出承诺	

第63条

承诺受理单位统一社会信用 代码	11411323MB15367040
承诺内容	主动接受应急管理部门的监管,自愿接受依法开展的日常检查并严格执行执法指令。
承诺履行状态	全部履行
承诺受理单位	西峡县应急管理局
承诺作出日期	2023-06-10
承诺编码	41132320230610004204

第34页,共52页



承诺类型	主动型	R and and	国际中国 加州
承诺事由	主动型,自愿作出承诺		

第64条

承诺受理单位统一社会信用 代码	11411323006051984U	
承诺内容	严格按照疫情防控要求,做好来访人员登记等工作	E.
承诺履行状态	全部履行	THE WILLIAM
承诺受理单位	西峡县卫生健康委员会	
承诺作出日期	2022-05-12	编版作用图像 中
承诺编码	41132320220512M00912	
承诺类型	主动型	d was
承诺事由	主动型,自愿作出承诺	AND THE PROPERTY OF THE PARTY O

第65条

承诺受理单位统一社会信用 代码	11411323006051984U		
承诺内容	疫情防控		
承诺履行状态	全部履行	阿爾伊斯斯 拉	"中国"的
承诺受理单位	西峡县卫生健康委员会		
承诺作出日期	2023-01-02		
承诺编码	41132320230102M00912	THE PROPERTY OF	BE REPERMENT
承诺类型	主动型		
承诺事由	主动型,自愿作出承诺	of Management	· 信用用用:

第66条

第35页,共52页



承诺受理单位统一社会信用 代码	114113230060528801	
承诺内容	严格遵守环保法规,贯彻落实环境保护政策	
承诺履行状态	全部履行	
承诺受理单位	南阳市生态环境局西峡分局	
承诺作出日期	2023-06-20	
承诺编码	41132320230620001060	
承诺类型	主动型	
承诺事由	主动作出承诺	

第67条

承诺受理单位统一社会信用 代码	11411323006052792J	
承诺内容	遵守商业道德,承担社会责任	
承诺履行状态	全部履行	
承诺受理单位	西峡县市场监督管理局	
承诺作出日期	2023-01-10	
承诺编码	41132320230110022262	
承诺类型	主动型	
承诺事由	主动型,自愿作出承诺	

第68条

承诺受理单位统一社会信用 代码	11411323MB15367040
--------------------	--------------------

第36页,共52页





承诺内容	1. 严格遵守法律、法规和规章,积极落实企生产工作,不断提升企业安全生产本质水平。企业健康有序发展。2. 提供给应急管理部门修改、虚假成份,并对所提供资料的真实性健全并严格落实安全生产责任制度,确保职的监管,自愿接受依法开展的日常检查并严格	,努力塑造企业诚实守信的良好形象,促进的所有资料均合法、真实、有效,无伪造、负责。3. 严格依法开展生产经营活动,建立工生命健康安全。4. 主动接受应急管理部门
承诺履行状态	全部履行	M WELLER
承诺受理单位	西峡县应急管理局	
承诺作出日期	2022-07-14	and an
承诺编码	41132320220714572026	
承诺类型	主动型	
承诺事由	主动型,自愿作出承诺	1000年

第69条

承诺受理单位统一社会信用 代码	11411323MB15367040
承诺内容	1. 严格遵守法律、法规和规章,积极落实企业安全生产主体责任,扎实有效地开展安全生产工作,不断提升企业安全生产本质水平,努力塑造企业诚实守信的良好形象,促进企业健康有序发展。2. 提供给应急管理部门的所有资料均合法、真实、有效,无伪造、修改、虚假成份,并对所提供资料的真实性负责。3. 严格依法开展生产经营活动,建立健全并严格落实安全生产责任制度,确保职工生命健康安全。4. 主动接受应急管理部门的监管,自愿接受依法开展的日常检查并严格执行执法指令。
承诺履行状态	全部履行
承诺受理单位	西峡县应急管理局
承诺作出日期	2022-07-18
承诺编码	41132320220718581365
承诺类型	主动型
承诺事由	主动型,自愿作出承诺

第37页,共52页



第70条

承诺受理单位统一社会信用 代码	11411323419285009B		
承诺内容	依法保护自然资源。		
承诺履行状态	全部履行		e de la
承诺受理单位	西峡县自然资源局		
承诺作出日期	2023-03-10		
承诺编码	41132320230310001357	個用中国的學	(EL GEORGE CONTE
承诺类型	主动型		
承诺事由	主动型,自愿作出承诺	in the second	

第71条

承诺受理单位统一社会信用 代码	11411323006052899X	
承诺内容	关于守法诚信经营的承诺	
承诺履行状态	全部履行	
承诺受理单位	西峡县人力资源和社会保障局	II W. F.
承诺作出日期	2023-06-14	
承诺编码	41132320230614000932	
承诺类型	主动型	
承诺事由	主动承诺	

第72条

承诺受理单位统一社会信用 代码	11411323006051941E		
承诺内容	构建网络诚信"诚信经营	and the second second	

第38页,共52页



承诺履行状态	全部履行	
承诺受理单位	西峡县公安局	
承诺作出日期	2023-05-10	
承诺编码	41132320230510043752	
承诺类型	主动型。中国的特别,但是中国的特别,但是中国的特别,但是中国的特别,但是中国的特别,但是中国的特别,但是中国的特别,但是中国的特别,但是中国的特别,但是中国的特别,但是中国的特别,但是中国的特别,但是中国的特别,但是中国的特别,但是中国的特别,但是中国的特别,但是中国的特别,但是中国的特别,但是中国的特别,但是他们是一种国际的特别,但是他们们可以是一种国际的特别,但是他们们们可以是一种国际的特别,但是他们们们们可以使用一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种	
承诺事由	主动型,自愿作出承诺	

第73条

承诺受理单位统一社会信用 代码	11411323006052864B	
承诺内容	承诺节约用水,节约社会资源。	
承诺履行状态	全部履行	AR www.m.
承诺受理单位	西峡县住房和城乡建设局	
承诺作出日期	2023-04-12	west mit
承诺编码	41132320230412029190	
承诺类型	主动型	
承诺事由	主动作出承诺	国际中国

第74条

承诺受理单位统一社会信用 代码	11411323MB19515617	
承诺内容	依法履行纳税义务	
承诺履行状态	全部履行	No. of the last of
承诺受理单位	国家税务总局西峡县税务局	A winger
承诺作出日期	2022-03-15	

第39页,共52页



承诺编码	41132320220315M00912
承诺类型	主动型
承诺事由	主动承诺

第75条

承诺受理单位统一社会信用代码	11411323MB15367040
承诺内容	1. 严格遵守法律、法规和规章,积极落实企业安全生产主体责任,扎实有效地开展安全生产工作,不断提升企业安全生产本质水平,努力塑造企业诚实守信的良好形象,促进企业健康有序发展。2. 提供给应急管理部门的所有资料均合法、真实、有效,无伪造、修改、虚假成份,并对所提供资料的真实性负责。3. 严格依法开展生产经营活动,建立健全并严格落实安全生产责任制度,确保职工生命健康安全。4. 主动接受应急管理部门的监管,自愿接受依法开展的日常检查并严格执行执法指令。
承诺履行状态	全部履行
承诺受理单位	西峡县应急管理局
承诺作出日期	2022-07-12
承诺编码	41132320220712562687
承诺类型	主动型
承诺事由	主动型,自愿作出承诺

第76条

承诺受理单位统一社会信用 代码	11411323MB15367040
承诺内容	1. 严格遵守法律、法规和规章,积极落实企业安全生产主体责任,扎实有效地开展安全生产工作,不断提升企业安全生产本质水平,努力塑造企业诚实守信的良好形象,促进企业健康有序发展。2. 提供给应急管理部门的所有资料均合法、真实、有效,无伪造、修改、虚假成份,并对所提供资料的真实性负责。3. 严格依法开展生产经营活动,建立健全并严格落实安全生产责任制度,确保职工生命健康安全。4. 主动接受应急管理部门的监管,自愿接受依法开展的日常检查并严格执行执法指令。
承诺履行状态	全部履行

第40页, 共52页



承诺受理单位	西峡县应急管理局		
承诺作出日期	2022-07-08		
承诺编码	41132320220708553348	THE PARTY OF THE P	The management of the second
承诺类型	主动型		THE WAS IN SOME
承诺事由	主动型,自愿作出承诺		

第77条

承诺受理单位统一社会信用 代码	114113230060528801	
承诺内容	自觉履行保护环境的义务	101
承诺履行状态	全部履行	
承诺受理单位	南阳市生态环境局西峡分局	
承诺作出日期	2023-02-15	
承诺编码	41132320230215A00912	
承诺类型	主动型。自然以外,是自由自然的,是自由自然的。	12/
承诺事由	主动型,自愿作出承诺	

第78条

承诺受理单位统一社会信用 代码	11411323MB15367040
承诺内容	严格遵守法律、法规和规章,积极落实企业安全生产主体责任,扎实有效地开展安全生产工作,不断提升企业安全生产本质水平,努力塑造企业诚实守信的良好形象,促进企业健康有序发展。
承诺履行状态	全部履行
承诺受理单位	西峡县应急管理局
承诺作出日期	2023-01-10

第41页,共52页



承诺编码	41132320230110007881	
承诺类型	主动型	
承诺事由	主动型,自愿作出承诺	

第79条

承诺受理单位统一社会信用 代码	114113230060528801	
承诺内容	依法保护区域内环境卫生	
承诺履行状态	全部履行	
承诺受理单位	南阳市生态环境局西峡分局	
承诺作出日期	2023-05-10	
承诺编码	41132320230510044377	
承诺类型	主动型	
承诺事由	主动型,自愿作出承诺	

第80条

承诺受理单位统一社会信用 代码	11411323MB15367040	
承诺内容	1. 严格遵守法律、法规和规章,积极落实企业安全生产主体责任,扎实有效地开展生产工作,不断提升企业安全生产本质水平,努力塑造企业诚实守信的良好形象,企业健康有序发展。2. 提供给应急管理部门的所有资料均合法、真实、有效,无价修改、虚假成份,并对所提供资料的真实性负责。3. 严格依法开展生产经营活动,健全并严格落实安全生产责任制度,确保职工生命健康安全。4. 主动接受应急管理的监管,自愿接受依法开展的日常检查并严格执行执法指令。	
承诺履行状态	全部履行	
承诺受理单位	西峡县应急管理局	
承诺作出日期	2022-06-30	

第42页,共52页



承诺编码	41132320220630525331	
承诺类型	主动型	(1) (1) (1) (1)
承诺事由	主动型,自愿作出承诺	

第81条

承诺受理单位统一社会信用 代码	11411323006051984U		
承诺内容	工人员,实行从严管控。如发	现可疑病例,及时报告相 返工人员登记管理,严密	对来自或去过疫情重点地区的返 关信息,协助做好医学观察、隔 关注其健康状况,确保"早发现 卫生防疫部门留存。
承诺履行状态	全部履行	A BENTALLING ST	AND THE PARTY OF T
承诺受理单位	西峡县卫生健康委员会		25 May 11
承诺作出日期	2022-06-28		
承诺编码	41132320220628515992	Range Mark	福田 (南南中国(1974)
承诺类型	主动型		
承诺事由	主动型,自愿作出承诺	dimila	e of Million

第82条

承诺受理单位统一社会信用 代码	11411323MB19515617	
承诺内容	关于依法履行纳税义务的承诺	
承诺履行状态	全部履行	
承诺受理单位	国家税务总局西峡县税务局	M.P
承诺作出日期	2023-01-25	
承诺编码	41132320230125M00912	

第43页,共52页



承诺类型	主动型	
承诺事由	主动型,自愿作出承诺	

第83条

承诺受理单位统一社会信用 代码	114113230060528801	
承诺内容	承诺申报项目时进行环评	
承诺履行状态	全部履行	
承诺受理单位	南阳市生态环境局西峡分局	THE WALLES
承诺作出日期	2023-06-20	
承诺编码	41132320230620028893	
承诺类型	主动型	
承诺事由	主动作出承诺	

第84条

承诺受理单位统一社会信用 代码	11411323006052792J
承诺内容	本单位(人)已认真学习了相关法律法规规章和规范性文件,了解了该项行政许可的有要求,对有关规定的内容已经知晓和全面理解,承诺自身能够满足办理该事项的条件、标准技术要求。
承诺履行状态	全部履行
承诺受理单位	西峡县市场监督管理局
承诺作出日期	2023-01-16
承诺编码	41132320230116002074
承诺类型	审批替代型
承诺事由	自愿作出承诺

第44页,共52页



第85条

承诺受理单位统一社会信用 代码	11411323006052792J
承诺内容	切实保证产品质量,维护消费者的合法权益
承诺履行状态	全部履行
承诺受理单位	西峡县市场监督管理局
承诺作出日期	2023-02-16
承诺编码	41132320230216001164
承诺类型	主动型
承诺事由	自愿作出承诺

第86条

承诺受理单位统一社会信用 代码	11411323MB19515617
承诺内容	承诺依法按照规定的期限申报办理税务登记、变更或者注销登记。
承诺履行状态	全部履行
承诺受理单位	国家税务总局西峡县税务局
承诺作出日期	2023-04-12
承诺编码	41132320230412001676
承诺类型	主动型。自然从外面的自然从外面的自然从外面的自然从外面的自然从外面的自然从外面的自然从外面的自然从中的自然从外面的自然从中的自然从中的自然从中的自然从中的自然从中的自然从中的自然从中的自然从中
承诺事由	主动作出承诺

第87条

承诺受理单位统一社会信用 代码	11411323MB15367040	(I) POPEN
		经期的

第45页, 共52页



承诺内容	严格依法开展生产经营活动,建立健全并严格落实安全生产责任制度,确保职工生命 康安全。
承诺履行状态	全部履行
承诺受理单位	西峡县应急管理局
承诺作出日期	2022-04-11
承诺编码	41132320220411M00912
承诺类型	主动型
承诺事由	主动型,自愿作出承诺

第88条

承诺受理单位统一社会信用 代码	11411323006051984U		The state of the s
承诺内容	工人员,实行从严管控。如发	现可疑病例,及时报告相 返工人员登记管理,严密	对来自或去过疫情重点地区的返 目关信息,协助做好医学观察、隔 所关注其健康状况,确保"早发现 1卫生防疫部门留存。
承诺履行状态	全部履行	M. GREEN	M. WALLEY
承诺受理单位	西峡县卫生健康委员会		
承诺作出日期	2022-06-20	一种用中国研究	and the first of the same of t
承诺编码	41132320220620478636		
承诺类型	主动型		54
承诺事由	主动型,自愿作出承诺	面面思想	1000年9月

第89条

承诺受理单位统一社会信用 代码	11411323737439886W
承诺内容	对所提供的项目备案资料合法性、真实性、准确性等。

第46页, 共52页



承诺履行状态	全部履行	
承诺受理单位	西峡县发展和改革委员会	
承诺作出日期	2023-05-10	
承诺编码	41132320230510001175	
承诺类型	主动型	
承诺事由	主动承诺	

第90条

承诺受理单位统一社会信用 代码	11411323419285009B	
承诺内容	依法保护自然资源。	
承诺履行状态	全部履行	
承诺受理单位	西峡县自然资源局	ROPEN TO SERVICE STATE OF THE PERSON OF THE
承诺作出日期	2023-06-11	
承诺编码	41132320230611000912	Hut Ellistes
承诺类型	主动型	
承诺事由	主动型,自愿作出承诺	

第91条

承诺受理单位统一社会信用 代码	11411323006052354X	
承诺内容	承诺爱护林木,积极种植,为改善生态环境做贡献	
承诺履行状态	全部履行	
承诺受理单位	西峡县林业局	
承诺作出日期	2023-04-12	

第47页, 共52页



承诺编码	41132320230412038529
承诺类型	主动型
承诺事由	主动作出承诺

第92条

承诺受理单位统一社会信用 代码	124113237967999027	
承诺内容	承诺响应政府号召,净化城市环境,做文明市民	BUNE
承诺履行状态	全部履行	
承诺受理单位	西峡县城市管理局(西峡县城市综合执法局)	entri (e)
承诺作出日期	2023-06-25	
承诺编码	41132320230625048072	
承诺类型	主动型。由于以外,	illing by
承诺事由	主动作出承诺	

第93条

承诺受理单位统一社会信用 代码	11411323006051984U
承诺内容	1. 严格按照国家、省市相关规定,落实企业主体责任,对来自或去过疫情重点地区的返工人员,实行从严管控。如发现可疑病例,及时报告相关信息,协助做好医学观察、隔离等措施。2. 全面加强复工后返工人员登记管理,严密关注其健康状况,确保"早发现、早报告、早隔离、早处置"。3. 本承诺书交由所在地卫生防疫部门留存。
承诺履行状态	全部履行
承诺受理单位	西峡县卫生健康委员会
承诺作出日期	2022-06-26
承诺编码	41132320220626506653

第48页, 共52页



承诺类型	主动型	
承诺事由	主动型,自愿作出承诺	AN MARCHINA

第94条

承诺受理单位统一社会信用代码	11411323006052194N	
承诺内容	节约用水,杜绝浪费	
承诺履行状态	全部履行	diminit
承诺受理单位	西峡县水利局	
承诺作出日期	2023-04-10	
承诺编码	41132320230410001300	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
承诺类型	主动型	
承诺事由	主动型,自愿作出承诺	Hame

第95条

承诺受理单位统一社会信用 代码	11411323MB19742103	
承诺内容	依法缴纳职工医保费用	
承诺履行状态	全部履行	
承诺受理单位	西峡县医疗保障局	一种中国的 的
承诺作出日期	2023-01-10	
承诺编码	41132320230110008638	
承诺类型	主动型	THE CHARLES
承诺事由	主动型,自愿作出承诺	

第96条

第49页, 共52页



承诺受理单位统一社会信用 代码	11411323737439886W	
承诺内容	承诺规定时间内提交证明材料	(In the later)
承诺履行状态	全部履行	
承诺受理单位	西峡县发展和改革委员会	in the little state of the stat
承诺作出日期	2023-06-05	
承诺编码	41132320230605046562	
承诺类型	证明事项型	信用中国
承诺事由	证明事项型,申请办理河南省企业投资项目备案证明	

第97条

承诺受理单位统一社会信用 代码	11411323006051984U	
承诺内容	严格按照疫情防控要求,做好来访人员登记	等工作。
承诺履行状态	全部履行	THE WILLIAM
承诺受理单位	西峡县卫生健康委员会	
承诺作出日期	2022-01-12	MAN WINDS
承诺编码	41132320220112M00912	
承诺类型	主动型	161 _{MI}
承诺事由	主动型,自愿作出承诺	## (Birl.):20

第98条

承诺受理单位统一社会信用 代码	114113230060519761	
承诺内容	共同维护诚信体系,维护良好市场环境	
承诺履行状态	全部履行。	

第50页,共52页



承诺受理单位	西峡县民政局
承诺作出日期	2022-07-11
承诺编码	41132320220711M00912
承诺类型	行业自律型
承诺事由	行业自律型

第99条

承诺受理单位统一社会信用 代码	11411323MB15367040		
承诺内容	生产工作,不断提升企业全企业健康有序发展。2. 提作修改、虚假成份,并对所打	安全生产本质水平,努力。 供给应急管理部门的所有。 提供资料的真实性负责。 责任制度,确保职工生命	生产主体责任,扎实有效地开展安全塑造企业诚实守信的良好形象,促进资料均合法、真实、有效,无伪造、3.严格依法开展生产经营活动,建立健康安全。4.主动接受应急管理部门执法指令。
承诺履行状态	全部履行	BR GRANNING.	THE REPORT OF THE PARTY OF THE
承诺受理单位	西峡县应急管理局		
承诺作出日期	2022-07-04	推图中国研节	(中国(N)P
承诺编码	41132320220704534670		
承诺类型	主动型		
承诺事由	主动型,自愿作出承诺	AND THE PROPERTY OF THE PARTY O	(1) (1) (1) (1)

第100条

承诺受理单位统一社会信用 代码	12411323419290270J	THE OWNER WHEN
承诺内容	创建文明城市	

第51页,共52页



承诺履行状态	全部履行	
承诺受理单位	西峡县市容环卫中心	
承诺作出日期	2023-06-13	(d)()
承诺编码	41132320230613001047	
承诺类型	主动型	
承诺事由	主动作出承诺	(1) (1) (1) (1) (1)

七、信用评价信息(共0条)

截至出具本报告时间,河南省信用信息平台暂未查询到相关记录

八、司法判决及执行信息(共0条)

截至出具本报告时间,河南省信用信息平台暂未查询到相关记录

九、其他信息(共0条)

截至出具本报告时间,河南省信用信息平台暂未查询到相关记录

十、信用状况提升建议

建议秉持诚信理念, 合法有序开展经营活动

十一、地方信用网站公共信用信息报告补充内容

截至出具本报告时间,河南省信用信息平台暂未查询到相关记录

结束

第52页, 共52页

5.4 无行贿犯罪记录承诺函

现向__西峡县交通运输局_(招标人名称)郑重承诺:

我方承诺本单位<u>南阳华岳路桥工程有限公司</u>及法定代表人<u>刘溪洋</u>(姓名)、委托代理人<u>张职杨</u>(姓名)、项目经理<u>张职杨</u>(姓名),近三年内无行贿犯罪记录,一经查实有行贿犯罪记录,自愿放弃中标资格。

特此承诺!

投标人(电子签章): 南阳华岳路桥工程有限公司
法定代表人(电子签名):
年9月10日

6 本次招标不是联合体投标承诺

我公司现自愿就参加本项目工程投标有关事项向招标人郑重承诺如下:

我公司在本次投标工程中为独立投标,非联合体投标单位,且若我公司有幸中标,不会对项目进行分包、转包。

本企业对上述声明的真实性负责。如有虚假,将依法承担相应责任。

投标人(电子签章):_	南阳华岳路桥工程有限公司	
法定代表人(电子签名):		
2025 年 9 月	10 日	

7 投标人所有资料无虚假、无隐瞒承诺书

本公司郑重承诺,我公司在投标文件及诚信库中提供的资质证件、人员证件、 业绩及其它证书证件均真实有效。若一经发现证书、业绩等为虚假信息,我公司 愿意接受建设主管部门及其他有关部门依据有关法律法规给予的处罚。 特此承诺!

投标人(电子签章):	南阳华岳路桥工程有限公司
法定代表人(电子签名	名):
2025 年 9 月	10 ⊟

8 具备履行合同所必须的设备和专业能力的声明

我公司声明: 我公司满足第一标段资质要求, 具备以下内容:

- ①投标人具有公路工程施工总承包叁级及以上资质,具有有效的安全生产许可证。并在人员、设备、资金、信誉等方面具备相应能力;
- ②投标人拟派项目经理须具有公路工程专业贰级(或以上)注册建造师资格, 并具备有效的安全生产考核合格证,且未担任其他在建项目的项目经理,并出具 无在建承诺函;投标人拟派项目总工程师具备中级及以上职称;

如有虚假,将依法承担相应责任。

特此声明!

投标人(电子签章): 南阳华岳路桥工程有限公司
法定代表人(电子签名):

(五) 正在施工和新承接的项目情况表

项目名称	/
项目所在地	/
发包人名称	/
发包人地址	/
发包人电话	/
签约合同价	/
开工日期	/
计划交工日期	/
承担的工作	/
工程质量要求	/
项目经理	/
项目总工	/
总监理工程师及电话	/
项目描述	/
备注	/

注: 1、每张表格只填写一个项目,并标明序号。

^{2、}本表后应附中标通知书和(或)合同协议书复印件。

(六) 近年发生的诉讼及仲裁情况

项目	投标人情况说明
/	/

(七) 拟委任的其他人员资历表

姓名	别萧萧	年龄	31岁		专业	建筑工程技术				
技术职称	助工	工 学 历 专科 拟在本标段任职				合同工程师				
工作年限		8年		类似	施工经验年限	8年				
毕业学校	2016_年_6	6_年 <u>6</u> 月毕业于年毕业于 开封大学 学校 建筑工程技术 专业, 学制 <u>3</u> 年								
时间	参加)	参加过的类似工程项目名称 担任职务 话								
2024. 8. 15- 2024. 12. 15	- 西峡县2024年	年农村公路材 标段(施工		合同工程师	西峡县交通运输 局0377-69663492					
获奖情										
说明在制	□目	前虽在其他	项目上任	职,但	本项目中标后	计划科日常工作。 :能够从该项目撤 立:				
说明在岗情况 离,目前任职项目: ,担任职位: 。 备 注										

注: 本表后附相关证件





证书编号: Y0412401000901098

住房和城乡建设领域专业技术管理人员职业培训合格证

姓名: 别萧萧

性别:男

身份证号: 411330199402090030

岗位名称:预算员

工作单位:南阳华岳路桥工程有限公司

证书有效期:2026年05月31日



本证书由河南省建设教育协会核发, 持证人已经通过考核,成绩合格。



实时数据, 扫码验证

发证机构:河南省建设教育协会

培训机构:河南华中职业技能培训学

发证日期: 2024年05月81日

查询网址: www. hneen. ne

(七) 拟委任的其他人员资历表

姓	名	李明	星	年	龄	35岁	专	业	会计学
 技术 	:职称	中级会	计师	学	历	本科	拟在本	、 标段工程任职	财务负责人
工作	工作年限 12年						类似	施工经验年限	10年
毕业	学校	201	<u>3</u> 年 <u>6</u>		半业于	郑州大学	学校	会计学 专业,	学制 4 年
					4	<u> </u>	历		
时	间	į ,	加过的	类似	工程:	项目名称		担任职务	发包人及联系 电话
	8. 15– 12. 15				公路材施工	f梁建设项 标)	目第一	财务负责人	西峡县交通运 输局 0377-69663492
	获奖情	況							
说	明在岗		□目ⅰ	前虽不	生其作				<u>材务科日常工作</u> 。 后能够从该项目 : 。
备		注							

注: 本表后附相关证件





(七) 拟委任的其他人员资历表

姓	名	符家源	年	龄	27岁	专	业	道路桥梁工程 技术	
技术国	职称	助理工程师	学	历	专科	拟在本标段工程任 职		测量工程师	
工作公	年限		5年			类似	施工经验年限	5年	
毕业	学校	2020年6月毕	业于 <u>?</u>	<u>E</u> 学校 <u>道路</u> _年	各桥梁工程技术				
时	间	参加过口	担任职务	发包人及联系 电话					
2024. 8 2024. 1			在村公路桥梁建设项目第一 际段(施工标)				测量工程师	西峡县交通运 输局 0377-69663492	
	获奖	作况							
说明在岗情况		□目前	前虽在	E其他项目	上任耳	,现从事工作 <i>;</i> 识,但本项目 [。] 	中标后能够从该		
备		注							

注: 本表后附相关证件





证书编号: Y0412400800900701

住房和城乡建设领域专业技术管理人员职业培训合格证

姓名:符家源

性别:男

身份证号:411330199708101134

岗位名称:测量员

工作单位:南阳华岳路桥工程有限公司

证书有效期:2026年05月31日



本证书由河南省建设教育协会核发, 持证人已经通过考核,成绩合格。



实时数据, 扫码验证

发证机构:河南省建设教育协会

培训机构:河南华中职业技能培训学

发证日期: 2024年05月31日

查询网址: www. hneen. ne

(七) 拟委任的其他人员资历表

姓	名	杜伟刚	年	龄	37岁	专	业		建筑工程技术	
技术	职称	工程师	学	历	专科	拟在本标	示段工程 职	任	试验检测负责 人	
工作	年限		17年	Ē		类似施工	二 经验年	限	15年	
毕业	′学校	<u>2021</u> 年 <u>6</u> 月毕	≨业于]	南阳师	币范学院 学 ——	按 <u>建筑工程技术</u> 专业,学制 <u>2</u> 年				
· 经 历										
时	间	参加过的	类似コ	【程项	巨名称	担任耳	包人及联系电话			
	8. 15– 12. 15					测量工	程师	西峡县交通运输局 0377-69663492		
	获奖	2情况								
	说明在	E岗情况	☑目前未在其他项目上任职,现从事工作						中标后能够从该	
备	r	注								

注: 本表后附相关证件



中华人民共和国 居民身份证

签发机关 西峡县公安局

有效期限 2017.04.25-2037.04.25

姓名 杜伟刚

性别 男 民族汉

出生 1988 年 8 月 6 日

住 址 河南省西峡县五里桥镇五



公民身份号码 411330198808062035

从事专业道路与桥梁工程 取得职称名称工程师 取得职称级别中级 取得方式评审 评审组织南阳市工程系列交通运输专业中(认定部门)

评审(认定) 2023.03 通过时间

发证单位



1988.08 出生年月

河南省中州公路工程有限公司 工作单位

C202209B6132307400051

2023 05 05 年 月 日

(七) 拟委任的其他人员资历表

	_									
姓名	曹广	兴	年	龄	44岁	Ą	₽ 7	lk.	市场营销	
技术职称	助工	-	学	历	专科	拟	在本标段工 任职	.程	质检工程师	
工作年限			204	年		类	似施工经验 限	20年		
毕业学校	2003年_	<u>7</u> 月与	毕业-	于河南	阿工业技术学 制 <u> </u>	院 3 3 年	学校 市场	营销	肖 专业,学	
时间	参	加过的	的类侧	以工程	呈项目名称		担任职务		发包人及联系电 话	
2024. 8. 15– 2024. 12. 15				公路材 施工 ⁷	F梁建设项目第 标)		测量工程》	11 1	西峡县交通运输 局0377-69663492	
获奖情	获奖情况									
说明在岗情况		□目前	か 虽る	在其何		1, 化	旦本项目中	标儿	<u>实验科日常工作</u> 。 后能够从该项目 :: 。	
备	注									

注: 本表后附相关证件





证书编码: 0412410900020000062

住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训合格证



姓 名: 曹广兴

身份证号: 41133019810710153X

岗位名称: 市政工程质量员

参加住房和城乡建设领域施工现场 专业人员职业培训,测试成绩合格。



扫码验证

培训机构: 漯河市德众建设工程技术培训中心

发证时间: 2024年06月12日

查询地址: http://rcgz.mohurd.gov.cn

(七) 拟委任的其他人员资历表

姓名	新志弘	年	龄	44岁	专	业	建筑施工与管理
技术职利	か 助工	学	历	专科	拟在本标 任 []]		专职安全员
工作年降	Į.	22年			类似施工经验年 限		20年
毕业学校	交 2016年6	月毕业于	国家开	<u>F放大学</u> 学校	建筑施工	<u>与管理</u>	专业,学制 <u>2</u> 年
			4	준 历			
时间	时 间 参加过的类似工程项目名称 担任职务 发包人及联系电						包人及联系电话
2024. 8. 1 2024. 12.			4年农村公路桥梁建设项目第 一标段(施工标) 测量工程则			末星 川山 📗	 峡县交通运输局
获当	奖情况						
说明福	车岗情况	□目前鱼	且在其		只,但本项	目中标	安全科日常工作。 后能够从该项目 ī:
备注							

注: 本表后附相关证件





姓名:靳志强

性别:

眠

出生年月: 1981-12-10

经公路水运工程施工企业主要负责人和安全生产管理人员安全生产考核 身份证号: 41133019811270003%

合格,特发此证。

企业名称:南阳华岳路桥工程有限公司

证书编号:豫交安C22G00313

2022-02-24 有效期:

河南省交通运输厅

考核部门:

KH

2028-02-24

中华人民共和国交通运输部监制

Jtgc.hncd.cn/QY/DYZSIGR_DYZS.asp?UserID=20230821102250724889468CertificateId=4100002025022018071999141740

八、其他资料

承诺书(一)

我方在此承诺,我方拟派往<u>西峡县交通运输局2025年农村公路桥梁改建(造)项目</u>(项目名称)<u>E4113231323000094</u>(项目编号)的项目经理<u>张职杨</u>(项目经理姓名)现阶段没有担任任何在建建设工程项目的项目经理,一旦查出自愿放弃中标资格。

我方保证上述信息的真实和准确,并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。 特此承诺

投标人(电子签章):	南阳华岳路桥工程有限公司	
法定代表人(电子签	名):	
2025 年 9 月	10 日	

承诺书(二)

我单位承诺:

在<u>西峡县交通运输局2025年农村公路桥梁改建(造)项目</u>(投标项目名称)招标活动中, 我单位保证做到:

- 一、在投标期间及中标公示期间内我单位无被列入失信被执行人、重大税收违法案件 当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
- 二、若出现被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单,我单位承诺不再参与此项目的投标,若中标则中标无效。

投标人(电子签章): 南阳华岳路桥工程有限公司
法定代表人(电子签名):
2025 年 9 月 10 日

附:.按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库(2016) 125号)的要求,对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人,拒绝参与本项目招标。投标人需提供规范的信用报告和《无行贿犯罪记录承诺函》,信用报告应通过"信用中国"网站(www.creditchina.gov.cn)下载。在河南省注册的市场主体仅需提供规范的《无违法违规记录证明版专项信用报告》,无需提供《无行贿犯罪记录承诺函》,专项信用报告应通过"信用河南"网站(https://credit.henan.gov.cn)下载。上述信用报告的生成日期为本项目递交投标文件截止时间前10日内。

承诺书(三)

现向 西峡县交通运输局 (招标人名称)郑重承诺:

我方承诺本单位及法定代表人<u>刘溪洋</u>(姓名)、委托代理人<u>张职杨</u>(姓名)、项目经理<u>张职杨</u>(姓名),近三年内无行贿犯罪记录,一经查实有行贿犯罪记录,自愿放弃中标资格。

特此承诺!

投标人(电子签章):	南阳华岳路桥工程有限公司
法定代表人(电子签名	乞).
拉及八亿八位了业人	ш/·
0005 年 0 日	10 П
2025年9月_	

承诺书(四)

工程质量保证信用承诺书

致 (采购人或采购代理机构): 西峡县交通运输局

单位名称(自然人姓名):南阳华岳路桥工程有限公司

统一社会信用代码(身份证号码): 91411323MA3XARWX4L

法定代表人(负责人): 刘溪洋

联系地址和电话: 西峡县五里桥镇工业大道中段东侧 13525119056

为保证工程建设质量,树立诚实守信的政府采购供应商形象,我单位(本人)自愿做出以下承诺:

- 一、如中标(成交)成为本项目的供应商,我单位(本人)保证对项目承担工程质量终身责任,由我单位(本人)原因造成的工程质量缺陷,我单位(本人)负责维修,并承担鉴定、维修费用以及损失赔偿费用。
- 二、如拒不履行质量保修责任,自愿按照规定将违背承诺行为作为失信行为记录到社会信用信息平台,并同意依照国家、省、市、县有关规定由有关部门依法依规处理。

供应商(印章):南阳华岳路桥工程有限公司

法定代表人、负责人、本人、或授权代表(签字或印章):

日期: 2025 年 9 月 10 日

注:投标人的法定代表人或者授权代表的签字或盖章应真实、有效,如由授权代表签字或盖章的,应提供"法定代表人授权书"。

承诺书(五)

关于农民工工资的承诺书

投标人需承诺遵守《保障农民工工资支付条例》,且未被列入尚在执行期的拖欠农民工工资黑名单(由投标人出具承诺,格式自拟)。

我公司郑重承诺如下:

为了保证民工的合法权益,保障民工工资,本公司郑重承诺在建各种项目合同工程,严格按照国家规定、合同要求支付民工工资,保障民工工资,现承诺如下:

- 1、严格遵守国家和地方关于民工工资的有关规定。
- 2、 按照《劳动法》规定雇佣和使用民工,工资将及时如数发给民工。
- 3、 我公司劳务班组雇佣民工的将要求各班组按照规定签订用工合同,并负责督促其按照合同规定及时结付民工工资。
 - 4、按照劳动法规定雇佣和使用民工工资将直接发放给民工本人,严禁发放给包工头。
- 5、 我公司对民工工资的支付负直接责任,全面负责与之形成劳务关系的民工的用工 管理。
- 6、 我公司在民工进场后7日内建立进场民工花名册,其中包含进场民工个人详细信息、进场时间、从事工种、所在班组等资料,随册附进场民工身份证,劳动合同、技术专业证书等相关材料,随时掌握进场民工的数量。我公司项目负责人直接管理施工现场的民工,不得通过包工头、带班长等代管。
- 7、 我公司民工工资的支付工作接受建设单位监督管理,双方签订的施工合同就民工工资的支付作出约定,我公司按建设单位提供的规范文本签订保障民工工资发放工作的承诺书。 我公司若有违反合同约定中民工工资支付相关条款及承诺书中条款的行为,全部责任由我公司 承担,并按照合同约定的违约条款对建设单位负责。
- 8、 如果发生违反规定拖欠或克扣民工工资行为造成民工上访,本公司愿意接受人力 资源社会保障、建设、公安等部门依照有关规定作出的处罚和决定。

	9,	我公司相关人员积极配合承包方落实保障农民工工资发放的各项工作,	协调各方
面关系,	及时	 按承包方要求送交各项资料。	

投标人(电子签章):	<u>南阳华岳路桥工程有限公司</u>
法定代表人(电子签	名):
2025 年 9 月	10 日

2. 招标文件要求及投标人认为必要的其他材料。

(一) 根据本项目的实际情况结合新技术,新工艺,新材料等展现企业的相应能力。

遵循"科技是第一生产力"的原则,广泛应用新技术、新工艺、新产品、新材料"四新"成果,充分发挥科技在施工生产中的先导、保障作用。为了有效的促进生产力的提高,降低工程成本,减轻工人的操作强度,提高工人的操作水平和工程质量,满足房屋的结构功能和使用功能,在施工中我公司应把先进工艺和施工方法、先进技术应用到工程上去,大力推广新材料、新工艺、新技术;确保标书工期,质量和降低成本。

第一节、从技术上保证进度

- 一、由项目部总工程师全面负责该项目的施工技术管理,项目经理部设置工程技术部,负责制定施工方案,编制施工工艺,及时解决施工中出现的问题,以方案指导施工,防止出现返工现象而影响工期。
- 二、实行图纸会审制度,在工程开工前己由总工程师组织有关技术人员进行设计图纸会审, 并及时向业主和监理工程师提出施工图纸、技术规范和其他技术文件中的错误和不足之处,使 工程能顺利进行。
- 三、采用新技术、新工艺,尽量压缩工序时间,安排好供需衔接,统一调度指挥,使工程有条不紊地进行施工。
 - 四、实行技术交底制度,施工技术人员在施工前认真做好详细的技术交底。
- 五、施工时采用计算机进行网络管理,确保关键线路上的工序按计划进行,若有滞后,立即采取措施予以弥补。计算机的硬件和软件应满足工地管理的需要,符合业主统一的管理的规定。

第二节、采用新技术、新材料、新工艺组织施工生产

- 一、推行全面质量管理,开展群众性的QC小组活动,在施工中制定全面质量管理、工作规划,超前探索和解决施工中的疑难问题,消除质量通病。
 - 二、运用现代化技术设备
 - 工程实施中,将运用高精度的仪器,采用先进的检测手段,控制施工的每个环节。
 - 三、建立完善的技术管理体系

按照实施性施工组织设计确定的施工程序,精心组织流水线平行作业,控制每道工序,狠抓工序衔接,实行施工技术、测量、试验、计量技术资料全过程的标准化管理,做到技术标准、质量标准、管理标准相统一。

四、妥善保管好有关工程进度、质量检验、障碍物拆除以及所有影响本工程的原始记录和照片。

五、按照监理工程师和业主的技术要求,利用人才优势,发挥技术专长,实行规范化、程度化、标准化施工作业,在施工现场树立典型示范作业面,为创造优质工程奠定坚实的技术基础工作。

第三节、新工艺、新技术应用

选用水准仪、经纬仪控制标高与水平,提高计量精度。

- 1、排水管官选用隔音标准不低于同类铸铁管的UPVC管材。
- 2、在砼中掺加一定的外加剂,以改善砼的和易性的和提高砼的耐久性。
- 3、在检查其它工序质量的同时,特别重视对基层质量的检验与验收。
- 4、运用砼的质量控制标准(GB20231226)及砼均方差统计技术,随时控制整个生产、施工期间的砼质量。
- 5、砼的下料新方法:在浇筑竖向结构砼时,当浇筑高度超过2米时,如果砼直接向下倾注, 砼会发生离析现象,严重影响竖向结构的质量。因此,我公司专门为竖向结构超过2米时的砼 浇筑设计了振动溜管使砼下落。该装备使砼下落的高度缩小,重力冲击减轻,保证了竖向结构 砼的质量。
- 6、为提高现场综合管理能力,项目配臵影像设备,在主要工序、重点部位上拍摄过程影像资料,并随工程进度同步收集整理,以确保过程质量。
- 7、信息化施工技术是保证工程质量、施工进度和成本控制的有效工具。对工程质量、进度、技术、材料、安全、资金等目标实行动态控制,把施工过程中发生的有关信息做有序的存储整理,以部门之间、配合单位之间的信息交流为中心,以岗位工作标准为切入点,解决项目部从信息收集、处理到决策等环节的准确性、及时性,为项目部高效优质提供依据。

第四节、新技术、新工艺、新材料、新设备的应用

一、新材料的应用

1、SA沥青碎石混合料

SA是新型的沥青混合材料,其自身具有稳定性强,理论效果佳等优点,在道路施工中有重要的作用,是近些年来应用比较广泛的新材料。该材料主要是利用粗集料之间的空隙,利用空隙的承载力及粗集料之间突出的镶嵌作用,到达防止路面构造出现变形的目的。其次基于SA集料是由沥青材料进展填充的,自身粘结作用比较明显。该材料受气温影响比较小,尤其是在低温情况下,自身粘结力提升,其他物质很难对其造成侵蚀作用。包括:外来杂物、水和油污等物质。在SA材料的限制下,内部空隙比较小,沥青和空气无法完全接触,因此保证路面具有抗老化的性能,自身变形率比较低。道路在施工过程中会存在外表抗滑性能差的情况,增加了车辆行驶的隐患。SA材料的应用,尤其是在雨天,具备良好的防滑性能,提升路面的稳定性和平安性。该材料的应用强化了路面现有的厚实度,提升路面的抗滑性。在压实过程中面会存在较大的孔隙和构造深度,在雾天不会存在突出的水雾,减少了对灯光的反射度。基于SA材料的特殊性,在对粗集料进展搜集的过程中,需要采用机制砂,增强摩擦力度。

2、沥青混合料的应用

沥青混合料是道路施工的重要材料,其中可再生沥青材料需要根据路况,结合材料变化,按照因地制宜的原则,将其应用到理论中。沥青混合料最明显的特点是制止路面出现变形和车辙。该材料的在抗压和抗滑性能比较突出,作为当前利用比较广泛的混合添加剂,该材料的制作工艺比较简单,整体抗压和抗辙性能较为突出。可再生沥青混合料最明显的特征就是可持续开展,由于道路工程体系比较复杂,需要多种材料,因此可再生材料的出现保证材料供应的有序性。该材料的应用需要根据施工阶段、施工程序及施工条件进展适中选择。在施工过程中需要严格按照施工程序的要求,做到一次成功,减少对交通因素的不利影响。由于可再生材料考虑到环境因素的影响,在理论中不会产生有毒的气体。做到循环好再利用的有机统一。

3、微表处稀浆混合料

微表处稀浆混合料是道路施工过程中应用较为广泛的保护性混合料。该物质的外表采用的是石渣、砂浆、多种填充料及聚合物性的沥青材料。需要根据工程管理建立需要,调整材料的配合比,拌合沥青混合料。在材料外表摊铺过程中,需要将厚度控制在合理范围内,大致在0.5-1

左右。其次可以根据实际情况在外表采用稀浆混合料进展快速施工,减少恢复时间。微表处混合料不得和水接触,制止出现积水渗入沥青内部,出现路面损坏的情况。

4、聚苯乙烯泡沫

该材料是由聚苯乙烯树脂中添加发泡剂,利用加热软化的形式逐渐产生气体,进而产生泡沫塑料。由于该材料属于硬质闭孔构造,其使用寿命较长,需要以轻质路基材料为基料,应用到路基施工过程中。由于桥头的差异比较明显,需要根据桥台变化,进展适当的位移。聚苯乙烯泡沫材料需要平铺在路基外表,减少单位路基的承载力,进而对路面起到一定的控制作用。

二、BIM的应用

BIM (Building Information Modeling) 技术在项目策划、运行和维护的全生命周期过程中进行共享和传递,使工程技术人员对各种建筑信息作出正确理解和高效应对,为设计团队以及包括建筑、运营单位在内的各方建设主体提供协同工作的基础,在提高生产效率、节约成本和缩短工期方面发挥重要作用。

1、BIM技术在施工阶段成本管理上的应用

BIM技术引入到施工阶段的成本管理上来,真正实现项目成本全过程管理。施工单位利用BIM可以有效实现自身在工程项目造价管理中的多维控制,可以根据多套标准和评价体系对工程造价的数据进行拆分、组合合理利用。在合约部分利用BIM技术对成本确认,根据与业主签订的合同和各项与业主沟通确认的成本文件进行工程价款的确定,并同时根据相关资料创建相关资料成本类的BIM模型,以确保BIM可以真实合理的表达施工单位与业主相关造价部分的内容,从而与业主进行工程进度款的支付申请和工程造价的结算。

在施工成本部分利用BIM 进行自身成本的有效控制,根据自身施工方案和资料进行施工BIM的创建,同时根据项目实际情况进行模型的动态调整,并根据BIM的数据进行分析统计。确保材料计划的控制、限额领料、施工组织部署、施工产值统计等工作的准确进行。

2、BIM技术在施工阶段成本管理上的优势分析

BIM技术对成本管理将带来重大变革,比如可视化、动态化、系统性等。BIM技术在造价方面的应用优势主要表现在:提高工程量计算的效率,可以将造价工程师从繁重的重复性劳动中解放出来,节省的时间和精力可以用到更具价值的地方;提高工程量计算的准确性,BIM模型

可以给造价人员提供更加客观真实的工程量信息,方便存储和调取,大大提高工作效率,提高施工阶段的成本控制能力,基于BIM技术的碰撞检查,可以确定好预留洞口的位置,避免二次开洞节省项目开支。

(二) 机械设备和试验检测设备配备情况

一、施工机械设备配备计划

根据本工程规模、工期及质量要求,并考虑施工场地及结构特征,结合我公司的机械、 机具、设备等情况,经研究并测算,决定本工程施工机械配备计划。

二、机械设备管理

工程施工中,要认真执行建筑机械使用安全技术规程和施工现场电气安全管理规定,另外还应注意:

- 1、编制施工机械进退场计划。根据工程施工需要,按使用先后组织进场,按施工总平面 图机械设备位置,做好设备基础,就位安装,以满足开工需要。
- 2、重要的机械设备和大型设备,应根据工程的需要进行调度、购置或租赁,其前提是必须满足工程的要求。
- 3、施工中的机械服务于高空与地面,因此,机械操作地点与服务作业面要视线清楚,指挥通讯设备良好,信号统一及时,并要定机、定人、定指挥。夜间有足够的照明,停机时要有可靠的防护措施。
- 4、施工机械必须利用专门设计布线,采用护套电缆线,要按规定分级配电,各级配电装置的容量应与实际负载匹配,其布置、固定、结构形式、盘面布置、系统接线等都要按规范进行,不得乱拖拉电线。
- 5、施工中一切高空的金属架子、机械都要设置防雷和接地装置,接地电阻不得大于10欧姆。
- 6、施工前必须建立本工地的机械电气安全管理规定和各项检查制度,施工期间日夜都应 设有机电值班人员,处理机电事故,非专职人员不得触动机电设备。

(1)、拟投入本标段的主要施工设备表

设备名称	型号规格	数量	国别产地	制造年份	额定功 率KW	生产能力	备注
装载机	ZL50	4	成都	06		3M3	良好
挖掘机	PC220	6	日本	05		1.2M3	良好
履带式推土机	D120	4	上海	06			良好
振动压路机	YZ20	4	洛阳	07		20T	良好
自卸汽车	解放	25	中国	07		15T	良好
洒水车	东风	3	中国	05		8M3	良好
抽水机		20	成都	08			良好
沥青砼拌和机	3000	2	徐工	06	700KW	240T	良好
橡胶沥青反应设 备	VSS	2	重工	06	150KW	8. 5T	良好
智能沥青洒布车	ZZ5256GL Q	3	河南	07	159KW	10M3	良好
摊铺机	ABG423	4	德国	07	135KW	12M	良好
装载机	ZL50	3	成都	08	160KW	2.5M3	良好
双钢轮压路机	SW850	4	日本	07	85KW	20T	良好
石屑洒布机	东风	2	中国	07	60KW	15T	良好
自卸汽车	解放	45	中国	06		15T	良好
洒水车	东风	2	中国	05		10M3	良好
灭火鼓风机		28	成都	08			良好
小型压路机	1T	1	成都	08	40KW	1T	良好

(2)、拟投入本标段工程的试验和检测仪器设备表

仪器设备名称	规格型号	产地	数量	年份
土壤无侧限仪	WE-2	中国	1	2000
土壤液塑限联合测定	LH-100	中国	1	2002
光电液塑限仪	SDY-1	中国	1	2003
土样分析筛		中国	1	2002
灌砂筒		中国	6	2000
烘箱		中国	1	2000
土工试验模具		中国	2	2002
含水量测定仪		中国	1	2002
经纬仪	JD2	中国	2	2005
水准仪	NA2	中国	2	2005
压力试验机	WEY-2000D	中国	1	2004
塌落度测定仪	300*200*100	中国	3	2006
砼回弹仪	HT75	中国	1	2006
水泥稠度凝结时间测定仪	300±2G	中国	1	2005
砼振动台	1M3	中国	2	2006
砼贯入阻力仪	HG80S	中国	1	2004
砼切片机	HQP-150	中国	1	2005
容量筒	1~30L	中国	2	2007
案称	AGT-10	中国	2	2007
架盘天平	JPT-2	中国	1	2007
台秤	TGT-100	中国	1	2007
保温箱	40DL-160	中国	1	2005
水泥筛		中国	5	2007
砂浆稠度仪	CS145	中国	5	2006
布氏旋转粘度检测仪	LD-21	中国	2	2005

仪器设备名称	规格型号	产地	数量	年份
针如度仪	WUH-100	中国	8	2005
延度仪	YD5	中国	6	2005
软化点仪	HYD-300	中国	4	2005
标准筛(方孔筛)		中国	10	2005
烘箱	300LHS	中国	2	2005
试模		中国	20	2005
脱模器		中国	4	2005
马歇尔实验仪	GTT-S	中国	1	2005
马歇尔试件击实仪	DLO	中国	3	2005
恒温水箱		中国		2005
冰箱	190L	中国	1	2004
沥青混合料抽提仪	CTH-400	中国	2	2005
路面取芯机	FY-20	中国	2	2005
路面平整度仪	DH-3	中国	4	2005

(三) 根据本项目的工期、质量、管理、服务做出相应实质性的承诺

(1) 工期承诺及具体措施

- 一、工期承诺:确保按期完成任务。
- 二、工期总体目标:
- 1、本工程要求工期为<u>365日历天</u>,我单位保证在工期内完成所有工程项目,并达到竣工验收交付条件。

(1) 进度控制管理体系

项目经理部设立计划小组,主管工程进度,设专职进度控制工程师,明确其职责分工,具体控制工程进度。工程开工前,计划各合同部依据施工承包合同有关条款,根据施工图及施工现场实际情况,编制工程项目实施总进度控制计划,报业主及监理单位批准。在编制计划时,要充分考虑技术可能性和各种不利因素的影响,留有余地,提高计划科学性、可靠性、准确性和可操作性:对进度目标进行风险分析,制订防范性对策。

- (2) 编写施工讲度计划
- a、T.序之间的合理衔接。
- b、施工方法的可靠性以及与施工经验、施工实际水平的适应性。
- c、关键线路上劳力、设备安排是否妥当。
- d、进度计划是否留有余地,计划调节的可能性。
- e、作好雨季施工安排。
- (3)制定材料、设备的采购及供应计划

项目部下设的计划部、物资设备部,按照工程工期计划,制定详细的需要数量,特别是专用设备的质量状况和数量、特殊材料的需要计划等。

- 2、施工阶段工期的管理方案
- (1)建立工程工期工作日志制度,详细记载每日实际完成量和累计完成量及影响进度的各种因素。
- (2) 计划合同部收集进度资料进行整理和统计,从中发现是否出现进度偏差,一旦发生进度偏差,应及时分析产生的原因,并提出工期调整的措施和方案,要求重新调整施工计划。
- (3)定期分析影响本工程工期的关键环节,进行计划工期与实际工期的比较,分析超前或 滞后因素,及时指出可能引起工期延误的隐患,科学地对工期进行调整和优化,制定总工期不

突破的对策措施。

- (4) 检查落实材料、物资按计划供应。
- (5) 积极提出有利于工程进度的合理化建议,采用新技术、新材料和新工艺,缩短工期。
- (6) 组织召开现场进度专门协调会,解决影响进度的问题。
- (7) 检查、督促工程进度计划的落实。
- (8) 建立工程进度控制信息档案。
- (9) 工程进度控制切忌单纯从进度上着眼、从计划上修补、从赶工上下手,进度问题实际上是一个综合因素作用下的结果,因此在工程进度控制上,应同时注意实际施工中影响进度的诸多因素,改进施工工艺和施工方法,从新技术上着眼,从提高劳动生产率上下手,才能真正确保合同工期的如期实现。
 - (10) 加强物资供应进度控制。
- (11) 健全内部管理体制建立从经理部到各施工处的调度指挥系统、全面、及时掌握并迅速、准确地处理影响施工进度的各种问题。对工程交叉和施工干扰应加强指挥和协调,对重大关键工序总是超前研究,制定措施,及时调整工序和调动人、财、物、机,保证工程的连续性和均衡性。
 - 三、保证工期措施
 - 1、从组织管理上保证工期措施
- (1)本工程实行项目法施工,根据本工程分项工程较多,为便于管理和组织施工,我公司 将组织充足精干人员,调集精良设备投入到本工程项目之中。并成立由技术负责人领导的,由 工程部具有经验丰富的人员担任调度员,加强施工现场的协调和指导。
 - (2) 建立以项目为核心的责权体系,定岗、定人、授权,各负其责。
- (3)各施工班应坚持每天一次的生产布置会,做到当天的问题不留到下一天,并让每个生产者清楚明天的工作,及时安排布置。
- (4)调度员每周定期召开一次由各施工班参加的生产调度会,及时协调各班 组之间的生产关系,合理调配机械设备、物资和人力,及时解决施工生产中出现的问题,并积 极参与协调好工程施工外部的关系。
 - (5)每月由项目经理主持的生产总调度会,总结上个月的施工进度情况,安排下个月的施

工生产,及时解决工程施工内部矛盾,及时协调各班组之间和各科室之间的关系,对施工机械设备、生产物资和劳动力安排计划,并对资金进行合理分配,保证施工进度的落实和完成。

- (6)建立严格的《工程施工日志》制度,逐日详细记录工程进度、质量、设计修改、工地 洽商等问题,以及施工过程中必须记录的有关问题。
- (7)各级领导必须"看一观二计划三",提前为下道工序的施工,做好人力、物力和机械设备的准备,确保工程一环扣一环地进行。对于影响工程总进度的关键项目、关键工序,主要领导者和有关管理人员必须跟班作业,必要时组织有效力量突破难点,以确保工程总进度计划的实现。
- (8)建立奖罚严明的经济责任制,每月进行一次总结,对提前完成任务的相关责任人进行 奖励;未能按时完成任务的按拖延的天数进行罚款,谁拖延谁受罚,提高劳动效率,确保工期 的实现。
 - 2、从计划安排上保证工期措施
- (1)在工程开工前,必须严格按照《工程施工承包合同》的总工期要求,提出工程施工总进度计划,并对其科学性和合理性,以及能否满足合同工期的要求并有所提前等问题,进行认真审查。
- (2) 在工程施工总进度计划的控制下,坚持逐月(周)编制出具体的工程施工计划和工作安排。
- (3)制定周密详细的施工进度计划,抓住关键工序,对影响到总工期的工序和作业给予人力和物力的充分保证,确保总进度计划的顺利完成。
- (4)对生产要素认真进行优化组合、动态管理。灵活机动地对人员、设备、物质进行调度 安排,及时组织施工所需的人员、物质进场,保障后勤供应,满足施工需要,保证连续施工作 业。
 - (5) 缩短讲场后的筹备时间,边筹备边施工。全线施工,多头并讲。
- (6) 工程计划执行过程中,如发现未能按期完成计划的情况时,必须及时检查分析原因,立即采取有效的措施,调整下周的工作计划,使上周延误的工期在下周赶回来。在整个工程的实施过程中,坚持"以日保周,以周保月"的进度保证方针,实行"雨雪天的损失晴天补,白天的损失晚上补,本周的损失下周补,本月的损失下月补"的补赶意外耽误工期的措施,确保总工程进度计划的实现。
 - 3、从资源上保证工期措施

- (1)将该工程列为我公司的重点工程,该工程所需的机械、设备、技术人员、劳动力、材料、资金等资源给予优先保证。同时成立一个施工经验丰富、组织管理能力强,结构形式合理的项目领导班子,配备一批优秀的技术骨干,生产骨干和性能卓越、状况良好的施工机械,组成一个高素质、高效率的施工队伍。
- (2)施工机械做到统筹安排、统一调配、合理使用。尽可能组织机械化流水作业,利用施工机械高效生产力,做好施工机械的维修、保养工作,施工现场设置修理场,保证施工机械的正常运转。对重要的、常用的机械和机具应留有富余备用设备,以防万一。
- (3)制定严格的材料供应计划,根据现场的施工进度情况保证各施工段材料的及时供应, 杜绝停工待料的情况出现以免耽误工期。

4、从技术上保证工期措施

- (1)由项目部技术负责人全面负责该项目的施工技术管理,项目经理部设工程处,负责制定施工方案,编制施工工艺,及时解决施工中出现的问题,以方案指导施工,防止出现返工现象而影响工期。
- (2)实行图纸会审制度,在工程开工前由项目技术负责人组织有关技术人员进行设计图纸会审,及时向业主和监理工程师提出施工图纸、技术规范和其它技术文件中的错误和不足之处,使工程顺利进行。
- (3) 采用新技术、新工艺,尽量压缩工序时间,安排好工序衔接,统一调度指挥,平衡远期和近期所发生或将发生的各类矛盾,使工程按部就班地有节奏地进行。
- (4)实行技术交底制度,施工技术人员应在施工之前及时向班组做好详尽的技术交底,勤到现场,对各个施工过程做好跟踪技术监控,发现问题及时现场就地解决,防止工序检验不合格而进行返工,延误工期。
- (5)施工全过程使用计算机进行网络计划管理,确保关键线路上的工序按计划进行,若有滞后,立即采取果断措施予以弥补。计算机的硬件和软件应满足工地管理的需要,符信息化和程序化的管理规定,同时在工程施工期间,所有数据的传送尽可能做到光盘、U盘或网络传输,使数据传送方便、迅捷。

5、保证工期的其他措施

- (1) 关心员工的生活,根据不同的气候条件、施工强度相应调剂员工的饮食,加强饮食卫生管理,减少疾病。保证各个员工以健康的体魄、充沛体力,良好的精神状况投入到施工中。
 - (2) 搞好与业主、监理工程师及当地群众的关系,创造一个天时地利人和的施工环境。服

从业主和监理工程师的统一指挥和安排,配合在建施工单位的进度工作,为保质保量地按期完成该项工程而努力。

若资金暂时不到位继续施工,不能停工承诺

我公司对该项目建设地点周边环境比较熟悉,若中标,我公司结合多年来协调经验,进场前将主动协调周边毗邻单位、居民关系,全力配合业主和监理单位各项工作,确保工程顺利开展。施工过程中分析可能出现的问题,对可能出现的事件及早处理,避免事态发展;同时采取多种措施劝止周边居民干扰、保证工程正常有序施工。

根据工期目标,施工过程中经历节假日、农忙季节,我公司承诺节假日、农忙季节连续施工,不因工资发放问题造成劳动力不足确保工期目标实现,具体措施如下:

1、农忙、节假日保证连续施工的措施

我单位有着善打硬仗的优良传统, 保证农忙、节假日不放假, 其措施: 不放假、不停工, 具体措施如下:

- (1) 工人尽可能使用自有职工;
- (2)做好职工的思想政治工作,个人利益服从企业,信守"献身、实干、进取、守信"的企业精神:
- (3)全体动员,进行重点工程教育,使全体职工在农忙期间集中精力,想工程所想,干工程所干。
 - (4) 树立全员质量、工期意识,从思想上确保工程按期交付业主使用。
- (5)与职工订立劳动力合同,制定详细的劳动力稳定措施,以保证切实可行。首先解决好工人的后顾之忧,由组织上解决一线家在农村的施工人员的家庭收入问题,使前方工人能安心一线建筑工作。
- (6)农忙期间,从资金上予以保证。一是保证一线工人正常开支,保证工人吃好;二是对不回原籍坚守岗位上班的工人家庭,适当邮寄部分资金,保证农村亲属麦种雇工开支和购买化肥、种子等用款需要,真正从根本上解决一线和后方思想上、经济上的后顾之忧。
- (7)对于居住地比较集中的民工,在农忙期间我单位将派专人携带资金到民工家中进行慰问,并给民工家属发放一定数额的的资金,真正做到解决问题,稳定人心的作用。
 - (8) 合理安排工序调配劳动力, 保证该工程总工期的需要。对在农忙期间确因难以克服困

难无法参加一线施工所造成的劳动力减员,要提前作好摸底排队工作,具体落实到人,以便心中有数,尽早计划安排,协调好劳动力,千方百计保证该工程用工计划,达到不减员、不减速,对业主的总交工日期不动。

- (9)发挥我单位集团优势,施工用工本着多用内部职工少用农村劳工,多用外省劳务队伍 少用本省劳务队伍的原则,尽可能的保证节日及农忙季节的工率。
 - 2、从农民工工资发放上保证连续施工的措施
 - (1) 承诺不拖欠农民工工资,工资支付按照工程进度同期及时支付。
- (2)我公司在截止投标之日止,在建工程或已竣工工程均无拖欠或克扣农民工工资的行为。 该项目若我公司中标,公司将及时筹集工程总造价5%的资金作为工资专用保障金,专款专用, 一旦出现工程款不能按期拨付情况时,农民工工资可从专用保障金中支付,承诺决不拖欠农民 工工资。

自行协调地方村组关系,确保工程顺利实施的承诺

针对本工程的特点和要求,我公司在认真研究了招标文件内容和要求后,结合自身的条件和潜力,做出如下承诺:

- 1、如果我方中标后,承诺充分利用多年来在施工过程中同当地百姓建立的友好、合作关系的经验,主动并无偿地帮助业主协调与当地百姓的关系,创造良好外部施工环境、促进工程顺利施工。如果在协调与周边百姓关系的过程中发生的一切费用,由我公司承担。
- 2、承诺施工过程与招标人及施工所在地村组、居民等相关单位和个人协调好关系,保证 我公司在施工过程中不扰民,做好环境保护工作,创建精神文明。
- 3、保证服从业主方的统筹调度,接受业主的施工单位管理办法,配合各责任主体职责范围内的工作。
- 4、成立以项目经理为领导的协调小组,积极配合当地各级政府的工作,做到施工不影响农民生产。
- 5、提前做好人员安排,保证农忙季节的劳动力。做好施工计划,尽量把用工多的工作提前或安排在农忙之后进行。
 - 6、做好劳务人员的思想工作。对附近的农田及农业设施精心保护。

- 7、与当地村民协调好各方面的关系,力求得到村民的支持。项目部所使用的农民工尽量雇佣当地村民,争取为当地村民增加部分。
- 8、施工过程中涉及项目征地、补偿、供水供电等基础性工作,应积极争取村委会意见, 倾听村民心声,妥善处理好建设过程中的各类问题;
- 9、施工活动扰邻或影响周界居民生活时,施工单位要提早通报取得谅解,并尽可能采取措施降低影响程度,同时处理纠纷应遵循协商原则,在先原则和一次性补偿原则等。
- 10、文明施工,保证施工环境优良,不论任何情况(除人力不可抗拒因素外)确保工程顺利实施。

(2) 质量承诺及具体措施

- 一、质量承诺: 合格
- 二、质量管理目标
- 1、依法取得相应等级的资质证书,并在其资质等级许可的范围内承揽工程。不转包或者 违法分包工程。
- 2、开工前由项目经理主持编写项目质量计划,层层分解落实目标,建立质量责任体系, 对工程施工质量及保修质量负责。
- 3、按照工程设计图纸和施工技术标准施工,不擅自修改工程设计,不偷工减料。在施工过程中发现设计文件和图纸有差错的,及时提出意见和建议。
- 4、按照工程设计要求、施工技术标准和合同约定,对建筑材料、构配件、设备和商品混凝土进行检验:未经检验或检验不合格的不使用。
 - 5、建立、健全施工质量的检验制度,严格工序管理,作好隐蔽工程的质量检查和记录。
- 6、对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料,在建设单位或者工程监理单位见证下现 场取样,并送具有相应资质等级的质量检测单位进行检测。
- 7、建立、健全教育培训制度,加强对职工的教育培训,未经教育培训或者考核不合格的 人员,不得上岗作业。
 - 8、施工过程中虚心听取建设单位及其他各方主体的建议,确保工程质量达到合格标准。
 - 9、工程竣工交付后依法履行建筑工程质量保修义务。
 - 三、质量管理措施

本工程的质量保证措施是通过建立系统的质量管理制度来实现的。

1、质量管理制度

- (1)项目质量负责制:在工程施工中,项目经理代表企业法人全面履行与业主签订的施工合同,是乙方驻工地的代表,对工程施工进行全面的指挥,并对工程的经济技术成果承担责任。项目经理代表公司就工程质量向建设单位负责,各分管的项目副经理、各工种负责人向公司的法人代表、项目经理负责,全面进行质量控制,坚持"谁施工、谁负责"的原则。
- (2) 技术交底制度:坚持以技术进步保证施工质量的原则,在施工中积极采用新工艺、新技术、对特殊工序编制有针对性的作业指导书。每个工种,每道工序施工前要组织进行各级技术交底,包括项目负责人对施工员的技术交底和施工员对班组长、班组长对作业班组的技术交底。各级技术交底均以书面形式进行。因措施不当或交底不清而造成的质量事故追究有关人员责任。
- (3)材料进场检验制度项目部对采购的建筑材料、构配件和设备的质量,必须进行进场材料复核检验或进行相关试验。不合格的不得使用在工程上,因使用不合格材料而造成的质量事故要追究有关人员责任。
- (4) 样板引路制度:施工操作要注意工序的优化,工艺的改进和工序的标准化操作,积累必要的管理操作经验,提高工序和操作水平,确保操作质量。每个分项工程或工种都要在开始大面积操作前作出示范样板。统一操作要求,明确质量目标。
- (5)施工挂牌制度:主要工种如木工、混凝土、砌砖、抹灰、油漆等施工过程中要在现场实行挂牌制。注明管理者、操作者、施工日期,并做相应的图文记录,作为重要的施工档案保存,因现场不按规程施工而造成事故的要追究有关人员的责任。
- (6)过程三检制度:实行并坚持自检、互检、交接检制度。自检要做文字记录。隐蔽工程要由工长组织技术负责,质量员、班组长作检查,并作出详细的文字记录。
- (7) 质量否决制度:对不符合质量要求的分部分项工程,必须进行返工,对达不到质量目标要求的分部分项工程进入下道工序,要追究班组长和有关领导的责任;有关责任人员要针对可能出现的不利因素采取必要的预防和纠正方法。
- (8) 成品保护制度:施工管理人员应合理安排施工工序,减少工序的交叉作业。上下工序之间应作好交接工作,并作好记录。如下道工序的施工可能对上道工序的成品造成影响时,应征得上道工序操作人员及管理人人员负责。
- (9) 质量奖罚制度:根据质量目标要求和现场操作人员及管理人员所承担的责任范围,将用经济杠杆手段进行奖罚,达到质量目标并超额完成者给予奖励;达不到质量目标,无论完成多少,一律进行罚款,并返工、纠正,直到达到质量目标。
 - (10) 质量文件记录制度: 质量记录是追溯责任的依据, 力求真实和详尽。各类现场操作

记录及材料试验记录、质量记录、检验记录要妥善保管,特别是各类工序接口的处理,应详尽记录当时情况,理清各方责任。

- (11) 质量回访保修制度:按照住建部《建筑工程保修办法》的要求,在工程竣工交付使用后,出具工程质量承诺书,定期进行回访,认真及时处理质量保修问题,保障工程使用阶段的质量。
- 2、根据本工程的实际情况,对施工质量全过程和各相关部门,各个环节,特别是各道工序,从点到面,从面到体,强化监督控制。
 - A、组织管理, 规章制度上给予保证
- (1)认真抓好施工人员的质量意识教育,将公司质量方针: "质量第一、信誉第一、用户第一"的意识贯穿到每个人的头脑中,制定严格的质量管理措施,将工程质量与职工经济利益挂钩,对产品质量进行奖优罚劣。
- (2) 坚持改变以往重在靠施工中的督促,事后检查的方法,对该项目按IS09001系列标准来进行全过程的事前控制,做到不合格品随时出现随时纠正,保证本岗位不将不合格品留向下一道工序,对自己参与的工序和分部分项工程负责到底。
- (3)明确各分部分项工程施工的质量标准,做到布置工作必须交代质量要求,验收工程量必须先验收工程质量,把工程质量列在首位。发现问题视具体情况、大小情况及时发出整改通知书,限期整改并跟踪验证,对工程质量实行质量员否决权。
- (4)做好各阶段分部分项工程的技术交底对关键工作的工作和新技术新工艺施工进行技术培训;从项目经理到每一个参战的一线工人,要定期或不定期组织学习国家颁发的质量标准,操作规程和全面推IS09001标准和思想,提高管理人员和工人的技术思想和素质。
 - B、从加强原材料试验和检验工作给予保证

对自购原材料的组织与采购,力求货比三家,择优选用,必须先选用确定合格的供应商。 所有原材料进场前必须先检查材料出厂质保书是否符合国家颁发的现行有效的质量标准,并进 行必要的抽查复验,不合格的产品一律不准进场。

- C、抓好施工过程各阶段的质量监控
- (1) 严格质量检查验收,坚持三级质量检验制度,各班组在自查、互检基础上进行交接检,上道工序不合格,决不允许进行下一道工序施工。
 - D、坚持各阶段的工程质量检验制度
- (1) 一般分部分项工程验收测点、检验数据应按层次归纳成册纳入竣工资料。加强技术 复核制度,对定位放线、标高、轴线及特殊要求

的项目,必须进行二次专业复核,以防误差。

- (2) 搞好工程技术资料的收集整理工作,作到资料与施工同步,建立完整的施工档案, 凡列入技术档案的文件资料必须经过负责人审定,所有编写资料如实反映工程实际情况。
- (3) 质量通病预防措施在推行全面质量管理,落实各级质量责任制,坚持"三检制"、 "挂牌制"的基础上,加强施工过程中的质量控制是提高工程质量的关键。

(3) 管理承诺

履职尽责承诺

- 一、针对本项目各关键岗位人员的承诺:
- 1、我公司承诺在拟派往的项目部管理人员在后期的工程投标及施工中不会更换项目部管理人员。
- 2、选择我公司优秀项目经理及本公司熟练技术队组严格按进度施工,保证施工质量及施工进度能够达到本项目的要求。
- 3、建立、健全教育培训制度,加强对职工的教育培训;未经教育培训或者考核不合格的人员,不上岗作业。作业人员遵守安全施工的强制性标准、规章制度和操作规程,正确使用安全防护用具、机械设备等。对管理人员和作业人员每月至少进行一次安全生产教育培训,其教育培训情况记入个人工作档案。为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险。

4、施工技术人员配备

选派经业主确认的项目经理与施工经验丰富的技术人员组建项目部,坚持以才任职,以能定岗,因事设职,因职选人的原则,将施工经验丰富、有创新精神、工作效益高、年富力强的同志推上主要岗位,确保项目部精干、高效,本项目部拟投入的现场主要施技人员配备见附表。

- 5、项目经理常驻现场承诺
- (1) 项目经理在工程质量、工期、安全等方面向业主负责,并确保工程总目标的实现。
- (2)本工程施工期间,不再参加其它任何中小型项目的投标工作及不再兼任其它项目管理工作,确保全身投入本工程施工中。
- (3)每天在现场工作时间不少于8小时,且每周不少于5个工作日,因事外出需例行请假制度,未经业主、监理同意,擅离工地一天愿意接受业主招标约定的处罚。
 - (4) 投标材料中明确的项目经理、技术负责人及专项质量员,保证施工全过程不变动,

否则愿接受招标约定的罚款乃至终止合同。项目部成员若因工作不负责任,不能满足业主的要求,将报业主同意予以更换。

- (5) 现场不设常务经理、执行经理,以免使项目经理不成为事实上的工程实施者和第一责任人。
 - 6、施工技术人员管理职责:

工程建设指挥部总体策划,从组织、机械、财务与技术等方面为一线排忧解难,并进行检查督促,及时扭转工作中的不足。

项目部授权对业主与工程负责,其主要管理职责如下:

(1) 项目经理:

负责监督、协调现场的施工、供应、财务等各方面的工作,负责与顾客、厂商等外单位联系与协商,项目经理是工程项目施工的决策者、管理者、组织者和责任者。

- ①认真会审图纸,领会设计意图,明确施工要求,按规定要求组织编制详尽而科学的项目 质量计划并负责实施。
- ②坚持公司"质量第一、用户至上"的质量方针和质量目标。按公司质量体系文件的要求 开展质量创优活动。
- ③常驻工地,调度和指挥生产,检查和落实安全生产,确保质量体系有效运行,对发生的安全、质量、机械及其它重大事故,根据"三不放过"原则,及时调查处理,并向公司报告。
 - ④组织劳动竞赛,表扬奖励先进,加强职工队伍建设,提高队伍的思想、文化、技术素质。
- ⑤加强材料管理,掌握材料信息和市场行情,督促材料部门按规定要求进行采购、检验、 贮存和发放等。
- ⑥认真贯彻国家和上级有关财经政策和财经纪律,执行公司财务制度和规定,节约开支, 经常分析财务收支情况。
 - ⑦运用和推广新技术、新材料、新工艺积极开展技术革新活动。
 - ⑧主持召开工作例会,研究解决生产和行政上的重大问题。
 - (2) 技术负责人:
 - 1、组织深化施工组织设计,制作结合实际的施工方案,编制作业指导书,负责对全体管

理人员进行施工组织设计交底,对工长和质安员分阶段进行施工技术交底。

- 2、负责建立项目质量保证体系,组织编写质量保证计划和质量通病防治措施,召开质量目标交底会议,落实质量职责制。
 - 3、负责建立安全生产职责制,组织编写安全保证计划。
- 4、负责与设计院的联系工作,组织图纸会审及交底工作,审查设计修改图纸,办理图纸 会审、设计变更、技术变更核定单等技术资料,及时组织绘制竣工图。
 - 5、组织推广四新技术,落实科技术示范工作,开展QC小组活动。
- 6、组织单位工程的定位放线、测量工作,负责项目日常的质量、安全管理工作,负责解 决施工中的技术问题,参加质量安全检查。
- 7、负责工程分阶段质量验收及竣工后验收工作,参与项目工程质量事故和安全事故的调 查、整改、处理和决结工作。
 - 8、负责组织工程技术、试验资料、竣工验收资料的收集、整理、归档工作。
 - (3) 专业施工员:
- ①认真学习施工图纸,参加图纸会审,领会设计意图,贯彻执行项目质量计划,按照公司质量体系文件的规定开展一切活动,具体负责一个或数个单位工程的施工管理。
 - ②组织做好单位工程施工前的各项准备工作,负责场地布置,搭建临时设施,测量放线。
- ③负责设计变更及技术核定的签证,做好分部项工程的隐蔽验收与工程质量检查验收及评 定工作,按规定填写质量记录和质量体系运行记录。
 - ④编制单位工程月度作业计划,指导班组编制旬作业计划。
 - ⑤负责过程检验和试验的具体工作,并对其负责。
 - ⑥做好分管工作范围内班组与工种之间及工序衔接的平衡调度工作。
- ⑦认真向工人技术交底,交施工规范及操作规程,交质量要求,交作业时间,交安全措施, 并经常检查督促。
- ⑧记好"施工日记",填报开竣工报告、停工报告、质量事故和返工报告、负责施工过程 各项原始资料的收集、整理和归档。
 - ⑨会同材料部门编制材料和设备采购计划,做好质量检验。

- ⑩认真执行施工定额,把好考勤记工关核对考勤表,按月编制定额完成情况统计表和人工分析表,为结算工资和成本核算提供依据。
 - ①督促搞好现场文明施工,按施工平面布置图合理堆放各种建筑材料。
 - (4) 质量员:
- ①贯彻执行国家颁发的《施工验收规范》、《质量检查评定标准》严格监督和检查工程质量。
- ②参加图纸会审、技术交底、隐蔽工程验收、竣工验收、分项、分部工程质量评定,并提出保证质量的审查情况。
- ③深入现场检查施工规范和技术规程执行情况,对违反施工规范和质量通病,督促施工技术人员制订预防和纠正措施,并对实施效果进行验证。
 - ④具体负责质量事故的调查分析鉴定,上级质量汇总统计报表。
- ⑤会同材料员对采购的原材料、半成品、成品、代用品及设备进行进货检验、质量合格方可使用。
- ⑥严格把好工程质量关,督促工人对质量进行自检、互检,具体组织工程处对工程质量进行检查、总结和评比,并做好记录。
 - ⑦严格履行公司质量体系程序文件中有关质量保证的职责。
 - (5) 安全员:
- ①贯彻执行国家关于劳动保护和安全生产的方针政策,严格执行安全操作规程和公司制定的安全生产制度。
- ②积极开展安全生产的宣传教育工作,教育职工严格遵守安全操作规程和安全生产规章制度。
- ③经常深入施工现场,检查落实安全措施,发现和消除事故隐患,纠正违章作业现象,对不听劝阻者有权责令其停工,并及时向领导报告,对工地危险性大的操作工序,如组装、拆除脚手架等要亲临现场检查督促,并严格执行操作程序,切实保证安全。
- ④坚持对事故"三不放过"的原则,认真做好事故的调查分析和处理,按规定填写事故报告表,如实上报。

- ⑤组织班组开展安全自检互检,指导和支持班组兼职安全员开展工作,帮助他们提高业务和管理水平,配合上级安全大检查。
 - ⑥认真做好分部、分项工程的安全交底工作。
- ⑦会同施工技术员编制单位工程安技措施,参加单位工程技术交底会议,提出加强安全防护用品的计划,总结安全生产的经验。
- ⑧定期组织工人学习安全知识和规程,坚持"三宝"使用,进行二级安全教育,未经安全教育的新工人严禁参加施工。
 - ⑨完成领导交办的其他事项。
 - (6) 预决算员:
- ①认真认真图纸,领会设计意图,参加图纸会审,发现图纸中的问题,及时向技术员或分 管工程的施工员反映。
- ②根据图纸设计要求,准确无误地编制单位工程施工图预算,材料汇总表等,发现施工预算执行中的问题应主动及时解决,会同材料部门编制单位工程材料采购计划。
- ③负责提供与建设单位的工程合同或施工协议的具体报价或概算情况,参加合同评审,建立合同台帐,并将合同原件或复印件报公司企管部。
- ④坚决执行定额及国家有关规定,经常深入施工现场,全面了解施工情况,如实做好工程数量、工料数量、金额的计算,正确及时地编制好施工决算。
- ⑤对设计变更和技术核定情况及时做好工程造价的增减,及时报告领导,并作为竣工决算的依据。
 - ⑥每季末,向财务部门提供在建工程已完成实际工作量和工料预算成本分析资料。
 - ⑦协助财会人员收取工程欠款。
 - ⑧完成领导交办的其他事项。
 - (7) 材料员:
 - ①贯彻执行国家物资政策和管理规定,确保材料及设备满足施工需要。
- ②参加本单位项目质量计划的讨论,根据预算员提供的工程材料分析,按照公司质量体系程序文件规定进行材料和设备的采购、检验、保管和标识。并服从公司工程部的归口管理。

- ③根据施工任务安排,会同有关人员编制年、季、月度材料采购计划,确定合格供应商,严禁不合格材料进入施工现场。
- ④掌握"三材"用量和建设单位供应情况,负责催货和规格品种串换,严格把好"三材"的质量、使用及节约关。
- ⑤健全并坚持各项材料管理制度,经常深入施工现场,检查督促有关人员管好、用好现场材料,做到工完料尽场地清。

(8) 测量员

- 1、认真贯彻执行国家和部颁的测量规范,负责本项目的施工测量控制及日常的测量工作。
- 2、测量的资料和原始记录应真实可靠,做到点位清、资料准,为施工提供准确数据。
- 3、能独立或联合完成工程控制网的测量工作,坚持测量的.复测制度。各级控制测量必须 严格按有关规范施测,并提出测量计算成果。
 - 4、根据现场施工情况,向物资部门提供测量仪器的购置计划。
 - 5、及时将测量资料和原始记录的装订成册和存档编号。
 - 6、认真做好测量仪器的维修和保管工作,定期进行校验,以保证测量仪器的精确度。
 - 7、坚持测量工作的自检、互检制度, 杜绝重大质量事故的发生。
 - 8、定期检查和维护控制桩位,防止损坏和移动。
- 9、施工时跟班检查控制桩(点)情况,发现异常及时复测、矫正。浇砼前提供轴线复核 点、标高控制点,并及时作好测量资料。

(9) 预算员岗位承诺书

- 1、依照要求完成各工程的预(结)算任务。精确执行上级主管部门下达的定额文件及费率、税收等规则。
 - 2、熟习图纸及设计改变,实时编制工程的预算,工程完工后按要求进行工程的结算。
 - 3、按要求递交月进度报表,核算其完成的工程量、任务量及付款额度。
- 4、掌握和调查市场状况,对项目中所用的设备、物资、半成品订货价钱,进行常常的询价任务。
 - 5、与调查和掌握工程讲展状况,调查工程签证状况,以积聚处理工程结算的各类根底材

料。

- 6、调查定额及取费方面政策及其转变,实时调整防止发作不应有的错误。
- 7、完成部目经理及技术负责人所交办的其他任务。
- 以上管理人员必须遵守公司岗位责任规定的相应岗位职责。
- 二、落实到位的技术保证措施及落实不到位处罚承诺:

我单位承诺,中标后保证拟派项目管理人员按时进场,开工后根据进度计划编制材料采购计划,确保满足工程进度的要求;必要的机械设备,根据施工进度计划,依次进场;具体保证技术措施如下:

- (一)项目管理人员落实到位的承诺及技术保证措施:
- 1、我单位承诺,中标后拟派项目管理机构关键岗位人员(项目经理、技术负责人及相关 技术人员、质量员、安全员、材料员、检测员、预算员等)按时进场组织施工,确保履职尽责。
- 2、在接到开工通知后7日内提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告,现场施工人员与投标时所承诺的人员一致,只能增加不能减少,并保证常驻现场,项目经理和技术负责人不得同时离开现场。
- 3、未经发包人和监理人的事先同意,投入人员不得随意调换。如确属需要,须选派在资 历和能力等方面不低于其前任的人员报请监理人审核,并经发包人审批后方可替换。
- 4、项目经理、项目技术负责人保证在施工场地的工作时间每月不少于20天,项目经理和 技术负责人未经批准,擅自离开施工现场的,罚款1000元/天。
- 5、项目经理及主要项目管理人员在施工现场实行请假制度,请假须招标人或监理单位的 认可。
 - (二)项目经理及主要施工管理人员更换及落实不到位的处罚措施
- 1、我单位承诺,项目部主要组成人员,在工程开工前20日内全部到达施工现场,保证不在其他工地兼职;在工程施工过程中,以上人员原则不得变动,若确需变动,应向发包人和监理单位提交人员变动报告,取得书面批准后执行;对于不称职的施工管理人员,发包人有权更换,在接到发包人人员变更通知后应立即给予更换,因此造成的损失由承包人负责。
 - 2、项目部其它人员如擅离工地现场,委托人将在工程款中扣罚500元/天的违约金:

- 3、若发现项目部组成人员职称、年龄结构、上岗证与投标文件有不符现象,甲方有权在工程款中扣罚20000元/项,并经委托人认可后方可上岗;
- 4、项目部组成人员不按照合同约定的人员进场计划进驻现场,每人每推迟一天扣罚1000 元。
- 5、发包人有权要求承包人更换管理人员,拒绝撤换主要施工管理人员的我单位违约:项目经理、技负责人10万元/每人次、其他主要管理人员2万元/每人次,投标文件中管理人员不得更换,若更换视为无正当理由更换进行处罚,但建设方要求更换除外。我单位承诺,未经甲方许可不擅自更换主要施工管理人员,否则愿接受20000元/次的罚款。

特此承诺!

(4) 服务承诺

针对本工程的特点和要求,我公司在认真研究了招标文件内容和要求后,结合自身的条件和潜力,做出如下承诺:

- 1、我公司针对本工程将组建有着丰富同类施工经验的项目领导班子,在公司总经理的领导下,切实做好各项工作,对可能出现的问题早分析、早发现、早落实。我们能够解决的问题绝不推脱给业主和其他施工单位。本着全力服务于工程的目的,做好各项关键工作提前准备,落实各难点到责任人。对于需要与各行政主管部门协调事宜我公司将充分发挥我公司各种潜在优势,协助或帮助业主办理,及时为业主排忧解难。
- 2、我方承诺负责施工过程中地方政府及相关职能部门和周边关系的协调工作,期间发生的协调费用由我方承担。我方负责协调好工程当地各职能部门及四邻关系,办理施工中各种手续证照,该部分费用由我方承担。
- 3、质量承诺:我方保证在工程施工中建立严密的质量保证体系,严格按照设计、规范、施工组织设计要求建立可靠质量保证措施,从而保证工程质量达到合格工程。达不到合格工程我方愿意接受800元罚款。
- 4、工期承诺"我方保证在业主要求的工期内完成, 若达不到承诺工期要求, 每超一天我方愿接受招标人500元罚款。
- 5、我公司承诺在施工过程中的建筑垃圾,承诺无偿清运,避免因建筑垃圾造成周边环境 污染、及道路通行不便而对本工程造成负面影响。

- 6、保修服务承诺:在保修期内每季度回访一次,发现问题无条件维修。
- 7、优质服务承诺:工程竣工,我方将留一包括各专业的综合服务组配合业主搞好后勤服务, 甲方满意为止。
 - 8、不计取因停电、停水造成的窝工损失,业主不承担责任。
 - 9、工程中标后工程不转包、不分包。对甲方分包工程,需我方配合,
- 我方派专人负责配合工作,给分包单位足够时间,并提供方便条件,并保证做好分包单位的成品保护,不计取配合费。
- 10、我公司保证不拖欠民工工资,对民工工资及时发放,若有违约,甲方可直接从工程款扣除。
- 11、在施工现场为建设单位、监理单位提供办公场所,办公室内配备办公桌椅、文件柜、 饮水机、空调,尽可能为建设单位、监理单位提供良好的工作环境和便利的办公条件。

施工中接受甲方合理的安排和建议的承诺

我公司承诺:保证服从业甲方的统筹调度,接受甲方合理的安排和建议,配合各责任主体职责范围内的工作,具体响应方式如下:

一、施工前期

- 1、工程施工前期,若我公司中标进入现场后,将迅速组织人员、材料、机械进场,最大限度缩短工程前期准备工作。
- 2、协助甲方办理各种相关手续,如开工许可证、质量和安全报监等。根据合回约定,按 照甲方要求办理建筑工程一切险,以确保本工程项目开工手续的办理不会因此受到不利影响; 在工程开工前,向甲方提交各类保险已经办理并生效的证明。
 - (8) 积极配合甲方各项管理工作,并签订各项管理协议。

二、施工中期

- 1、对工程项目实施过程的整体策划和建议
- (1)在工程项目开工后,甲方往往急需理顺工程相关各方的责任关系和管理程序,为此 在征得甲方同意的情况下,我公司会以书面形式提出建议方案。
 - (2) 建议方案包括甲方、设计方、监理方及各专业分包单位的主要工作内容、工作程序、

工作原则和几方的工作关系以及我公司的建议。

- (3) 关于工程进度计划,往往需要甲方、设计和相关各方密切配合,共同为工程创造配套条件,才能使工程在保证质量的前提下,按计划有序进行。
- (4) 严格服从甲方的合理安排和建议,配备符合规定人数的管理人员,保证安全生产管理人员履行安全管理职责,使安全生产管理做到标准化、规范化。
 - (5) 认真执行安全生产管理责任制和各项规章制度、操作规程并严格落实。
 - (6) 保证甲方对本工程的工期要求、质量要求、安全要求。
- (7)按甲方要求对从业人员进行安全生产管理教育和消防安全知识培训等,做到按要求 持证上岗。
 - (8) 加强本工程的质量、安全生产自查工作,及时发现和排除隐患。
 - (9) 落实重大危险源监控责任,对重大危险源实施有效的监测、监控和整改。
 - (10) 依据各种应急救援预案,定期组织演练,落实操作岗位应急措施。
- (11)按消防法律法规和有关技术规范要求,加强消防器材日常检查工作,发现问题及时汇报。
- (12) 引导鼓励从业人员履行安全生产管理方面的义务,鼓励从业人员对安全生产管理 违法、违章行为提出改正建议。
 - 2、为甲方服务,体现在对甲方的尊重
- (1) 我公司自工程施工开始,将不断提升企业在各层面对用户服务的意识和保证能力,教育项目员工牢牢树立尊重甲方的意识,从言谈举止到工作配合.上处处要尊重甲方。
- (2)对甲方的每一项要求,无论多么细小,也无论是那方面的需求,均要做出积极的响应,在不违背合同和偏离为甲方服务的原则的前提下,积极开展服务。
 - 3、当好甲方的助手和参谋
- (1)根据甲方的建设意图,发挥我公司的总体技术优势,站在甲方的高度从工程的使用功能、设计的合理性等方面考虑问题,多提合理化建议。
- (2)根据合同要求,科学合理的组织施工,统一协调和管理,解决工程施工过程中存在的各种问题,让甲方放心:建立与甲方、监理等参加的工程例会制度,加强沟通,及时解决工

程质量、进度等问题。

(3) 合理使用本工程资金,实行专款专用:根据施工进度计划,制定资金使用计划,保持资金处于最佳使用状态;如果本工程施工中某阶段甲方发生困难,我公司保证工程连续施工,工期不受影响。

三、施工后期

- 1、本工程涉及材料多,工期紧,质量要求高为此项目将安排专人进行综合协调管理各工 种的施工和工序穿插,确保工程能符合总进度要求。
 - 2、编制、汇总、复核、整理工程竣工验收备案资料,以保证按期交付甲方使用。

投标人(电子签章): 南阳华岳路桥工程有限公司
法定代表人(电子签名):
14人人人人(七 1 並 1/),
0005 / 0 1 10 1
<u>2025</u> 年 <u>9</u> 月 <u>10</u> 日

(四) 保修服务承诺

保修措施现我方郑重承诺,在本工程竣工后的保修期内,将按照以下保修措施,保证道路工程的质量和使用安全。

一、施工质量保证

- 1、我方承诺在道路工程施工过程中,严格按照相关法规和规范进行操作,确保施工质量合格。
- 2、我方将按照合同约定,使用符合标准规范的原材料,保证道路工程的耐 久性和稳定性。
- 3、我方将确保施工过程中的人员操作技术过硬,配合合同约定的时间节点, 按时完成各项施工任务。

二、保修期服务

- 1、针对新建项目,我公司将提供二年的保修期限。针对修缮或改建项目, 保修期限为一年,自工程交付使用之日起计算。
- 2、保修期内,我方将对道路工程实行免费保修服务,负责处理和修复因施工过程中存在的质量问题而引发的故障和损坏。
- 3. 对于非人为破坏或其他客观因素引起的道路工程损坏,我方承诺在收到维修通知后的24小时内派专业技术人员到现场进行检修和修复。

三、保修服务承诺

1、保修内的服务承诺

- (1) 工程竣工后,将按照我公司的管理制度要求建立回访保修卡,及时提供《质量保修书》,保证按照国家的质量管理条例规定的内容承担保修责任。
- (2)建立以专业组成的维修修复小组常驻现场发现问题及时免费维修,并保证每月主动上门回访一次,在回访过程中,对业主提出的任何质量隐患和意见,我方都将虚心听取,认真对待,并做好回访记录。对属于施工原因造成的质量问题,我方将承担全部维修费用,并及时采取措施,派专人进行维修,保证不影响用户使用;对非施工原因造成的质量问题,我方将积极为业主着想,提供解决办法。征求意见及时处理问题,设立维修电话,严格贯彻公司的质量方针,本着客

户至上的原则,服务热情、周到,随叫随到,做到优质快捷服务。

- (3)我公司不仅重视施工过程中的质量控制,而且也同样重视对工程的保修服务,从工程交付之日起,我方的工程保修工作也随即展开。在工程保修期间,我方将依据保修合同,本着"为用户服务,向业主负责,让用户满意"的宗旨,以认真的态度、合理的措施、迅速的行动和优质的服务来维护用户的利益。
 - (4) 建立维修工程专班专人负责制,由公司工程部、技术部派人负责。
 - (5) 按照工程维修事件的紧急程度确定事故处理办法,并做到以下几点:
- 1)在保修期内,成品一旦出现问题,我公司免费提供所需的工作人员和材料进行维修。承诺接到业主的维修通知后2-4天内入场处理,并针对现场破坏程度制定相关处理方案,得到业主同意后,对工程进行维护修复工作。
- 2) 我公司在保修期内负责对成品进行日常一般性的定期维修保养,同时提供日夜24小时随传随到的紧急维修服务。
- 3)在收到紧急事故招唤时,我公司在正常工作时间于4小时之内到场进行抢修工作;在非工作时间于6小时之内到场进行抢修工作。

2、保修期外的服务承诺

- (1) 质保期外做到每月与建设单位联络一次,每半年去工程交付现场检查次并登门回访征求意见,发现问题立即解决,我公司在接到投诉和回访中发现缺陷后,我公司承诺在2小时内进入现场进行制订合理化解决方案,并与业主就返修内容达成协商。
- (2)针对存在的问题,分析产生原因,制订返修措施,经部门主管审核后,提交单位主管领导审批实施。工程部门将维修记录发给指派维修人员,并对其进行技术交底,强调公司服务原则,下达维修任务,安排尽快维修。维修人员按维修任务书中的内容进行工作。当维修任务完成后,应通知单位质量部门对维修项目进行检验,合格后再提请用户验收并签署意见,维修负责人要将工程管理部门发放的工程维修记录返回工程部门。
 - (3) 如果工程出现质量问题或由于操作不当等其他原因造成的问题,我公

司本关负责到底和优质服务的宗旨,在酌情收到一定成本费用情况下,全力组织技术力量进行保修,让业主完全可以放心使用,同时保修期外的维修费用将给予低于市场定价的优惠。

- 3、我方将保持与贵单位技术负责人的沟通畅通,及时向贵单位反馈工程施工进展和保修期服务情况。
- 4、我方将始终秉持诚信守约的原则,全力做好道路工程保修工作,确保达 到贵单位的要求。
 - 5、保修结束:

保修期满后,我公司将按照合同约定的程序和方法进行工程项目的最后结算。 本公司郑重承诺以上内容,一切以本承诺书为准。如有违反,我公司愿意承 担相应的法律责任。

投标人(电子签章):	南阳华岳路桥工程有限公司	
法定代表人(电子签名):		
2025 年 9 日	10 日	

(五) 项目部成员在岗保证措施

一、项目管理组织机构

为了满足施工的需要,充分发挥我公司人力、物力、管理、设备等各方面的综合能力,决定组建本工程专属项目部,配备高素质的各部门管理人员和技术实力雄厚的施工队伍,实行项目经理负责制。项目采用动态管理、目标控制、节点考核的管理办法组织施工,实施ISO9001:2019质量保证模式,创合格工程。

项目经理部采取精编人员、减少层次、灵活调度的原则,建立高效率的指挥系统。

- 二、项目各部门岗位的职责
- (1) 项目经理职责
- 1、项目经理是工程质量的第一责任者,是项目部质量管理体系的领导者和组织者,对项目部的工作质量、管理质量和工程质量全面负责。
- 2、认真贯彻国家有关质量工作的方针、政策、法规和上级有关指示,代表 公司履行合同规定的质量职责和要求。
- 3、建立和完善各级组织机构及人员配备,合理分配质量职能,明确各级管理职责。
- 4、组织制定、实施质量管理保证标准的规划或计划,审批项目部质量计划 和质量目标。
- 5、负责工程项目进度、质量、安全、成本的总布置和总协调工作,保证完成质量目标的各项资源供应。
 - 6、审批项目部提出的分承包资格预审书,参加公司组织的分承包资格审查。
- 7、签订经济承包合同,明确质量考核经济措施,掌握项目质量动态,根据 质量优劣进行奖惩和考核。
- 8、根据管理需要确定和主持项目质量体系的评审工作,保证质量体系持续 改进和有效。
 - 9、重视质量教育、技术培训工作,不断推动科技进步和技术创新。
 - (2) 施工经理职责

- 1、施工经理是项目经理的分管助手,在分管范围内领导和组织质量管理体系运行工作。
- 2、参加项目质量计划和质量目标的制定,协助项目经理建立和完善组织机构及人员配备,审批分管范围内的各项规章制度。
 - 3、参加项目部组织的分承包资格审查,提出审查意见。
- 4、领导和组织项目部各部门及施工队按公司质量方针及项目质量目标进行工程建设,正确处理工程质量、进度和成本的关系,确保工程质量。
- 5、合理安排资源,组织均衡施工和安全文明施工,组织质量创优竞赛活动, 为提高工程质量、保证工程创优创造良好条件。
- 6、掌握质量动态,发现问题及时组织研究和处理,对不符合标准和程序的 施工有权下令停止工作,确保工程质量全过程受控。
 - 7、根据质量优劣,提出考核意见。
 - 8、不断进行质量总结,在保证质量的前提下,加强质量成本的核算、分析,协调好设备、材料、外购配件等的质量管理工作。
- 9、参加项目质量体系评审,提出改进措施,不断提高质量体系运行的有效 性。

(3) 项目工程师职责

- 1、项目总工程师是项目部技术负责人,对工程技术、施工质量在技术上负责,对项目部质量管理体系运行进行具体的组织和领导。项目副总工程师是项目总工程师的分管助手,在分管范围内履行总工程师职责。
- 2、认真贯彻执行企业质量方针目标和发展规划,主持制定项目质量计划及 质量目标。
- 3、主持项目施工组织总设计的编制工作,审批专业施工组织设计和重要过程作业指导书。
- 4、领导项目质量、技术管理制度建设工作,协助项目经理建立和完善各级组织机构及人员配备。
 - 5、参加分承包资格审查,提出审查意见。

- 6、负责技术标准的配套、制定、审查、推行、考核工作,负责组织确定、 实施质量过程的测量、试验方法。
- 7、根据工程质量创优要求,提出质量优化指标,并组织制定落实措施,开展QC小组活动,做好技术攻关,确保工程创优。
- 8、针对质量通病组织制定预防和克服措施,并在施工过程中实施,切实解 决质量问题。
 - 9、主持工程项目的图纸综合会检和工程项目总体的技术交底工作。
- 10、督促施工队、质管部门严格执行开工申请制度、工序交接验收制度、三级质量检验制度和质量报审、报验制度。
- 11、领导和组织质量体系培训、岗位技术培训工作,加强质量教育,提高质量保证能力。
 - 12、负责组织新技术、新工艺、新设备、新材料的推广应用,依靠科技进步提高工程质量。
- 13、参加阶段性质量大检查及关键工序的质量验收,掌握工程质量动态,对 发现的问题及时采取措施解决,并根据质量优劣行使质量否决权。
 - 14、主持严重不合格品的评审和处置工作,审批产品例外放行。
- 15、不断进行质量统计、分析、总结,领导和主持内部质量审核,参加项目 质量体系评审,提出改进措施。
 - 16、组织质量回访, 听取用户意见, 对存在的问题组织整改。
 - (4) 施工部职责
- 1、在项目经理和项目总工程师的领导下,对工程质量技术提供保证,并在保证质量的前提下,科学、合理地组织施工。
- 2、认真贯彻电力建设工程施工技术管理导则,制订实施细则,经项目总工 程师批准后实施。
- 3、参加项目质量计划和质量目标的制定工作,组织编制施工组织总设计、 专业施工组织设计、作业指导书并进行归口管理。

- 4、组织工程项目的图纸综合会检和重大综合项目技术交底工作,负责一般 系统图纸的会检,对图纸会检和技术交底工作归口管理。
- 5、负责技术标准的归口管理,保证质保体系运行场所使用有效的技术标准 和规范。
- 6、参加项目年度、季度施工计划的编制,作好总平面管理、技术供应计划 及生产调度工作,合理安排月施工计划,组织均衡施工。
 - 7、提出设备、材料的订货技术条件, 审核工程备料。
- 8、参加项目部组织的分承包资格预审,提出审核意见,并在过程中对分承包商技术保障能力作动态考核。
 - 9、负责工程项目的开工条件审核,提出开工申请报告。
- 10、配合供应科、质管科对重要设备、材料进行进货或开箱检验,掌握设备、材料供货的信息和状况。
 - 11、负责施工测量工作的归口管理。
- 12、针对可能产生的质量隐患、质量通病和成品保护提出预防措施,经审批 后组织实施。
 - 13、负责工程联系单、材料代用通知单的编制、送审,并组织实施。
- 14、制定产品标识的技术措施并组织实施,会同质管科组织工序交接验收和工程竣工验收移交。
- 15、参加不合格品的评审处置工作,对一般不合格品处置方案进行审批,对 严重不合格品处置方案提出审核意见,组织不合格品处置方案的实施工作。
 - 16、对产品的例外放行提出技术性意见。
 - 17、组织工程项目的分部试运和整套试运工作,下达消缺任务。
- 18、参加作业指导书、质量计划的实施验证及质量体系内部审核和评审工作,提出改进意见,不断提高质量保证能力。
- 19、负责设计图纸资料的接收、整理、分发、保管工作,按工程档案管理要求,组织工程档案的收集归档、贮存保管、移交工作。

- 20、负责组织工程服务,收集用户的期望和需求信息并组织落实;参加质量 回访、听取用户意见,对存在的问题组织整改。
- 21、传递国内外先进施工技术和工艺方法,加强新技术、新设备、新工艺、新材料的推广应用。
 - 22、参加项目质量体系评审,提供评审资料和信息,提出改进措施。
 - (5) 安全管理部
- 1、安全施工部在现场经理的领导下,负责施工项目的计划进度、安全调度管理工作:
 - 2、负责项目施工进度计划的制定和进度控制工作。
 - 3、负责施工现场的安全、文明施工管理工作。
 - 4、负责本项目消防设施和消防器材的维护保养和管理工作。
 - 5、负责现场环境保护和成品保护管理工作。
 - 6、负责施工机械协调使用,以及现场用水用电管理。
 - (6) 质量管理部职责
- 1、在项目经理和项目总工程师的领导下,负责对工程质量进行监督、检查、 考核、验收及竣工移交,协助项目领导完善质量管理体系,确保其有效运行。
- 2、认真贯彻企业质量方针目标和发展规划,组织制定项目质量计划和质量目标,并进行归口管理。
- 3、参加施工组织总设计编制工作,对专业施工组织设计、作业指导书中的 质量章节进行审核。
 - 4、根据质量管理需求,制定质量管理制度、规定、办法,经审批后执行。
 - 5、根据质量目标进行目标分解,制定落实措施和考核办法并实施。
 - 6、参加图纸会检和技术交底工作,提出审核和交底意见。
- 7、参加项目部组织的分承包资格预审,提出审核意见,并在施工过程中对 分承包商的质量保证能力进行动态考核。
 - 8、提出特殊质量人员的培训取证和配备计划,并进行归口管理。

- 9、对检验、测量和试验设备、仪器配置提出需求计划,经批准后配备并进行归口管理,负责项目的计量周期检定和计量管理工作,保证检验、测量和试验结果的准确性和有效性。
 - 10、根据工程性质及特点,提出工程质量验评范围划分,经监理审批后执行。
 - 11、根据各个施工阶段和工序的重要程度,提出W点、H点计划并实施。
- 12、配合供应科对设备、原材料、外购、外协件进行进货检验和试验,并负责督促和检查设备、材料跟踪管理。
 - 13、组织新技术、新材料、新工艺、新设备推广应用的必要试验和验证。
- 14、严格按工序交接验收制度、三级质量检验制度、质量报审、报验制度进行工程质量检查验收及标识,并加强过程监督和中间检查组织施工质量大检查,配合监理单位的质量检查和验收,组织接受电力工程建设质量监督机构的监督检查,督促有关单位积极处理检查中发现的问题,保证全过程质量控制。
- 15、严格执行部颁现行标准和规范,加强执法力度,对质量优劣提出奖罚意见,实施质量否决权。
 - 16、组织不合格品的评审处置工作,并对处置方案进行实施验证。
 - 17、对产品例外放行进行跟踪管理,保证其质量受控。
- 18、组织预防和纠正措施、关键及特殊过程质量控制程序、作业指导书、质量计划的实施验证,保持其与质量保证目标的适宜性。
- 19、负责质量记录表式的规范管理和质量记录的标识、收集、编目、保管工作,确保工程质量记录准确、及时、完整。
- 20、定期召开质量例会,对各阶段工程质量进行统计分析和总结,提出分析 报告和对策措施供项目部领导进行质量决策。
- 21、组织内部质量审核,参加项目质量体系评审,提出改进措施确保质量体 系满足合同规定的能力。
 - 22、组织工程竣工验收移交。
- 23、组织工程质量评比和总结工作,接受质量投诉,参加质量回访,负责对整改工作进行验证封闭,不断完善工程质量,最大限度地让顾客满意。

(7) 经营财务部

- 1、经营财务部在商务经理的领导下,负责施工项目的经营管理工作。
- 2、负责合同管理、费用管理、财务管理工作。
- 3、负责合同执行情况的监督,及时向项目经理反馈各种信息,为项目经理的经营决策提供依据。
 - 4、负责制定工程成本目标,负责施工图预算的管理工作。
 - 5、负责工程价款的回收及分配,负责工程价款结算工作。
 - 6、负责项目的财政支出与收入的控制与管理工作。
 - (8) 施工队队长职责
- 1、坚持"质量第一"的方针,正确处理进度与质量、质量与效益的关系, 贯彻公司有关质量管理的方针目标,对本队的质量管理工作及所承担的工程项目 质量负全面责任。
- 2、负责建立本部门的质量管理体系,领导本部门质量管理工作,组织专业质量策划,对项目部的质量方针目标具体分解落实到各职能班组和人员中去,并组织制定具体的保证措施和办法。
- 3、签订内部经济承包合同,制定安全、质量、进度与经济分配挂钩的措施 并实施。
- 4、负责本队施工项目进度、质量、安全、成本的总体布置和协调指挥工作, 组织均衡施工和安全文明施工,为提高工程质量创造良好条件。
- 5、在施工组织中,严格执行开工申请制度、工序交接验收制度、三级质量 检验制度,加强过程监督、检查和控制,定期组织质量大检查,保证质量全过程 受控。
- 6、建立部门质量考核制度,开展质量创优竞赛活动,掌握质量动态,及时评比和奖励质量工作中的先进班组及个人,考核质量低劣的施工项目或工作失职的质量人员,实施质量否决权。
- 7、定期召开部门质量工作会议,总结前一阶段的质量状况,解决质量管理中存在的问题,布置下一阶段的质量工作。

- 8、负责质量管理体系在部门内的有效运行,提高质量管理水平。
- 9、在保证质量的前提下,加强质量成本的核算分析,为公司质量决策提供依据。
 - 10、重视质量教育培训工作,大力支持队专责工程师、专职质检员开展工作。
 - 11、参加项目质量体系评审,提出改进意见。
 - 12、参加质量回访,对本专业施工质量问题组织整改。
 - (9) 施工队专责工程师职责
 - 1、对本队的施工质量在技术上负责。
- 2、参加项目施工组织总设计及质量计划的编制工作,在施工组织总设计的 原则下,主持编制专业施工组织设计,经批准后实施。
- 3、认真贯彻执行企业质量方针目标和发展规划,针对项目质量计划和质量目标,协助队长进行质量目标分解,进行专业质量策划,同时制定具体的保证措施确保各项分解目标实现。
- 4、协助队长建立和完善内部质量管理体系,组织体系知识培训和宣传,保证体系有效运行,提高质量管理水平。
- 5、负责本队技术标准化管理,保证质量管理体系运行场所都能得到有效的 技术标准和规范。
- 6、负责组织编制本专业特殊工艺流程的操作规程、工艺标准,经批准后实施。
- 7、主持本专业施工图纸系统会检,参加图纸综合会检,将设计问题消灭在 图纸审核中。
 - 8、审核专业备料计划,确保物资准确、及时供应。
- 9、组织编制并审核一般项目作业指导书,编制重要或特殊施工项目作业指导书,经审批后进行技术交底,从技术措施上提供质量保证。
- 10、针对可能产生的质量隐患、质量通病和成品保护提出预防措施,经审批后实施。

- 11、严格执行开工申请制度、工序交接验收制度、三级质量检验制度,督促施工人员做好质量自检、互检工作和原始施工记录,负责第二级质量检查验收工作。
- 12、配合供应部门做好设备、材料的开箱或进货检验工作,把好设备材料质量 关。
- 13、做好过程质量监督、控制,掌握质量动态,对发现的问题及时采取措施解决,并根据质量优劣提出考核意见。
 - 14、参加质量大检查,对存在的质量问题认真组织整改。
- 15、负责审核本专业发生的工程联系单和材料代用单,并对设计变更和材料 代用进行跟踪管理。
- 16、针对施工中的技术和质量难题,积极组织开展QC小组活动,做好技术 攻关。
- 17、主持本专业轻微不合格的评审和处置工作,参加一般及严重不合格评审,提 出处置意见,并按批准的处置方案组织不合格品的处置工作。
- 18、按工程档案管理和质量体系运行的要求,组织编制施工技术记录和质量 验评记录并及时移交,对质量体系运行文件、质量记录以及图纸资料进行整理归 档。
 - 19、负责领导本部门的计量管理工作,确保实施有效的质量检测。
- 20、负责组织本部门人员的技能培训及标准、规范知识培训,提高质量保证能力。
- 21、组织新技术、新工艺、新设备、新材料的推广应用,依靠科技进步提高 工程质量。
 - 22、负责本专业的质量统计、分析、总结工作。
 - (10) 施工工人职责
- 1、熟悉质量标准、工艺文件、施工图纸、设备技术资料,做到对施工项目 心中有数。
 - 2、熟悉本岗位的机具设备的性能、操作方法,保证操作质量。

- 3、严格遵守工艺流程、操作规程、施工作业指导书,树立精品意识,精心 完成每一道工序,确保工程质量符合规范、验评优良要求,并按要求作好准确、 真实、完整的施工记录。
- 4、积极参加QC小组活动,切实解决技术、质量难题,努力完成质量考核指标, 保证工程创优。
- 5、努力学习全面质量管理知识,加强自身的技能培训,及时进行施工总结, 不断提高技术操作水平。
 - 三、落实到位的技术保证措施及落实不到位处罚承诺:

我单位承诺,中标后保证拟派项目管理人员按时进场,开工后根据进度计划编制材料采购计划,确保满足工程进度的要求;必要的机械设备,根据施工进度计划,依次进场;具体保证技术措施如下:

- (一)项目管理人员落实到位的承诺及技术保证措施:
- 1、我单位承诺,中标后拟派项目管理机构关键岗位人员(项目经理、技术负责人及合同工程师、财务负责人、测量工程师、试验检测负责人、质检工程师、专职安全员等)按时进场组织施工,确保履职尽责。
- 2、在接到开工通知后7日内提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告,现场施工人员与投标时所承诺的人员一致,只能增加不能减少,并保证常驻现场,项目经理和技术负责人不得同时离开现场。
- 3、未经发包人和监理人的事先同意,投入人员不得随意调换。如确属需要, 须选派在资历和能力等方面不低于其前任的人员报请监理人审核,并经发包人审 批后方可替换。
- 4、项目经理、项目技术负责人保证在施工场地的工作时间每月不少于20天,项目 经理和技术负责人未经批准,擅自离开施工现场的,罚款1000元/天。
- 5、项目经理及主要项目管理人员在施工现场实行请假制度,请假须招标人或监理单位的认可。
 - (二)项目经理及主要施工管理人员更换及落实不到位的处罚措施

- 1、我单位承诺,项目部主要组成人员,在工程开工前20 日内全部到达施工 现场,保证不在其他工地兼职;在工程施工过程中,以上人员原则不得变动,若确需变动,应向发包人和监理单位提交人员变动报告,取得书面批准后执行;对于不称职的施工管理人员,发包人有权更换,在接到发包人人员变更通知后应立即给予更换,因此造成的损失由承包人负责。
- 2、项目部其它人员如擅离工地现场,委托人将在工程款中扣罚500元/天的 违约金;
- 3、若发现项目部组成人员职称、年龄结构、上岗证与投标文件有不符现象,甲方有权在工程款中扣罚20000元/项,并经委托人认可后方可上岗; 4、项目部组成人员不按照合同约定的人员进场计划进驻现场,每人每推迟 一天扣罚1000 元。
- 5、发包人有权要求承包人更换管理人员,拒绝撤换主要施工管理人员的我单位违约:项目经理、技负责人10万元/每人次、其他主要管理人员2万元/每人次,投标文件中管理人员不得更换,若更换视为无正当理由更换进行处罚,但建设方要求更换除外。我单位承诺,未经甲方许可不擅自更换主要施工管理人员,否则愿接受20000元/次的罚款。

投标人(电子签章):	南阳华岳路桥工程有限公司	
法定代表人(电子签名):		
2025 年 9 月	10 日	
