

南阳市西峡县G208线K1418+100-K1418+300段等7处灾害
防治工程（项目名称）施工招标

投 标 文 件

（商务及技术文件）

投标人：西峡县正通公路养护有限公司（电子签章）

2025 年 10 月 31 日

目 录

| | |
|------------------------|-----|
| 一、投标函及投标函附录..... | 1 |
| （一）投标函..... | 1 |
| （二）投标函附录..... | 3 |
| 二、授权委托书或法定代表人身份证明..... | 4 |
| （一）法定代表人身份证明..... | 4 |
| （二）授权委托书..... | 6 |
| 三、投标保证金..... | 8 |
| 投标保证金承诺函..... | 9 |
| 四、施工组织设计..... | 10 |
| 五、项目管理机构..... | 12 |
| 六、资格审查资料..... | 13 |
| （一）投标人基本情况表..... | 13 |
| 营业执照..... | 14 |
| 企业资质证书..... | 15 |
| 安全生产许可证..... | 16 |
| 基本开户证明..... | 17 |
| （二）投标人企业组织机构框图..... | 18 |
| （三）近年财务状况..... | 19 |
| 1、2022年财务审计报告..... | 20 |
| 2、2023年财务审计报告..... | 37 |
| 3、2024年财务审计报告..... | 54 |
| 公司财务会计制度..... | 81 |
| （四）近年完成的类似项目情况表..... | 83 |
| 业绩一..... | 83 |
| 业绩二..... | 94 |
| 业绩三..... | 105 |

| | |
|---|-----|
| 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺..... | 116 |
| (五) 投标人的信誉情况表..... | 120 |
| 在最新年度信用评价等级没有被交通运输部或河南省交通运输厅评为D级的承诺书..... | 121 |
| 无行贿犯罪行为承诺..... | 122 |
| 在国家企业信用信息公示系统未被列入严重违法失信企业名单的截图..... | 123 |
| “信用中国”网站查询结果..... | 124 |
| “中国政府采购网”严重违法失信行为记录查询结果..... | 128 |
| 信用报告..... | 129 |
| “信用河南”无违法违规记录证明版专项信用报告..... | 179 |
| 未被省级及以上主管部门取消招标项目所在地的投标资格且处于有效期内承诺书..... | 184 |
| 未被责令停业，暂扣或吊销执照，或吊销资质证书的承诺书..... | 185 |
| 不存在进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形的承诺书..... | 186 |
| 决不存在下列情形之一的承诺..... | 187 |
| (六) 拟委派的项目经理和项目总工资历表..... | 188 |
| (七) 拟委派的项目经理资历表..... | 188 |
| 拟委派的项目总工资历表..... | 194 |
| (七) 拟委派的其他管理人员和技术人员汇总表..... | 199 |
| (八) 拟委派的其他人员资历表..... | 200 |
| 财务负责人简历表..... | 200 |
| 结构工程师简历表..... | 202 |
| 测量工程师简历表..... | 205 |
| 试验检测负责人简历表..... | 208 |
| 质检工程师简历表..... | 211 |
| 专职安全员简历表..... | 214 |
| 项目部成员在岗保证..... | 216 |
| (九) 主要机械设备和试验检测设备配置表..... | 223 |
| 七、其他资料 | 224 |

| | |
|-----------------------------------|-----|
| （一）承诺书..... | 224 |
| （二）无在建承诺书..... | 225 |
| （三）信誉承诺书..... | 226 |
| （四）招标代理服务费缴纳承诺书..... | 227 |
| （五）无行贿行为承诺..... | 228 |
| （六）不拖欠农民工工资承诺..... | 229 |
| （七）工程质量保证信用承诺书..... | 230 |
| （八）中小企业声明函（工程、服务）..... | 233 |
| （九）残疾人福利性单位声明函..... | 234 |
| 2. 招标文件要求的其他材料及投标人认为有必要提供的材料..... | 235 |
| （一）企业技术能力..... | 236 |
| （二）履约信誉..... | 241 |
| （三）设备配置..... | 243 |
| （四）服务承诺..... | 246 |
| （五）有不拖欠农民工工资的具体承诺、相应措施..... | 256 |
| （六）保证连续施工的实质性的承诺..... | 257 |
| （七）质量保证期内、外服务优惠承诺..... | 260 |

一、投标函及投标函附录

（一）投 标 函

西峡县公路事业发展中心（招标人名称）

1. 我方已仔细研究南阳市西峡县G208线K1418+100-K1418+300段等7处灾害防治工程（项目名称）施工招标文件的全部内容（含补遗书第 号至第 号），在考察工程现场后，愿意以第二个信封（报价文件）中的投标总报价（或根据招标文件规定修正核实后确定的另一金额），按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷。

2. 我方承诺在招标文件规定的投标有效期（ 60 日历天）内不撤销投标文件。

3. 工程质量： 合格 ，安全目标： 安全生产零事故 ，工期： 60 日历天。

4. 如我方中标，我方承诺：

（1）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

（2）在签订合同时不向你方提出附加条件；

（3）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务；

（4）在你方和我方进行合同谈判之前，我方将按照合同附件提出的最低要求填报派驻本标段的其他管理和技术人员及主要机械设备和试验检测设备，经你方审批后作为派驻本标段的项目管理机构主要人员和主要设备且不进行更换。如我方拟派驻的人员和设备不满足合同附件要求，你方有权取消我方中标资格。

5. 我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在招标文件第二章“投标人须知”第1.4.3项和第1.4.4项规定的任何一种情形。

6. 在合同协议书正式签署生效之前，本投标函连同你方的中标通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

7. 完全响应招标文件的所有内容（其他补充说明）

投 标 人： 西峡县正通公路养护有限公司（电子签章）

法定代表人或其委托代理人： _____（电子签名）

地 址： 西峡县五里桥镇北堂村

电 话： 13703773426

传 真： 0377-83816902

邮政编码： 474500

2025 年 10 月 31 日

(二) 投标函附录

| 序号 | 条款名称 | 合同条目号 | 约定内容 | 备注 |
|----|------------|-----------|--|----|
| 1 | 缺陷责任期 | 1.1.4.5 | 自实际交工日期起计算__6个月 | |
| 2 | 逾期缴纳违约金 | 11.5(3) | 5000__元/天 | |
| 3 | 逾期交工违约金限额 | 11.5(3) | 10__%签约合同价 | |
| 4 | 提前交工的奖金 | 11.6 | /__元/天 | |
| 5 | 提前交工的奖金限额 | 11.6 | /__%签约合同价 | |
| 6 | 价格调整的差额计算 | 16.1.1 | 合同期内不调价 | |
| 7 | 开工预付款金额 | 17.2.1(1) | /__%签约合同价 | |
| 8 | 材料、设备预付款比例 | 17.2.1(2) | 水泥、碎石、沥青等主要材料、设备单 据所列费用的____/_% | |
| 9 | 进度付款证书最低限额 | 17.3.3(1) | /__%签约合同价或_100_万元 | |
| 10 | 逾期付款违约金的利率 | 17.3.3(2) | /__‰/天 | |
| 11 | 质量保证金金额 | 17.4.1 | 按照西财购〔2024〕3号《关于在政府采 购限额工程领域实行工程质量保证信用 承诺制的通知》要求执行。通过信用中 国查询信用等级优的企业，实行工程质 量保证信用承诺制；信用等级良的企业， 在签订合同时，保证金总预留比例不得 高于工程价款结算总额的2%；信用等级 良以下的企业，在签订合同时，保证金 总预留比例不得高于工程价款结算总额 的3%。 | |
| 12 | 保修期 | 19.7(1) | 自实际交工日期起计算__5年__ | |

二、授权委托书或法定代表人身份证明

（一）法定代表人身份证明

投标人名称：西峡县正通公路养护有限公司

姓 名：李永芳（签字） 性别：男

年 龄：38 岁 职务：董事长

系 西峡县正通公路养护有限公司（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件。

投标人：西峡县正通公路养护有限公司（盖单位章）

2025 年 10 月 31 日

法定代表人身份证



（二）授权委托书

本人李永茂（姓名）系西峡县正通公路养护有限公司（投标人名称）的法定代表人，现委托赵起兰（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改南阳市西峡县G208线K1418+100-K1418+300段等7处灾害防治工程（项目名称）施工投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本委托书签署之日起至投标有效期期满。代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证复印件及委托代理人身份证复印件。

投标人：西峡县正通公路养护有限公司（盖单位章）

法定代表人：_____（签字）

身份证号码：411330198701141550

委托代理人：赵起兰（签字）

身份证号码：411330198903081541

2025 年 10 月 31 日

法定代表人身份证



委托代理人身份证



三、投标保证金

附：请附银行转账凭证扫描件或电子投标保函截图或免缴保证金证明。

中国工商银行 网上银行电子回单

电子回单号码：0902-5507-5063-1100

打印日期：2025年10月27日

| | | | | | | |
|-------|------|---|----------|-------|----------------------------|-------------|
| 付款人 | 户名 | 西峡县正通公路养护有限公司 | 收款人 | 户名 | 西峡县公共资源交易中心 | |
| | 账号 | 1714026509200020944 | | 账号 | 94100301002679669604503 | |
| | 开户银行 | 工行西峡支行 | | 开户银行 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司西峡县白羽南路支行 | |
| 金额 | | ¥10,000.00元 | 金额(大写) | | 人民币 壹万元整 | |
| 摘要 | | G208保证金 | 业务(产品)种类 | | 跨行发报 | |
| 用途 | | G208保证金 | | | | |
| 交易流水号 | | 79258810 | 时间戳 | | 2025-10-22-15.33.16.715734 | |
| | | 备注：G208保证金，转中国邮政储蓄银行股份有限公司西峡县白羽南路支行 附言：G208保证金，转中国邮政储蓄银行股份有限公司西峡县白羽南路支行 业务类型(种类)：普通汇兑 指令编号：HQP929021848944 提交人：0920002094400001.c.1714 最终授权人：0920002094400002.c.1714 委托日期：2025-10-22 支付交易序号：67052509 | | | | |
| | | | | | | |
| | | 验证码：8qMJxRol/eFCm1eb4+YgQmG17B8= | | | | |
| 记账网点 | | 00268 | 记账柜员 | 00099 | 记账日期 | 2025年10月22日 |

重要提示：

1. 如果您是收款方，请到工行网站www.icbc.com.cn电子回单验证处进行回单验证。2. 本回单不作为收款方发货依据，并请勿重复记账。3. 您可以选择发送邮件，将此电子回单发送给指定的接收人。

[【打印回单】](#) [【发到邮箱】](#) [【关闭窗口】](#)

投标人：西峡县正通公路养护有限公司（电子签章）

法定代表人或其委托代理人：（电子签章或签字）

2025 年 10 月 31 日

投标保证金承诺函

西峡县公路事业发展中心（招标人名称）：

我公司因参加南阳市西峡县G208线K1418+100-K1418+300段等7处灾害防治工程（项目名称）投标活动，特承诺在规定的投标有效期内不撤销或修改其投标文件，在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内按照招标文件与招标人及时签订合同，合同签订后及时上传合同。如有违反，愿意缴纳招标控制价2%（最高不超过80万）的违约金。

如有争议，服从由行政监督部门作出的行政决定，或仲裁委员会作出的仲裁裁决，或工程项目所在地人民法院作出的判决。

本投标承诺函在投标有效期内保持有效。

投标人（电子签章）：西峡县正通公路养护有限公司

法定代表人（或授权委托人）：_____

2025 年 10 月 31 日

四、施工组织设计

投标人应按以下要点编制施工组织设计（文字宜精炼、内容具有针对性，可附表格到相应章节中）：

- （1）总体施工组织布置及规划
- （2）施工方案与技术措施
- （3）工程质量管理体系及保证措施
- （4）安全生产管理体系及保证措施
- （5）环境保护管理体系及保证措施
- （6）工程进度计划与措施
- （7）资源配备计划
- （8）施工进度计划表
- （9）施工总平面图

施工组织设计（技术暗标部分）编制要求

暗标要求：“暗标”应当以能够隐去投标人的身份为原则，未按要求编写施工组织设计的，该施工组织设计为零分。具体要求如下：

（1）版面要求：A4 纸张大小，纵向排版。（不设置封面）

（2）颜色要求：所有文字、图表均为黑色。

（3）字体要求：标题及正文部分所用文字均采用“宋体”四号“常规”字；图、表内的字体及字号不作要求；所有字体均不得出现加粗、加色、倾斜、下划线等标记。


（4）排版要求：页边距要求上、下边距 3 厘米，左、右页边距 2 厘米；不得设置目录；正文行间距为固定值 25 磅；文字内容（含正文标题、正文及表格标题）统一设为左对齐，仅正文首行缩进 2 字符，不得有空格；段落前后不得设置空行；不得设置页眉、页脚和页码；图、表部分对齐形式统一设为居中对齐。

（5）除满足上述各项要求外，技术“暗标”中不得出现任何行间插字或删除痕迹，构成投标文件的“技术暗标”的正文中不得出现投标人的名称和其它可识别投标人身份的字符、徽标、人员名称以及其他特殊标记等。

（另附）

五、项目管理机构

拟为承包本标段工程设立的组织机构以框图方式表示。

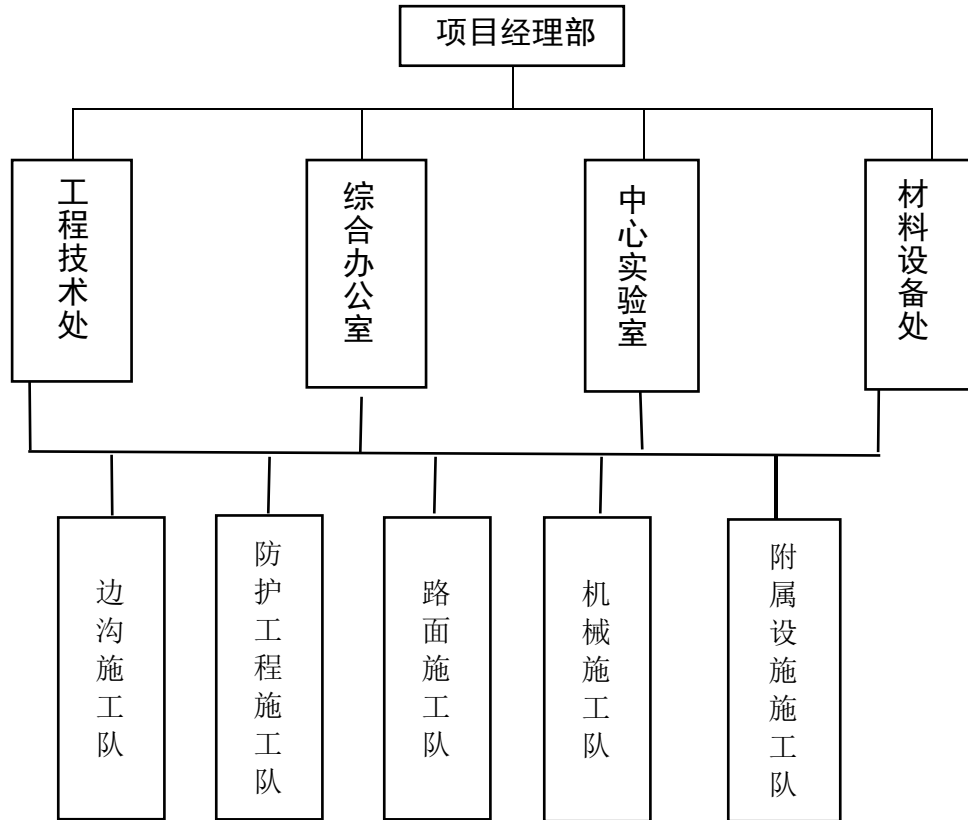

说明：

为保证本项目工程质量达到“合格”的目标，我公司将组织一批具有现代管理知识和具有丰富经验的施工队伍。本项目项目经理部设工程技术处、综合办公室、中心试验室、设备材料处。施工队伍组有边沟施工队、路基施工队、路面施工队、机械施工队、附属设施施工队。项目经理带领技术负责人、施工负责人、结构工程师、测量工程师、质检工程师、试验检测负责人、财务负责人等组成项目经理智囊团，分别对施工、计划、质量、技术、试验、资金运作、后勤保障及协调等方面进行具体管理并负责。

我公司作为项目部的后方保障，在人员、设备、财务等方面向项目部提供大力支持、并向招标人直接负责。

六、资格审查资料

（一）投标人基本情况表

| | | | | | | |
|---------------------------|---|---------------|-----------|--------|-------------|-------------|
| 投标人名称 | 西峡县正通公路养护有限公司 | | | | | |
| 注册地址 | 西峡县五里桥镇北堂村 | | | 邮政编码 | 474500 | |
| 联系方式 | 联系人 | 李永茂 | | 电话 | 13703773426 | |
| | 传真 | 0377-83816902 | | 电子邮件 | / | |
| 法定代表人 | 姓名 | 李永茂 | 技术职称 | 工程师 | 电话 | 13703773426 |
| 技术负责人 | 姓名 | 刘星辰 | 技术职称 | 工程师 | 电话 | 13503773620 |
| 成立时间 | 2018年10月19日 | | 员工总人数：163 | | | |
| 企业资质等级 | 公路工程施工总承包贰级、 建筑装修装饰工程专业承包 贰级 | | 其中 | 项目经理 | 7 | |
| 营业执照号 | 统一社会信用代码 91411323MA45W8TBXW | | | 高级职称人员 | 1 | |
| 注册资金 | 4600万 | | | 中级职称人员 | 9 | |
| 基本账户开户银行 | 中国工商银行股份有限公司西峡支行 | | | 初级职称人员 | 24 | |
| 基本账户账号 | 1714026509200020944 | | | 技工 | 93 | |
| 经营范围 | 路基路面养护工作；公路管理与养护；建设工程施工；地质灾害治理工程施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） | | | | | |
| 资产构成情及 投资参股的关联 企业情况 | 国有控股 | | | | | |
| 备注 | / | | | | | |

注：投标人应根据招标文件第二章“投标人须知”第3.5.1项的要求在本表后附相关证明材料。

营业执照

统一社会信用代码
91411323MA45W8TBXW

营业执照
(副本)(1-1)

扫描二维码
“国家企业信用
信息公示系统”
了解更多登记、
备案、许可、监
管信息。

名称
西峡县正通公路养护有限公司

注册资本
肆仟陆佰万圆整

类型
有限责任公司(国有控股)

成立日期
2018年10月19日

法定代表人
李永茂

住所
西峡县五里桥镇北堂村

经营范围
许可项目：路基路面养护作业，公路管理与养护，建设工程施工，地质灾害治理工程施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

登记机关
2023年01月26日

国家企业信用信息公示系统网址：
<http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告

国家市场监督管理总局监制

企业资质证书



建筑业企业资质证书

(副本)

企业名称: 西峡县正通公路养护有限公司
详细地址: 西峡县五里桥镇北堂村
统一社会信用代码: 91411323MA45W8TBXV
(或营业执照注册号): 法定代表人: 李永茂
注册资本: 4600万元人民币 经济性质: 有限责任公司(国有独资)
证书编号: D341578833 有效期: 至2029年05月13日
资质类别及等级:

公路工程施工总承包贰级
建筑装修装饰工程专业承包贰级
施工劳务不分等级



发证机关:

2024年05月13日

中华人民共和国住房和城乡建设部制

安全生产许可证

| | | |
|-----------------------------|-------------------------|---|
| 统一社会信用代码：91411323MA45W8TBXW | |  |
| <h2>安全生产许可证</h2> | | |
| 编号：（豫）JZ安许证字[2024]007279 | | |
| 企业名称： | 西峡县正通公路养护有限公司 | |
| 法定代表人： | 李永茂 | |
| 单位地址： | 西峡县五里桥镇北堂村 | |
| 经济类型： | 有限责任公司（国有独资） | |
| 许可范围： | 建筑施工 | |
| 有效期： | 2024年07月23日至2027年07月23日 | |
| 发证机关： | | 河南省住房和城乡建设厅 |
| 发证日期： | | 2024年07月23日 |

西峡县正通公路养护有限公司
30001066

河南省住房和城乡建设厅
行政审批专用章

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

基本开户证明

基本存款账户信息

账户名称：西峡县正通公路养护有限公司

账户号码：1714026509200020944

开户银行：中国工商银行股份有限公司西峡支行


法定代表人：
(单位负责人) 李永茂

基本存款账户编号：



2024 年 05 月 14 日

(二) 投标人企业组织机构框图

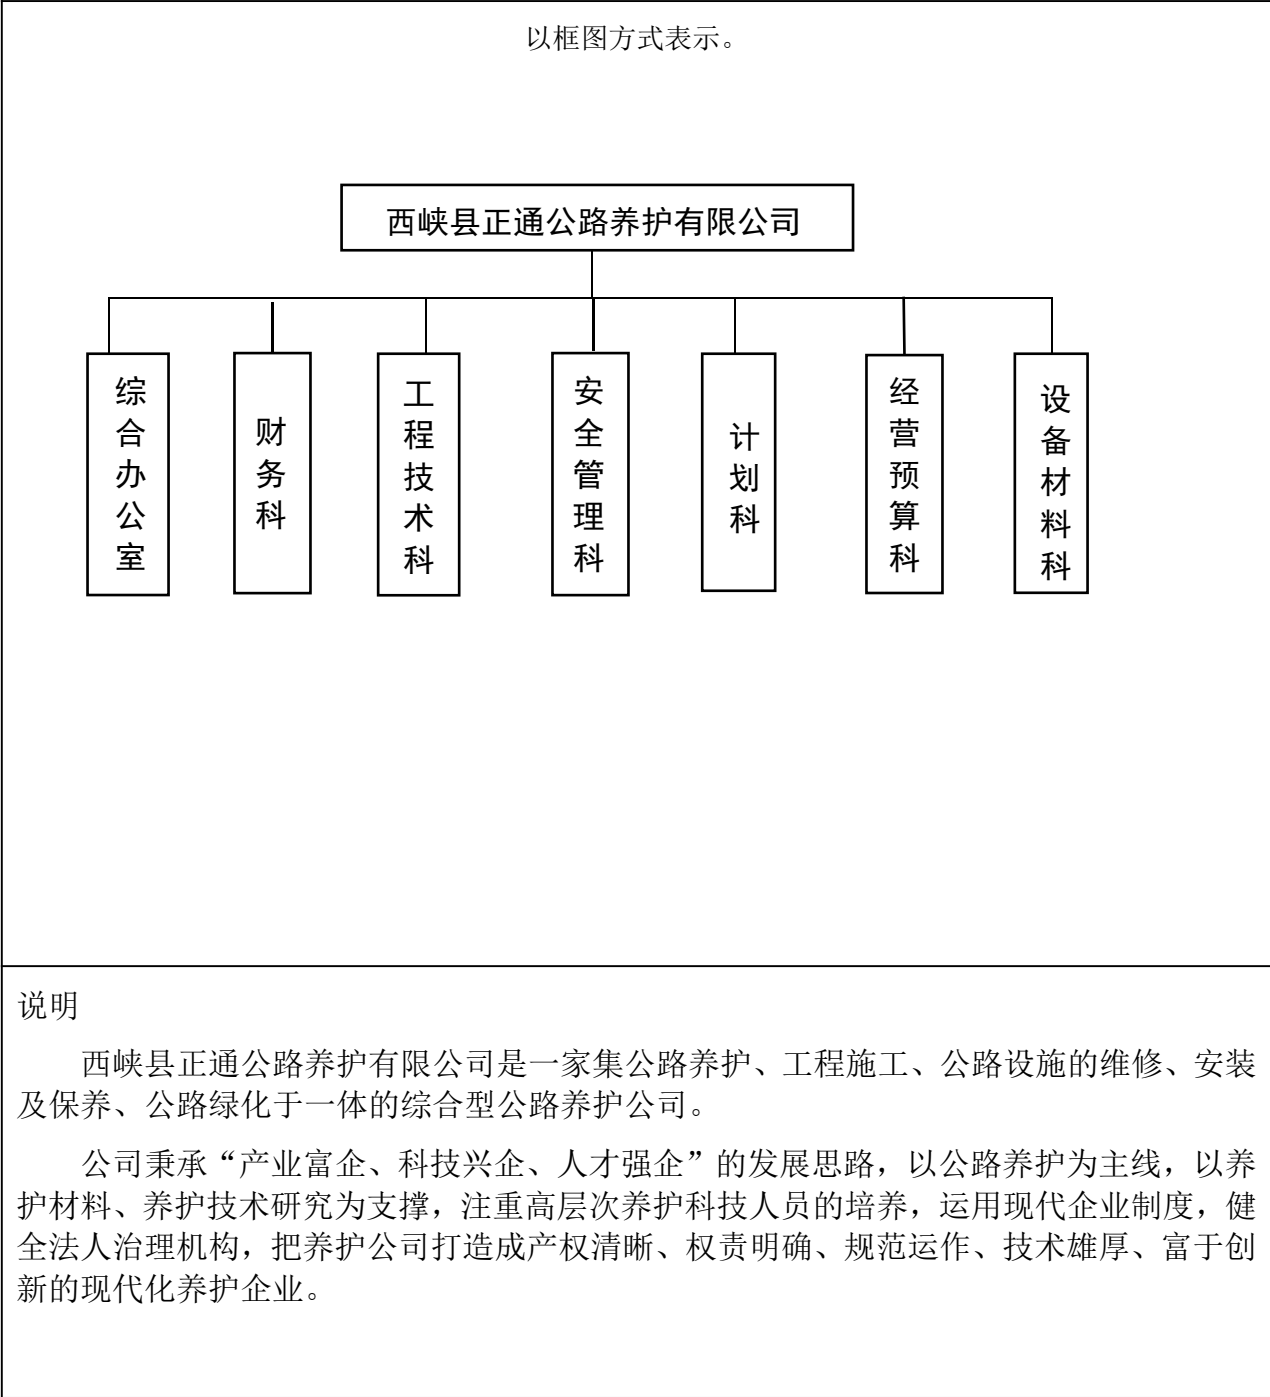

（三）近年财务状况

| 项目或指标 | 单位 | 年度 | 年度 | 年度 |
|------------|----|--------------|--------------|--------------|
| 一、 注册资本 | 万元 | <u>2022年</u> | <u>2023年</u> | <u>2024年</u> |
| 二、 净资产 | 万元 | 500 | 500 | 850.11 |
| 三、 总资产 | 万元 | 850.62 | 1388.85 | 912.74 |
| 四、 固定资产 | 万元 | 2001.36 | 2788.46 | 3617.96 |
| 五、 流动资产 | 万元 | 44.28 | 36.53 | 36.44 |
| 六、 流动负债 | 万元 | 1717.07 | 1868.76 | 3240.16 |
| 七、 负债合计 | 万元 | 1150.74 | 1399.61 | 2705.22 |
| 八、 营业收入 | 万元 | 1150.74 | 1399.61 | 2705.22 |
| 九、 净利润 | 万元 | 1152.4 | 1941.05 | 2216.17 |
| 十、 现金流量净额 | 万元 | 276.11 | 538.23 | 62.62 |
| 十一、 主要财务指标 | | -137.7 | 142.84 | -65.93 |
| 1. 净资产收益率 | % | | | |
| 2. 总资产报酬率 | % | 32.46% | 38.75% | 6.86% |
| 3. 主营业务利润率 | % | 16.27% | 22.48% | 5.18% |
| 4. 资产负债率 | % | 23.97% | 27.73% | 47.43% |
| 5. 流动比率 | % | 57.50% | 50.19% | 74.77% |
| 6. 速动比率 | % | 149.21% | 133.52% | 119.77% |

注：1. 投标人应根据招标文件第二章“投标人须知”第 3.5.2 项的要求在本表后附相关证明材料。

2. 本表所列数据必须与本表各附件中的数据相一致。

1、2022年财务审计报告

西峡县正通公路养护有限公司 2022 年度财务报表审计报告

南阳财和审字（2023）第 142 号



审计机构：南阳财和会计师事务所有限公司

二〇二三年七月二十八日

目 录

| 内 容 | 页 次 |
|-------------|-----|
| 一、审计报告 | 1-4 |
| 二、已审财务报表 | |
| 1. 资产负债表 | |
| 2. 利润表 | |
| 3. 现金流量表 | |
| 4. 所有者权益变动表 | |
| 5. 财务报表附注 | |
| 三、资格证明 | |
| 1. 营业执照 | |
| 2. 执业证书 | |
| 3. 注册会计师证书 | |
| | |
| | |
| | |

审计报告

南阳财和审字[2023]第 142 号

西峡县正通公路养护有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了西峡县正通公路养护有限公司（以下简称正通养护公司）财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的资产负债表，2022 年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了正通养护公司 2022 年 12 月 31 日的财务状况以及 2022 年度的经营成果。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于正通养护公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、其他信息

正通养护公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信

息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

四、管理层和治理层对财务报表的责任

正通养护公司管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估正通养护公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算正通养护公司、终止运营或别无其他现实的选择。治理层负责监督正通养护公司的财务报告过程。

五、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存

在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对正通养护公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情

况可能导致正通养护公司不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

南阳财和会计师事务所有限公司
河南 南阳



中国注册会计师: 

中国注册会计师: 

二〇二三年七月二十八日

资产负債表

日期: 2022年12月31日

| 资产 | 行次 | 期末余额 | 年初余额 | 负债和所有者权益 | 行次 | 期末余额 | 年初余额 |
|----------|----|---------------|---------------|-----------------|----|---------------|---------------|
| 流动资产: | | | | 流动负债: | | | |
| 货币资金 | 1 | 37,082.93 | 1,414,048.92 | 短期借款 | 31 | 0.00 | 0.00 |
| 短期投资 | 2 | 0.00 | 0.00 | 应付票据 | 32 | 0.00 | 0.00 |
| 应收票据 | 3 | 0.00 | 0.00 | 应付账款 | 33 | 0.00 | 0.00 |
| 应收账款 | 4 | 11,203,173.88 | 11,012,209.00 | 预收账款 | 34 | 0.00 | 282,000.00 |
| 预付账款 | 5 | -287,140.85 | -93,691.14 | 应付职工薪酬 | 35 | 0.00 | 0.00 |
| 应收股利 | 6 | 0.00 | 0.00 | 应交税费 | 36 | 277,355.50 | 220,945.47 |
| 应收利息 | 7 | 0.00 | 0.00 | 应付利息 | 37 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款 | 8 | 1,907.00 | 40,000.00 | 应付利润 | 38 | 0.00 | 0.00 |
| 存货 | 9 | 56,280.78 | 56,280.78 | 其他应付款 | 39 | 11,230,049.57 | 7,703,191.57 |
| 其中: 原材料 | 10 | 0.00 | 0.00 | 其他流动负债 | 40 | 0.00 | 0.00 |
| 在产品 | 11 | 0.00 | 0.00 | 流动负债合计 | 41 | 11,507,405.07 | 8,206,137.04 |
| 库存商品 | 12 | 0.00 | 0.00 | 非流动负债: | | | |
| 周转材料 | 13 | 0.00 | 0.00 | 长期借款 | 42 | 0.00 | 0.00 |
| 其他流动资产 | 14 | 6,159,453.00 | 0.00 | 长期应付款 | 43 | 0.00 | 0.00 |
| 流动资产合计 | 15 | 17,170,756.74 | 12,428,847.56 | 递延收益 | 44 | 0.00 | 0.00 |
| 非流动资产: | | | | 其他非流动负债 | 45 | 0.00 | 0.00 |
| 长期股权投资 | 16 | 0.00 | 0.00 | 非流动负债合计 | 46 | 0.00 | 0.00 |
| 长期股权投资 | 17 | 0.00 | 0.00 | 负债合计 | 47 | 11,507,405.07 | 8,206,137.04 |
| 固定资产原价 | 18 | 944,179.28 | 930,749.28 | | | | |
| 减: 累计折旧 | 19 | 501,311.27 | 308,322.49 | | | | |
| 固定资产账面价值 | 20 | 442,868.01 | 622,426.79 | | | | |
| 在建工程 | 21 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 工程物资 | 22 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 固定资产清理 | 23 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 生物性生物资产 | 24 | 0.00 | 0.00 | 所有者权益(或股东权益): | | | |
| 无形资产 | 25 | 0.00 | 0.00 | 实收资本(或股本) | 48 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 |
| 开发支出 | 26 | 2,400,000.00 | 900,000.00 | 资本公积 | 49 | 0.00 | 0.00 |
| 长期待摊费用 | 27 | | | 盈余公积 | 50 | 0.00 | 0.00 |
| 其他非流动资产 | 28 | 0.00 | 0.00 | 未分配利润 | 51 | 3,506,219.68 | 745,137.31 |
| 非流动资产合计 | 29 | 2,842,868.01 | 1,522,426.79 | 所有者权益(或股东权益)合计 | 52 | 8,506,219.68 | 5,745,137.31 |
| 资产合计 | 30 | 20,013,624.75 | 13,951,274.35 | 负债和所有者权益(或股东权益) | 53 | 20,013,624.75 | 13,951,274.35 |

单位: 元

利润表

2022年度

编制单位：西峡县正通公路养护有限公司

单位：元

| 项目 | 行次 | 本年累计金额 | 上年金额 |
|---------------------|----|---------------|---------------|
| 一、营业收入 | 1 | 11,523,977.45 | 18,178,015.41 |
| 减：营业成本 | 2 | 6,006,366.82 | 16,545,301.84 |
| 税金及附加 | 3 | 50,986.63 | 52,156.94 |
| 其中：消费税 | 4 | 0.00 | 0.00 |
| 营业税 | 5 | 0.00 | 0.00 |
| 城市维护建设税 | 6 | 0.00 | 0.00 |
| 资源税 | 7 | 0.00 | 0.00 |
| 土地增值税 | 8 | 0.00 | 0.00 |
| 城镇土地使用税、房产税、车船税、印花税 | 9 | 0.00 | 0.00 |
| 教育费附加、矿产资源补偿费、排污费 | 10 | 0.00 | 0.00 |
| 销售费用 | 11 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：商品维修费 | 12 | 0.00 | 0.00 |
| 广告费和业务宣传费 | 13 | 0.00 | 0.00 |
| 管理费用 | 14 | 2,702,966.49 | 790,314.63 |
| 其中：开办费 | 15 | 0.00 | 0.00 |
| 业务招待费 | 16 | 0.00 | 0.00 |
| 研究费用 | 17 | 0.00 | 0.00 |
| 财务费用 | 18 | 1,668.89 | -27.23 |
| 其中：利息费用（收入以“-”号填列） | 19 | -82.60 | -27.23 |
| 加：投资收益（损失以“-”号填列） | 20 | 0.00 | 0.00 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 21 | 2,761,988.62 | 790,269.23 |
| 加：营业外收入 | 22 | 0.00 | 86,771.55 |
| 其中：政府补助 | 23 | 0.00 | 0.00 |
| 减：营业外支出 | 24 | 906.25 | 0.00 |
| 其中：坏账损失 | 25 | 0.00 | 0.00 |
| 无法收回的长期债券投资损失 | 26 | 0.00 | 0.00 |
| 无法收回的长期股权投资损失 | 27 | 0.00 | 0.00 |
| 自然灾害等不可抗力因素造成的损失 | 28 | 0.00 | 0.00 |
| 税收滞纳金 | 29 | 906.25 | 0.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 30 | 2,761,082.37 | 877,040.78 |
| 减：所得税费用 | 31 | 0.00 | 0.00 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 32 | 2,761,082.37 | 877,040.78 |



现金流量表

编制单位:西峡县正通公路养护有限公司

2022年度

单位:元

| 项 目 | 行次 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------------------------|----|---------------|---------------|
| 一、经营活动产生的现金流量: | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1 | 11,333,012.57 | 17,865,686.44 |
| 收到的税费返还 | 3 | - | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8 | | |
| 现金流入小计 | 9 | 11,333,012.57 | 17,865,686.44 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 10 | 6,006,366.82 | 16,545,301.84 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12 | | |
| 支付的各项税费 | 13 | 50,986.63 | 52,156.94 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 18 | 6,637,526.22 | 1,532,230.91 |
| 现金流出小计 | 20 | 12,694,879.67 | 18,129,689.69 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 21 | -1,361,867.10 | -264,003.25 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | | |
| 收回投资所收到的现金 | 22 | | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 23 | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 25 | | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 28 | | |
| 现金流入小计 | 29 | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 30 | 13,430.00 | 266,618.12 |
| 投资所支付的现金 | 31 | | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 35 | | |
| 现金流出小计 | 36 | 13,430.00 | 266,618.12 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 37 | -13,430.00 | -266,618.12 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | | | |
| 吸收投资所收到的现金 | 38 | - | |
| 借款所收到的现金 | 40 | | |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 43 | | |
| 现金流入小计 | 44 | - | - |
| 偿还债务所支付的现金 | 45 | | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 46 | 1,668.89 | -27.23 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 52 | | |
| 现金流出小计 | 53 | 1,668.89 | -27.23 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 54 | -1,668.89 | 27.23 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | 55 | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 56 | -1,376,965.99 | -530,594.14 |
| 六、现金及现金等价物净增加情况: | | | |
| 现金的期末余额 | 79 | 37,082.93 | 1,414,048.92 |
| 减: 现金的期初余额 | 80 | 1,414,048.92 | 1,944,643.06 |
| 加: 现金等价物的期末余额 | 81 | | |
| 减: 现金等价物的期初余额 | 82 | | |
| 现金及现金等价物净增加额 | 83 | -1,376,965.99 | -530,594.14 |

所有者权益（股东权益）变动表

单位：元

2022年1 - 12月

编制单位：西峡县后通公路养护有限公司

| 项目 | 实收资本（或股本） | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
|-----------------------|--------------|--------|-----|----|------|-------|--------|------|------|--------------|--------------|
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 5,000,000.00 | | | | | | | | | 745,137.31 | 5,745,137.31 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 5,000,000.00 | | | | | | | | | 745,137.31 | 5,745,137.31 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | | | | | | | | | | 2,761,082.37 | 2,761,082.37 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | 2,761,082.37 | 2,761,082.37 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | - |
| 1.所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | - |
| 2.其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | - |
| 3.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | - |
| 4.其他 | | | | | | | | | | | - |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | | | |
| 1.提取盈余公积 | | | | | | | | | | | |
| 2.对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | |
| 3.其他 | | | | | | | | | | | |
| （四）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | |
| 1.资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | |
| 2.盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | |
| 3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | |
| 4.其他 | | | | | | | | | | | |
| （五）专项储备 | | | | | | | | | | | |
| 1.本期提取 | | | | | | | | | | | |
| 2.本期使用 | | | | | | | | | | | |
| （六）其他 | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 5,000,000.00 | | | | | | | | | 3,506,219.68 | 8,506,219.68 |

西峡县正通公路养护有限公司

2022 年度会计报表附注

一、公司简介

西峡县正通公路养护有限公司（以下简称“贵公司”）统一信用代码：91411323MA45W8TBXW，是由西峡县公路事业发展中心出资组建。法定代表人：张双成。注册资本 1000 万元，有限责任公司（国有独资），住所：西峡县五里桥镇北堂村，主要经营：公路养护工程施工、公路设施的维修、安装及保养、公路绿化等。

二、公司采用的主要会计政策、会计估计和会计报表的编制方法：

- 1、会计制度：《小企业会计准则》。
- 2、会计年度：公历 1 月 1 日至 12 月 31 日。
- 3、记账本位币：人民币元。
- 4、记账原则和计价基础：记账原则为权责发生制，计价基础为历史成本。
- 5、会计报表的编制方法：按照会计报表的要求编制。

6、固定资产计价和折旧方法：固定资产按其形成过程的实际成本计价。固定资产标准：房屋建筑物；使用期超过一年的机器、机械运输工具及其他与生产经营有关的设备、器具或单位价值 2000 元以上、使用期超过二年的不属于生产经营主要设备的物品。固定资产按直线法计提折旧。

7、收入确认原则：公司已将商品所有权上的风险与报酬转移给买方，公司不在对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与销售商品有关的成本能够可靠低计量时，确认营业收入的实现。

三、税项

- 1、增值税 9%；
- 2、城市维护建设税：5%；
- 3、教育费附加：3%；
- 地方教育费附加 2%；
- 4、所得税：25%。

四、报表主要项目注释

（一）资产负债表有关项目注释

1、货币资金

| 项目 | 2021 年 12 月 31 日 | 2022 年 12 月 31 日 |
|----|------------------|------------------|
|----|------------------|------------------|

| | | |
|------|------------|----------|
| 现金 | | |
| 银行存款 | 1414048.92 | 37082.93 |
| 合计 | 1414048.92 | 37082.93 |

2、应收账款：年初余额 11012209.00 元，年末余额 11203173.88 元。其中（期末余额前三名）：

| 项 目 | 年末余额 |
|---------------|-------------|
| 河南省中州公路工程有限公司 | 10324143.18 |
| 西峡县公路事业发展中心 | 829030.70 |
| 西峡县洪岩建材购销部 | 50000.00 |

3、预付账款：年初余额-93691.14 元，年末余额-287140.85 元。

4、其他应收款：年初余额 40,000.00 元，年末余额 1907.00 元。

5、存货：年初余额 56280.78 元，年末余额 56280.78 元。

6、其他流动资产：年初余额 0 元，年末余额 6159453.00 元。

7、固定资产：

| 项目 | 2021 年 12 月 31 日 | 2022 年 12 月 31 日 |
|------|------------------|------------------|
| 账面原值 | 930749.28 | 944179.28 |
| 累计折旧 | 308322.49 | 501311.27 |
| 账面净值 | 622426.79 | 442868.01 |

8、开发支出：年初余额 900000.00 元，年末余额 2400000.00 元。

9、预收账款：年初余额 282000 元，年末余额 0 元。

10、应交税金：年初余额 220945.47 元，年末余额 277355.50 元。

11、其他应付款：年初余额 7703191.57 元，年末余额 11230049.57 元。

其中（期末余额前三名）：

| 项 目 | 年末余额 |
|-------------|--------------|
| 租赁费 | 2,552,000.00 |
| 西峡县公路事业发展中心 | 5855916.00 |
| 住房公积金 | 778008.00 |

12、实收资本：年初余额 5,000,000.00 元，年末余额 5,000,000.00 元。系西峡县公路事业发展中心出资。

13、未分配利润：年初余额 745,137.31 元，年末余额 3506219.68 元。

(二) 利润及利润分配表有关项目注释

- 1、主营业务收入：2022 年度累计发生额 11523977.45 元。
- 2、主营业务成本：2022 年度累计发生额 6006366.82 元。
- 3、主营业税金及附加：2022 年度累计发生额 50986.63 元。
- 4、管理费用：2022 年度累计发生额 2702966.49 元。
- 5、财务费用：2022 年度累计发生额 1668.89 元。
- 6、营业外支出：2022 年度累计发生额 906.25 元。

(三) 现金流量表有关项目注释

本年度总现金流入 1133.30 万元，总现金流出 1270.99 万元，现金净流量-137.70 万元。其中：经营活动现金流入 1133.30 万元，经营活动现金流出 1269.48 万元，经营活动现金净流量-136.19 万元。投资活动现金流入 0 万元，投资活动现金流出 1.34 万元，投资活动现金净流量-1.34 万元；筹资活动现金流入 0 万元，筹资活动现金流出 0.17 万元，筹资活动现金净流-0.17 万元。

五、或有负债：公司截止 2022 年 12 月 31 日无对外披露的或有事项。

六、重大期后事项：公司截止 2022 年 12 月 31 日无期后事项。

上述二 0 二二年度公司会计报表和会计报表有关附注，系我们按企业会计准则等有关规定及补充编制。

企业名称：西峡县正通公路养护有限公司

企业地址：西峡县五里桥镇北堂村。

企业法人：张双成

企业财务负责人：王颖

声明：本人（以及本人所代表的机构）承诺本报告及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带法律责任。

西峡县正通公路养护有限公司

法定代表人：

2023 年 7 月 28 日



统一社会信用代码
914113237066748086

营业执照

(副本) 1-1

扫描二维码登录
“国家企业信用
信息公示系统”，
了解更多登记、
备案、许可、监
管信息。



| | | | |
|-------|---|------|-------------|
| 名称 | 南阳财和会计师事务所有限公司 | 注册资本 | 壹佰万圆整 |
| 类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 成立日期 | 1999年05月19日 |
| 法定代表人 | 宋建敏 | 营业期限 | 长期 |
| 经营范围 | 审计、验资、司法会计鉴定、咨询、工程预决算审计及法律、行政法规规定的其它审计业务、政府采购代理业务(凭有效资质证经营)*** (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | | |
| 住所 | 县城莲花北路 | | |



登记机关

2021年05月14日



国家市场监督管理总局监制

国家企业信用信息公示系统网址:
<http://www.gsxt.gov.cn>

证书序号: 0009794

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

会计师事务所 执业证书

名称: 南阳财和会计师事务所有限公司

首席合伙人:

主任会计师: 宋建敏


经营场所: 西峡县莲花北路

组织形式: 有限责任

执业证书编号: 41160007

批准执业文号: 豫财会协字(1999)35号

批准执业日期: 1999年09月10日



发证机关

二〇一八年九月十九日

中华人民共和国财政部制



姓名: 程存盈
 Full name: 程存盈
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1948-02-12
 Date of birth: 1948-02-12
 工作单位: 南阳财和会计师事务所有限公司
 Working unit: 南阳财和会计师事务所有限公司
 身份证号码: 412923480212151
 Identity card No.: 412923480212151

03



程存盈 411600070007

年度检验注册
 Annual Renewal Registration



本证书经检验合格继续使用一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.

2021年6月30日

证书编号:
 No. of Certificate

411600070007

批准注册协会:
 Authorized Institute of CPAs

河南省注册会计师协会

发证日期:
 Date of Issuance

1996 年 03 月 28 日
 /y /m /d

年 月 日
 /y /m /d



姓名 Name 李秀芹
性别 Sex 女
出生日期 Date of Birth 1950-12-17
工作单位 Working Unit 南阳财和会计师事务所有限公司
身份证号 Identity Card No. 412823195012171523



李秀芹 411600070006

年度检验注册
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格止有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



2021年6月30日

证书编号:
No. of Certificate

411600070006

批准注册协会: 河南省注册会计师协会
Authorized Inst: As

发证日期:
Date of Issuance

2011 年 04 日 18
/y /m /d

年 月 日
/y /m /d

2、2023年财务审计报告

西峡县正通公路养护有限公司 2023 年度财务报表审计报告

南阳财和审字（2024）第 A024 号



审计机构：南阳财和会计师事务所有限公司

二〇二四年八月二十八日

目 录

| 内 容 | 页 次 |
|-------------|-----|
| 一、审计报告 | 1-4 |
| 二、已审财务报表 | |
| 1. 资产负债表 | |
| 2. 利润表 | |
| 3. 现金流量表 | |
| 4. 所有者权益变动表 | |
| 5. 财务报表附注 | |
| 三、资格证明 | |
| 1. 营业执照 | |
| 2. 执业证书 | |
| 3. 注册会计师证书 | |
| | |
| | |
| | |

审计报告

南阳财和审字[2024]第 A024 号

西峡县正通公路养护有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了西峡县正通公路养护有限公司（以下简称正通养护公司）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的资产负债表，2023 年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了正通养护公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成果。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于正通养护公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、其他信息

正通养护公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信

息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

四、管理层和治理层对财务报表的责任

正通养护公司管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估正通养护公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算正通养护公司、终止运营或别无其他现实的选择。治理层负责监督正通养护公司的财务报告过程。

五、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存

在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对正通养护公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情

况可能导致正通养护公司不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

南阳财和会计师事务所有限公司

河南 南阳



中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇二四年八月二十八日

资产负债表

日期：2023年12月31日

编制单位：西峡县正通公路养护有限公司

单位：元

会小企01表

| 资产 | 行次 | 期末余额 | 年初余额 | 负债和所有者权益 | 行次 | 期末余额 | 年初余额 |
|----------|----|---------------|---------------|-------------------|----|---------------|---------------|
| 流动资产： | | | | 流动负债： | | | |
| 货币资金 | 1 | 1,428,377.68 | 37,082.93 | 短期借款 | 31 | | |
| 短期投资 | 2 | | | 应付票据 | 32 | | |
| 应收票据 | 3 | | | 应付账款 | 33 | | |
| 应收账款 | 4 | 11,701,311.70 | 11,203,173.88 | 预收账款 | 34 | | |
| 预付账款 | 5 | -657,803.62 | -287,140.85 | 应付职工薪酬 | 35 | | |
| 应收股利 | 6 | | | 应交税费 | 36 | 385,588.98 | 277,355.50 |
| 应收利息 | 7 | | | 应付利息 | 37 | | |
| 其他应收款 | 8 | 0.00 | 1,907.00 | 应付利润 | 38 | | |
| 存货 | 9 | 56,280.78 | 56,280.78 | 其他应付款 | 39 | 13,610,503.55 | 11,230,049.57 |
| 其中：原材料 | 10 | | | 其他流动负债 | 40 | | |
| 在产品 | 11 | | | 流动负债合计 | 41 | 13,996,092.53 | 11,507,405.07 |
| 库存商品 | 12 | | | 非流动负债： | | | |
| 周转材料 | 13 | | | 长期借款 | 42 | | |
| 其他流动资产 | 14 | 6,159,453.00 | 6,159,453.00 | 长期应付款 | 43 | | |
| 流动资产合计 | 15 | 18,687,619.54 | 17,170,756.74 | 递延收益 | 44 | | |
| 非流动资产： | | | | 其他非流动负债 | 45 | | |
| 长期债券投资 | 16 | | | 非流动负债合计 | 46 | | |
| 长期股权投资 | 17 | | | 负债合计 | 47 | 13,996,092.53 | 11,507,405.07 |
| 固定资产原价 | 18 | 1,071,081.94 | 944,179.28 | | | | |
| 减：累计折旧 | 19 | 705,715.01 | 501,311.27 | | | | |
| 固定资产账面价值 | 20 | 365,366.93 | 442,868.01 | | | | |
| 在建工程 | 21 | | | | | | |
| 工程物资 | 22 | | | | | | |
| 固定资产清理 | 23 | | | | | | |
| 生物性生物资产 | 24 | | | 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 无形资产 | 25 | | | 实收资本（或股本） | 48 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 |
| 开发支出 | 26 | 8,831,652.00 | 2,400,000.00 | 资本公积 | 49 | | |
| 长期待摊费用 | 27 | | | 盈余公积 | 50 | | |
| 其他非流动资产 | 28 | | | 未分配利润 | 51 | 8,888,545.94 | 3,506,219.68 |
| 非流动资产合计 | 29 | 9,197,018.93 | 2,842,868.01 | 所有者权益（或股东权益）合计 | 52 | 13,888,545.94 | 8,506,219.68 |
| 资产合计 | 30 | 27,884,638.47 | 20,013,624.75 | 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 53 | 27,884,638.47 | 20,013,624.75 |

单位负责人：张双成

财务负责人：王颖

制表人：吕晗

利润表

会小企02表

编制单位：西峡县正通公路养护有限公司

2023年度

单位：元

| 项目 | 行次 | 本年累计金额 | 上年金额 |
|---------------------|----|---------------|---------------|
| 一、营业收入 | 1 | 19,410,557.77 | 11,523,977.45 |
| 减：营业成本 | 2 | 12,972,612.96 | 6,006,366.82 |
| 税金及附加 | 3 | 32,920.52 | 50,986.63 |
| 其中：消费税 | 4 | | |
| 营业税 | 5 | | |
| 城市维护建设税 | 6 | | |
| 资源税 | 7 | | |
| 土地增值税 | 8 | | |
| 城镇土地使用税、房产税、车船税、印花税 | 9 | | |
| 教育费附加、矿产资源补偿费、排污费 | 10 | | |
| 销售费用 | 11 | | |
| 其中：商品维修费 | 12 | | |
| 广告费和业务宣传费 | 13 | | |
| 管理费用 | 14 | 1,019,902.24 | 2,702,966.49 |
| 其中：开办费 | 15 | | |
| 业务招待费 | 16 | | |
| 研究费用 | 17 | | |
| 财务费用 | 18 | 2,524.10 | 1,668.89 |
| 其中：利息费用（收入以“-”号填列） | 19 | | -82.60 |
| 加：投资收益（损失以“-”号填列） | 20 | | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 21 | 5,382,597.95 | 2,761,988.62 |
| 加：营业外收入 | 22 | | |
| 其中：政府补助 | 23 | | |
| 减：营业外支出 | 24 | 271.69 | 906.25 |
| 其中：坏账损失 | 25 | | |
| 无法收回的长期债券投资损失 | 26 | | |
| 无法收回的长期股权投资损失 | 27 | | |
| 自然灾害等不可抗力因素造成的损失 | 28 | | |
| 税收滞纳金 | 29 | 0.00 | 906.25 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 30 | 5,382,326.26 | 2,761,082.37 |
| 减：所得税费用 | 31 | | |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 32 | 5,382,326.26 | 2,761,082.37 |

单位负责人：张双成

财务负责人：王颖

制表人：吕晗

现金流量表

会小企03表

编制单位:西峡县正通公路养护有限公司

2023年度

单位:元

| 项目 | 行次 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------------------------|----|---------------|---------------|
| 一、经营活动产生的现金流量: | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1 | 18,912,419.95 | 11,333,012.57 |
| 收到的税费返还 | 3 | - | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8 | | |
| 现金流入小计 | 9 | 18,912,419.95 | 11,333,012.57 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 10 | 12,972,612.96 | 6,006,366.82 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12 | | |
| 支付的各项税费 | 13 | 32,920.52 | 50,986.63 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 18 | 4,386,164.96 | 6,637,526.22 |
| 现金流出小计 | 20 | 17,391,698.44 | 12,694,879.67 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 21 | 1,520,721.51 | -1,361,867.10 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | | |
| 收回投资所收到的现金 | 22 | | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 23 | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 25 | | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 28 | | |
| 现金流入小计 | 29 | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 30 | 126,902.66 | 13,430.00 |
| 投资所支付的现金 | 31 | | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 35 | | |
| 现金流出小计 | 36 | 126,902.66 | 13,430.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 37 | -126,902.66 | -13,430.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | | | |
| 吸收投资所收到的现金 | 38 | - | |
| 借款所收到的现金 | 40 | | |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 43 | | |
| 现金流入小计 | 44 | - | - |
| 偿还债务所支付的现金 | 45 | | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 46 | 2,524.10 | 1,668.89 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 52 | | |
| 现金流出小计 | 53 | 2,524.10 | 1,668.89 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 54 | -2,524.10 | -1,668.89 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | 55 | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 56 | 1,391,294.75 | -1,376,965.99 |
| 六、现金及现金等价物净增加情况: | | | |
| 现金的期末余额 | 79 | 1,428,377.68 | 37,082.93 |
| 减: 现金的期初余额 | 80 | 37,082.93 | 1,414,048.92 |
| 加: 现金等价物的期末余额 | 81 | | |
| 减: 现金等价物的期初余额 | 82 | | |
| 现金及现金等价物净增加额 | 83 | 1,391,294.75 | -1,376,965.99 |

单位负责人: 张双成

财务负责人: 王颖

制表人: 吕晗

所有者权益（股东权益）变动表

会小企04表

单位：元

编制单位：通城县正通公路养护有限公司

2023年1 - 12月

| 项目 | 实收资本（或股本） | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
|-----------------------|--------------|--------|-----|----|------|-------|--------|------|------|--------------|---------------|
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 5,000,000.00 | | | | | | | | | 3,506,219.68 | 8,506,219.68 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 5,000,000.00 | | | | | | | | | 3,506,219.68 | 8,506,219.68 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | | | | | | | | | | 5,382,326.26 | 5,382,326.26 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | 5,382,326.26 | 5,382,326.26 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | |
| 1.所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | |
| 2.其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | |
| 3.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | |
| 4.其他 | | | | | | | | | | | |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | | | |
| 1.提取盈余公积 | | | | | | | | | | | |
| 2.对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | |
| 3.其他 | | | | | | | | | | | |
| （四）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | |
| 1.资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | |
| 2.盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | |
| 3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | |
| 4.其他 | | | | | | | | | | | |
| （五）专项储备 | | | | | | | | | | | |
| 1.本期提取 | | | | | | | | | | | |
| 2.本期使用 | | | | | | | | | | | |
| （六）其他 | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 5,000,000.00 | | | | | | | | | 8,888,545.94 | 13,888,545.94 |

单位负责人：张双成

财务负责人：王颖

制表人：吕晗

西峡县正通公路养护有限公司

2023 年度会计报表附注

一、公司简介

西峡县正通公路养护有限公司（以下简称“贵公司”）统一信用代码：91411323MA45W8TBXW，是由西峡县公路事业发展中心出资组建。法定代表人：张双成。注册资本 1000 万元，有限责任公司（国有独资），住所：西峡县五里桥镇北堂村，主要经营：路基路面养护作业，公路管理与养护，建设工程施工等。

二、公司采用的主要会计政策、会计估计和会计报表的编制方法：

- 1、会计制度：《小企业会计准则》。
- 2、会计年度：公历 1 月 1 日至 12 月 31 日。
- 3、记账本位币：人民币元。
- 4、记账原则和计价基础：记账原则为权责发生制，计价基础为历史成本。
- 5、会计报表的编制方法：按照会计报表的要求编制。
- 6、固定资产计价和折旧方法：固定资产按其形成过程的实际成本计价。

固定资产标准：房屋建筑物；使用期超过一年的机器、机械运输工具及其他与生产经营有关的设备、器具或单位价值 2000 元以上、使用期超过二年的不属于生产经营主要设备的物品。固定资产按直线法计提折旧。

7、收入确认原则：公司已将商品所有权上的风险与报酬转移给买方，公司不在对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与销售商品有关的成本能够可靠低计量时，确认营业收入的实现。

三、税项

- 1、增值税 9%；
- 2、城市维护建设税：5%
- 3、教育费附加：3%
- 地方教育费附加 2%
- 4、所得税：25%。

四、报表主要项目注释

（一）资产负债表有关项目注释

- 1、货币资金

| 项目 | 2022 年 12 月 31 日 | 2023 年 12 月 31 日 |
|------|------------------|------------------|
| 现金 | | |
| 银行存款 | 37,082.93 | 1,428,377.68 |
| 合计 | 37,082.93 | 1,428,377.68 |

2、应收账款：年初余额 11,203,173.88 元，年末余额 11,701,311.70 元。

其中：

| 项 目 | 年末余额 |
|---------------|--------------|
| 河南省中州公路工程有限公司 | 9,902,660.01 |
| 西峡县公路事业发展中心 | 1,736,951.69 |

3、预付账款：年初余额-287,140.85 元，年末余额-657,803.62 元。

4、其他应收款：年初余额 1,907.00 元，年末余额 0 元。

5、存货：年初余额 56,280.78 元，年末余额 56,280.78 元。

6、固定资产：

| 项目 | 2022 年 12 月 31 日 | 2023 年 12 月 31 日 |
|------|------------------|------------------|
| 账面原值 | 944,179.28 | 1,071,081.94 |
| 累计折旧 | 501,311.27 | 705,715.01 |
| 账面净值 | 442,868.01 | 365,366.93 |

7、开发支出：年初余额 2,400,000.00 元，年末余额 8,831,652.00 元。

8、应交税金：年初余额 277,355.50 元，年末余额 385,588.98 元。

9、其他应付款：年初余额 11,230,049.57 元，年末余额 13,610,503.55 元。

其中（期末余额前三名）：

| 项 目 | 年末余额 |
|---------------|--------------|
| 西峡县公路事业发展中心 | 6,159,772.43 |
| 西峡县旭源建筑工程有限公司 | 1,130,193.00 |
| 南阳华顺劳务分包有限公司 | 900,065.00 |

10、实收资本：年初余额 5,000,000.00 元，年末余额 5,000,000.00 元。

系西峡县公路事业发展中心出资。

11、未分配利润：年初余额 3,506,219.68 元，年末余额 8,888,545.94 元。

（二）利润及利润分配表有关项目注释

1、主营业务收入：2023 年度累计发生额 19,410,557.77 元。

- 2、主营业务成本：2023 年度累计发生额 12,972,612.96。
- 3、主营业税金及附加：2023 年度累计发生额 32,920.52 元。
- 4、管理费用：2023 年度累计发生额 1,019,902.24 元。
- 5、财务费用：2023 年度累计发生额 2,524.1 元。
- 6、营业外支出：2023 年度累计发生额 271.69 元。

(三) 现金流量表有关项目注释

本年度总现金流入 1891.24 万元，总现金流出 1752.11 万元，现金净流量 139.13 万元。其中：经营活动现金流入 1891.24 万元，经营活动现金流出 1739.17 万元，经营活动现金净流量 152.07 万元。投资活动现金流入 0 万元，投资活动现金流出 12.69 万元，投资活动现金净流量-12.69 万元；筹资活动现金流入 0 万元，筹资活动现金流出-0.25 万元，筹资活动现金净流 0.25 万元。

五、或有负债：公司截止 2023 年 12 月 31 日无对外披露的或有事项。

六、重大期后事项：公司截止 2023 年 12 月 31 日无期后事项。

上述二 0 二三年度公司会计报表和会计报表有关附注，系我们按企业会计准则等有关规定及补充编制。

企业名称：西峡县正通公路养护有限公司

企业地址：西峡县五里桥镇北堂村。

企业法人：张双成

企业财务负责人：王颖

声明：本人（以及本人所代表的机构）承诺本报告及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带法律责任。

西峡县正通公路养护有限公司

法定代表人

2024 年 8 月 28 日



统一社会信用代码
914113237066748086

营业执照

(副本) 1-1



扫描二维码登录
“国家企业信用
信息公示系统”，
了解更多登记、
备案、许可、监
管信息。

| | | | |
|-------|--|------|-------------|
| 名称 | 南阳财和会计师事务所有限公司 | 注册资本 | 壹佰万圆整 |
| 类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 成立日期 | 1999年05月19日 |
| 法定代表人 | 宋建敏 | 营业期限 | 长期 |
| 经营范围 | 审计、验资、司法会计鉴定、咨询、工程预决算审计及法律、行政法规规定的其它审计业务、政府采购代理业务(凭有效资质经营)****(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | | |
| 住所 | 县城莲花北路 | | |



登记机关

2021年05月14日

国家市场监督管理总局监制

http://www.gsxt.gov.cn

国家企业信用信息公示系统网址:

证书序号 0009794

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

会计师事务所 执业证书

名称：南阳财和会计师事务所有限公司

首席合伙人：

主任会计师：宋建敏

经营场所：西峡县莲花北路

组织形式：有限责任

执业证书编号：41160007

批准执业文号：豫财会协字(1999)35号

批准执业日期：1999年09月10日



发证机关

二〇一八年九月十九日


中华人民共和国财政部制



程存盈
Full Name
男
Sex
1948-02-12
Date of Birth
南阳财和会计师事务所有限公司
Working Unit
412923400212151
Identity Card No.



程存盈 411600070007



2021年6月30日

证书编号: 411600070007
No. of Certificate
批准注册协会: 河南省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期: 1996 年 03 月 28 日
Date of Issuance

年 月 日
/ /



姓名: 李秀芹
 性别: 女
 出生日期: 1950-12-17
 工作单位: 南阳财和会计师事务所有限公司
 身份证号: 412823195012171523
 执业证书号: 411600070006



李秀芹 411600070006

年度检验注册
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格继续使用一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.



2021年6月30日

证书编号: 411600070006
No. of Certificate

批准注册协会: 河南省注册会计师协会
Authorized Instt: Henan Provincial Institute of Certified Public Accountants

发证日期: 2011年04月19日
Date of Issuance

年 月 日

3、2024年财务审计报告

西峡县正通公路养护有限公司

2024 年度审计报告

西峡县正通公路养护有限公司

审 计 报 告

豫冉星审字【2025】第 Z03151 号



审计报告

豫冉星审字【2025】第 Z03151 号

西峡县正通公路养护有限公司：

一、审计意见

我们审计了西峡县正通公路养护有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的资产负债表，2024 年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2024 年 12 月 31 日的财务状况以及 2024 年度的经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估贵公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算贵公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

四、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对贵公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充

分,我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而,未来的事项或情况可能导致贵公司不能持续经营。

(五)评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露),并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通,包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

河南冉星会计师事务所(普通合伙)



中国注册会计师:



中国注册会计师:



二〇二五年三月二十五日

资产负债表

编制单位：西峡县正通公路养护有限公司

2024年12月31日

单位：人民币元

| 项 目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|-----|---------------|---------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | (一) | 769,094.20 | 1,428,377.68 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | | |
| 应收账款 | (二) | 16,453,038.30 | 11,701,311.70 |
| 预付款项 | (三) | 96,729.16 | -657,803.62 |
| 其他应收款 | (四) | 15,000,000.00 | |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 存货 | (五) | 82,722.55 | 56,280.78 |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | (六) | | 6,159,453.00 |
| 流动资产合计 | | 32,401,584.21 | 18,687,619.54 |
| 非流动资产： | | | |
| 可供出售金融资产 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | | | |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | (七) | 364,388.70 | 365,366.93 |
| 在建工程 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 无形资产 | (八) | 3,413,610.72 | |
| 开发支出 | (九) | | 8,831,652.00 |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | | | |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | 3,777,999.42 | 9,197,018.93 |
| 资产总计 | | 36,179,583.63 | 27,884,638.47 |

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

资产负债表（续）

编制单位：西峡县正通公路养护有限公司

2024年12月31日

单位：人民币元

| 项 目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|------|---------------|---------------|
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | （十） | 15,000,000.00 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | | |
| 应付账款 | （十一） | 80,941.88 | |
| 预收款项 | | | |
| 应付职工薪酬 | （十二） | 1,635,867.25 | |
| 应交税费 | （十三） | 359,817.21 | 385,588.98 |
| 其他应付款 | （十四） | 9,975,577.92 | 13,610,503.55 |
| 其中：应付利息 | | | |
| 应付股利 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | | |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | 27,052,204.26 | 13,996,092.53 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | | | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | | |
| 负债合计 | | 27,052,204.26 | 13,996,092.53 |
| 所有者权益： | | | |
| 实收资本 | （十五） | 8,501,139.20 | 5,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | | | |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | （十六） | 62,624.02 | |
| 未分配利润 | （十七） | 563,616.15 | 8,888,545.94 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 9,127,379.37 | 13,888,545.94 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 36,179,583.63 | 27,884,638.47 |

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

现金流量表

编制单位：西峡县正通公路养护有限公司

2024年度

单位：人民币元

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------------|----------------|---------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 17,171,060.00 | 18,912,419.95 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 46,209,058.43 | |
| 经营活动现金流入小计 | 63,380,118.43 | 18,912,419.95 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,976,494.56 | 12,972,612.96 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,900,309.64 | |
| 支付的各项税费 | 1,099,051.81 | 32,920.52 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 61,729,553.70 | 4,386,164.96 |
| 经营活动现金流出小计 | 76,705,409.71 | 17,391,698.44 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -13,325,291.28 | 1,520,721.51 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,051,214.77 | 126,902.66 |
| 投资支付的现金 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,051,214.77 | 126,902.66 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,051,214.77 | -126,902.66 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 811,139.20 | |
| 取得借款收到的现金 | 30,000,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 30,811,139.20 | |
| 偿还债务支付的现金 | 15,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,093,916.63 | 2,524.10 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 17,093,916.63 | 2,524.10 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 13,717,222.57 | -2,524.10 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -659,283.48 | 1,391,294.75 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,428,377.68 | 37,082.93 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 769,094.20 | 1,428,377.68 |

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

所有者权益变动表

单位：人民币元

编制单位：西峡县正通公路养护有限公司

2024年度

| 项 目 | 本 期 | | | | | | |
|-----------------------|--------------|--------|------|-------|--------|------|---------------|
| | 实收资本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 |
| 一、上年期末余额 | 5,000,000.00 | | | | | | 8,888,545.94 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 5,000,000.00 | | | | | | 8,888,545.94 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | 3,501,139.20 | | | | | | -8,324,929.79 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | 62,624.02 |
| （二）所有者投入和减少资本 | 3,501,139.20 | | | | | | |
| 1.所有者投入的普通股 | 3,501,139.20 | | | | | | 626,240.20 |
| 2.其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | |
| 3.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | |
| 4.其他 | | | | | | | |
| （三）利润分配 | | | | | | | |
| 1.提取盈余公积 | | | | | | | 62,624.02 |
| 2.对所有者分配 | | | | | | | -62,624.02 |
| 3.其他 | | | | | | | |
| （四）所有者权益内部结转 | | | | | | | |
| 1.资本公积转增资本 | | | | | | | |
| 2.盈余公积转增资本 | | | | | | | |
| 3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | |
| 4.设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | |
| 5.其他 | | | | | | | |
| （五）专项储备 | | | | | | | |
| 1.本期提取 | | | | | | | |
| 2.本期使用 | | | | | | | |
| （六）其他 | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 8,501,139.20 | | | | | | 62,624.02 |

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

9,127,375.37

所有者权益变动表

编制单位：西峡县正通公路养护有限公司

2024年度

单位：人民币元

| 项 目 | 上 期 | | | | | |
|-----------------------|--------------|--------|------|-------|--------|------|
| | 实收资本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 |
| 一、上年期末余额 | 5,000,000.00 | | | | | |
| 加：会计政策变更 | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | |
| 其他 | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 5,000,000.00 | | | | | |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | | | | | | |
| （一）综合收益总额 | | | | | | |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | |
| 1.所有者投入的普通股 | | | | | | |
| 2.其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | |
| 3.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | |
| 4.其他 | | | | | | |
| （三）利润分配 | | | | | | |
| 1.提取盈余公积 | | | | | | |
| 2.对所有者的分配 | | | | | | |
| 3.其他 | | | | | | |
| （四）所有者权益内部结转 | | | | | | |
| 1.资本公积转增资本 | | | | | | |
| 2.盈余公积转增资本 | | | | | | |
| 3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | |
| 4.设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | |
| 5.其他 | | | | | | |
| （五）专项储备 | | | | | | |
| 1.本期提取 | | | | | | |
| 2.本期使用 | | | | | | |
| （六）其他 | | | | | | |
| 四、本期末余额 | 5,000,000.00 | | | | | |

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

西峡县正通公路养护有限公司

2024 年度财务报表附注

(本附注金额除特别标明者外,均以人民币元列示)

一、公司基本情况

(一) 企业历史沿革、注册地、组织形式和总部地址

企业名称: 西峡县正通公路养护有限公司(以下简称公司)

统一社会信用代码: 91411323MA45W8TBXW

类型: 有限责任公司(国有控股)

法定代表人: 李永茂

注册资本: 人民币肆仟陆佰万圆整

成立日期: 2018 年 10 月 19 日

登记机关: 南阳市西峡县市场监督管理局

住所: 西峡县五里桥镇北堂村

(二) 经营范围

本公司经营范围: 许可项目: 路基路面养护作业; 公路管理与养护; 建设工程施工; 地质灾害治理工程施工(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。

二、财务报表的编制基础

(一) 编制基础: 本公司财务报表以持续经营为基础,根据实际发生的交易和事项,按照财政部颁布的《企业会计准则》和具体会计准则等规定(以下合称“企业会计准则”),并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

(二) 持续经营: 公司自本报告期末起至少 12 个月内具备持续经营能力,无影响持续经营能力的重大事项。

三、重要会计政策和会计估计

(一) 遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求,真实、完整地反映了本公司 2024

年 12 月 31 日的财务状况、2024 年度的经营成果和现金流量等相关信息。

(二) 会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

(三) 营业周期

本公司以一年 12 个月作为正常营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

(四) 记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

(五) 金融工具

1. 金融工具的分类及确认

金融工具划分为金融资产或金融负债和权益工具。本公司成为金融工具合同的一方时，确认为一项金融资产或金融负债，或权益工具。

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项、可供出售金融资产。除应收款项以外的金融资产的分类取决于本公司及其子公司对金融资产的持有意图和持有能力等。金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以及其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括持有目的为短期内出售的交易性金融资产和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产；可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产；持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

2. 金融工具的计量

本公司金融工具初始确认按公允价值计量。后续计量分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债按公允价值计量；持有到期投资、贷款和应收款项以及其他金融负债按摊余成本计量；在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产或者衍生金融负债，按照成本计量。本公司金融资产或金融负债后续计量中公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变

动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益。②可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益。

3. 本公司对金融工具的公允价值的确认方法

如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。

4. 金融资产负债转移的确认依据和计量方法

金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，或既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产控制的，应当终止确认该项金融资产。金融资产满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值与因转移而收到的对价和原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则应终止确认该金融负债或其一部分。

5. 金融资产减值

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

以成本计量的金融资产发生减值时，应当将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，计提减值准备。发生的减值损失，一经确认，不再转回。

当有客观证据表明可供出售金融资产发生减值时，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入股东权益。

对于权益工具投资，本公司判断其公允价值发生“严重”或“非暂时性”下跌的具体量化标准、成本的计算方法、期末公允价值的确定方法，以及持续下跌期间的确定依据为：

| | |
|-----------------------|----------------------------|
| 公允价值发生“严重”下跌的具体量化标准 | 期末公允价值相对于成本的下跌幅度已达到或超过 50% |
| 公允价值发生“非暂时性”下跌的具体量化标准 | 连续 12 个月出现下跌 |

| | |
|-------------|---|
| 成本的计算方法 | 取得时按支付对价(扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息)和相关交易费用之和作为投资成本 |
| 期末公允价值的确定方法 | 存在活跃市场的金融工具,以活跃市场中的报价确定其公允价值;如不存在活跃市场的金融工具,采用估值技术确定其公允价值。 |
| 持续下跌期间的确定依据 | 连续下跌或在下跌趋势持续期间反弹上扬幅度低于20%,反弹持续时间未超过6个月的均作为持续下跌期间。 |

(六) 应收账款

期末如果有客观证据表明应收款项发生了减值的,则将其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额计算确认减值损失。

本公司的坏账确认标准为:对债务人破产或死亡,以其破产财产或遗产清偿后,仍然不能收回的应收款项;或因债务人逾期未履行其清偿责任,且具有明显特征表明无法收回时经公司批准确认为坏帐。

本公司采用直接核销法核算坏账损失。坏帐发生时,直接计入当期损益。

应收款项转让、质押、贴现等会计处理方法:

以应收债权为质押取得银行借款时,按照实际收到的款项,借记“银行存款”,按照实际支付的手续费,借记“财务费用”科目,按照银行借款本金并考虑借款期限,贷记“短期借款”等科目。

将应收债权出售给银行等金融机构,不附有追索权的,按实际收到的款项,借记“银行存款”等科目,按照预计将发生的销售退回和销售折让(包括现金折扣)的金额,借记“其他应收款”科目,按照应支付的相关手续费的金额,借记“财务费用”科目,按出售应收债权的账面余额,贷记“应收账款”科目,差额借(或贷)记“营业外收入(支出)”科目;附有追索权的,按照以应收债权为质押取得借款的会计处理原则进行处理。

应收债权贴现,比照应收债权出售的会计处理原则进行处理。

(七) 存货

1. 存货的分类

存货分类为:原材料、周转材料、在产品、半成品、库存商品等。

2. 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

3. 取得和发出的计价方法

取得时按实际成本计价,存货发出采用加权平均法核算。

4. 货跌价准备的计提方法

资产负债表日, 公司存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时, 提取存货跌价准备。通常按照单个存货项目计提存货跌价准备; 对于数量繁多、单价较低的存货, 按照存货类别计提存货跌价准备; 与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的, 且难以与其他项目分开计量的存货, 则合并计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的, 减记的金额予以恢复, 并在原已计提的存货跌价准备金额内转回, 转回的金额计入当期损益。

存货可变现净值的确定, 产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货, 以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额, 确定其可变现净值。需要经过加工的材料存货, 以所生产的产品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额, 确定其可变现净值。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货, 其可变现净值以合同价格为基础计算。若持有存货的数量多于销售合同订购数量的, 超出部分存货的可变现净值应当以一般销售价格为基础计算。

(八) 固定资产

1. 固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的, 使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认: 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业; 该固定资产的成本能够可靠地计量。

2. 固定资产分类和折旧方法

本公司固定资产主要分为: 机器设备、电子及办公设备。折旧方法采用年限平均法。根据各类固定资产的性质和使用情况, 确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了, 对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核, 如与原先估计数存在差异的, 进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产, 本公司对所有固定资产计提折旧。

3. 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

融资租入固定资产为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值; 融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。

(九) 职工薪酬

职工薪酬, 是指本公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬

或补偿。职工薪酬主要包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

1. 短期薪酬

在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，企业会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。本公司为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

2. 离职后福利

本公司在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

3. 辞退福利

本公司向职工提供辞退福利时，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

4. 其他长期职工福利

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，应当按照有关设定提存计划的规定进行处理；除此外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

（十）收入

1. 销售商品收入

商品销售收入确认的总体原则

销售商品收入同时满足下列条件的，予以确认：一是公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；二是公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；三是收入的金额能够可靠地计量；四是相关的经济利益很可能流入公司；五是相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

本公司产品销售依据对方签字确认的销售回单确认营业收入，此时商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，且公司不再对已售出的商品实施有效控制。

2. 提供劳务收入

提供劳务收入确认的总体原则

在资产负债表日，提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：一是收入的金额能够可靠地计量；二是相关的经济利益很可能流入企业；三是交易的完工进度能够可靠地确定；四是交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

公司确定提供劳务交易的完工进度，可以选用下列方法：一是已完工作的测量；二是已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例；三是已经发生的成本占估计总成本的比例。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况进行处理：

一是已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。二是已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

3. 让渡资产使用权收入

让渡资产使用权收入同时满足下列条件的，才能予以确认：

一是相关的经济利益很可能流入企业；二是收入的金额能够可靠地计量。

让渡资产使用权收入包括利息收入、使用费收入等。利息收入金额，按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

（十一）政府补助

1. 政府补助的类型及会计处理

政府补助是指本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产（但不包括政府作为所有者投入的资本），政府补助为货币性资产的，应当按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，应当按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

政府文件明确规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助。政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助确认为递延收益。确认为递延收益的金额，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。

除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

本公司取得政策性优惠贷款贴息，财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用；财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

2. 政府补助确认时点

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。按照应收金额计量的政府补助，在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认。除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补助，在实际收到补助款项时予以确认。

（十二）递延所得税资产和递延所得税负债

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。

3. 对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

（十三）主要会计政策变更、会计估计变更的说明

财政部于 2019 年 4 月发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6 号）（以下简称“财务报表格式”），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求 2019 年度及以后期间的财务报表。

四、税项

(一) 主要税种及税率

| 税 种 | 计税依据 | 税 率 |
|---------|---------|-------|
| 增值税 | 应税收入 | 9%、3% |
| 城建税 | 应纳流转税税额 | 5% |
| 教育费附加 | 应纳流转税税额 | 3% |
| 地方教育费附加 | 应纳流转税税额 | 2% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 25% |

五、财务报表主要项目注释

(一) 货币资金

| 项目 | 年末余额 | 年初余额 |
|------|------------|--------------|
| 银行存款 | 769,094.20 | 1,428,377.68 |
| 合计 | 769,094.20 | 1,428,377.68 |

(二) 应收账款

| 项目 | 年末余额 | 年初余额 |
|------|---------------|---------------|
| 应收账款 | 16,453,038.30 | 11,701,311.70 |
| 合计 | 16,453,038.30 | 11,701,311.70 |

(三) 预付款项

| 项目 | 年末余额 | 年初余额 |
|------|-----------|-------------|
| 预付款项 | 96,729.16 | -657,803.62 |
| 合计 | 96,729.16 | -657,803.62 |

(四) 其他应收款

| 项目 | 年末余额 | 年初余额 |
|-------|---------------|------|
| 其他应收款 | 15,000,000.00 | |
| 合计 | 15,000,000.00 | |

(五) 存货

| 存货类别 | 年末数 | 年初数 |
|------|-----------|-----------|
| 原材料 | 78,044.55 | 53,752.78 |
| 库存商品 | 4,678.00 | 2,528.00 |
| 合计 | 82,722.55 | 56,280.78 |

(六) 其他流动资产

| 项目 | 年末余额 | 年初余额 |
|--------|------|--------------|
| 其他流动资产 | | 6,159,453.00 |
| 合计 | | 6,159,453.00 |

(七) 固定资产

| 项 目 | 年初余额 | 本年增加 | 本年减少 | 年末余额 |
|-----------|--------------|------------|-----------|--------------|
| 一、账面原值合计 | 1,071,081.94 | 189,093.81 | | 1,260,175.75 |
| 其中：房屋及建筑物 | | | | |
| 办公设备 | 83,360.53 | 12,400.00 | | 95,760.53 |
| 机械设备 | 639,336.29 | 176,693.81 | | 816,030.10 |
| 电子设备 | | | | |
| 其他 | 348,385.12 | | | 348,385.12 |
| 二、累计折旧合计 | 705,715.01 | 190,072.04 | | 895,787.05 |
| 其中：房屋及建筑物 | | | | |
| 办公设备 | 76,409.15 | 4,730.45 | | 81,139.60 |
| 机械设备 | 333,495.22 | 142,544.49 | | 476,039.71 |
| 电子设备 | | | | |
| 其他 | 295,810.64 | 42,797.10 | | 338,607.74 |
| 三、账面净值合计 | 365,366.93 | 41,818.87 | 42,797.10 | 364,388.70 |
| 其中：房屋及建筑物 | | | | |
| 办公设备 | 6,951.38 | 7,669.55 | | 14,620.93 |
| 机械设备 | 305,841.07 | 34,149.32 | | 339,990.39 |
| 电子设备 | | | | |
| 其他 | 52,574.48 | | 42,797.10 | 9,777.38 |

(八) 无形资产

| 类别 | 年末数 | 年初数 |
|-------|--------------|-----|
| 土地使用权 | 3,413,610.72 | |
| 合计 | 3,413,610.72 | |

(九) 开发支出

| 类别 | 年末数 | 年初数 |
|------|-----|--------------|
| 开发支出 | | 8,831,652.00 |
| 合计 | | 8,831,652.00 |

(十) 短期借款

| 类别 | 年末数 | 年初数 |
|------|---------------|-----|
| 短期借款 | 15,000,000.00 | |
| 合计 | 15,000,000.00 | |

(十一) 应付账款

| 类别 | 年末数 | 年初数 |
|------|-----------|-----|
| 应付账款 | 80,941.88 | |
| 合计 | 80,941.88 | |

(十二) 应付职工薪酬

| 项目 | 年末余额 | 年初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

| | | |
|-----|--------------|--|
| 工资 | 366,836.70 | |
| 社保费 | 1,269,030.55 | |
| 合计 | 1,635,867.25 | |

(十三) 应交税费

| 项目 | 年末余额 | 年初余额 |
|---------|------------|------------|
| 增值税 | 305,834.05 | 366,137.54 |
| 城市维护建设税 | 7,645.85 | 9,153.44 |
| 教育费附加 | 4,587.51 | 5,492.06 |
| 地方教育费附加 | 3,058.34 | 3,661.37 |
| 印花税 | 2,644.85 | 1,144.57 |
| 企业所得税 | 36,046.61 | |
| 合计 | 359,817.21 | 385,588.98 |

(十四) 其他应付款

| 类别 | 年末数 | 年初数 |
|-------|--------------|---------------|
| 其他应付款 | 9,975,577.92 | 13,610,503.55 |
| 合计 | 9,975,577.92 | 13,610,503.55 |

(十五) 实收资本

| 项目 | 年初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 年末余额 |
|-------------|--------------|--------------|------|--------------|
| 西峡县公路事业发展中心 | 5,000,000.00 | 3,501,139.20 | | 8,501,139.20 |
| 合计 | 5,000,000.00 | 3,501,139.20 | | 8,501,139.20 |

(十六) 盈余公积

| 项目 | 年初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 年末余额 |
|--------|------|-----------|------|-----------|
| 法定盈余公积 | | 62,624.02 | | 62,624.02 |
| 合计 | | 62,624.02 | | 62,624.02 |

(十七) 未分配利润

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-------|------------|--------------|
| 未分配利润 | 563,616.15 | 8,888,545.94 |
| 合计 | 563,616.15 | 8,888,545.94 |

(十八) 营业收入和营业成本

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|--------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务小计 | 22,161,714.42 | 19,181,924.29 | 19,410,557.77 | 12,972,612.96 |
| 合计 | 22,161,714.42 | 19,181,924.29 | 19,410,557.77 | 12,972,612.96 |

(十九) 税金及附加

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|-----------|-----------|
| 主营税金及附加 | 55,260.77 | 32,920.52 |
| 合计 | 55,260.77 | 32,920.52 |

(二十) 管理费用

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|--------------|--------------|
| 职工工资 | 1,635,454.00 | 900,606.95 |
| 办公费 | 845,907.19 | 18,994.44 |
| 其他 | 149,232.84 | 100,300.85 |
| 合计 | 2,630,594.03 | 1,019,902.24 |

(二十一) 财务费用

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|---------------|----------|
| 手续费 | 2,097,013.13 | 3,289.00 |
| 利息收入 | -2,465,743.91 | -764.90 |
| 合计 | -368,730.78 | 2,524.10 |

(二十二) 营业外支出

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|--------|--------|
| 其他 | 379.30 | 271.69 |
| 合计 | 379.30 | 271.69 |

(二十三) 所得税费用

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|-----------|-------|
| 所得税费用 | 36,046.61 | |
| 合计 | 36,046.61 | |

六、承诺及或有事项

1、重大承诺事项

截至 2024 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

2、或有事项

截至 2024 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的或有事项。

七、资产负债表日后事项

截至审计报告日，本公司无应披露未披露的资产负债表日后事项。

八、其他重要事项

截至审计报告日，本公司无应披露未披露的其他重要事项。

(本页无正文)

西峡县正通公路养护有限公司

二〇二五年三月二十五日



统一社会信用代码
91410106MA9FK5CW3R

营业执照

扫描二维码
“国家企业信用
信息公示系统”
了解更多登记、
备案、许可、监
管信息。



(副本) 1-2

名称 河南冉星会计师事务所（普通合伙）

成立日期 2020年08月13日

类型 普通合伙企业

合伙期限 长期

执行事务合伙人 杨书通

主要经营场所

郑州市金水区孟农街南、铁东路东综
合楼号楼8层803号

经营范围

审查企业会计报表；出具审计报告；验证
企业资本金；出具验资报告；办理企业合
并、分立、清算事宜中的审计业务、出具
有关的报告；基本建设年度财务决算审
计；法律、行政法规规定的其他审计业
务；代理记账；税务服务；财务咨询。
(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)




登记机关

2020年 11月 13日

国家企业信用信息公示系统网址：
<http://www.gsxt.gov.cn>

国家企业信用信息公示系统公示年度报告

国家市场监督管理总局监制



会计师事务所 执业证书

名称：河南冉星会计师事务所（普通合伙）

首席合伙人：杨书通

主任会计师：

经营场所：

郑州市金水区孟郊街南、银东路东综合楼号
楼8层803号



组织形式：普通合伙

执业证书编号：41010200

批准执业文号：豫财会〔2020〕27号

批准执业日期：2020年12月24日

证书序号：0010036


说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关：



中华人民共和国财政部



张继波

姓 名 Full name 男
性 别 Sex
出生日期 Date of birth 1983-08-01
工作单位 Working unit 河南中星会计师事务所(普通合伙)
身份证号 Identity card No. 410221198308018438



与原证核对一致
再次复印无效

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



证书编号
No. of Certificate

410100740003

批准注册协会：河南省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期：2011 年 04 月 19 日
Date of issuance /y /m /d

年 月 日
/y /m /d



杨书通

姓名 Full name
性别 Sex
出生日期 Date of birth
工作单位 Working unit
身份证号 Identity card No.

与原证核对一致
再行复印无效

1980-07-16

河南中星会计师事务所(普通合伙)

412926198007162094



“中星”

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



证书编号: 310000084621
No. of Certificate

批准注册协会: 河南省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2015 年 11 月 24 日
Date of Issuance /y /m /d

年 月 日
/y /m /d

公司财务会计制度

为了规范本公司的会计核算和财务管理，特制定本制度：

一、库存现金管理。

1. 公司财务部库存现金控制在核定限额内，不得超限额存放现金。
2. 严格执行现金盘点制度，做到日清日结，保证现金的安全。 现金遇有短款，应及时查明原因，报告单位领导，并要追究责任者的责任。
3. 不准用“白条”入账。
4. 不准私人挪用、占用和借用公款现金。
5. 到公司以外金融机构提取或送存现金(限额 1 万元以上)时，需由两名人员乘坐公司汽车前往。
6. 现金出纳员必须严格和妥善保管金库密码和钥匙。
7. 现金出纳员要妥善保管金库内存放的现金和有价证券；私人财物不得存放入内。
8. 现金出纳员必须随时接受开户银行和本单位领导的检查监督。
9. 出纳员必须严格遵守执行上述各条规定。

二、银行存款管理

1. 公司必须遵守中国人民银行的规定，办理银行基本账户和辅助账户的开户和公司各种银行结算业务。
2. 公司必须认真贯彻执行《中国人民银行法》、《中华人民共和国票据法》等相关的结算管理制度。
3. 作废的银行支票由出纳员加盖作废戳记，妥善保存。
4. 银行结算方式根据公司实际情况采取如下几种方式：支票(现金支票、转账支票)、银行汇票、电汇、信汇、银行承兑汇票、委托收款(仅限于水费、电费、电话费结算)，除上述结算方式外，其他不予使用。
5. 从银行取回的各种结算凭证，要及时入账，
6. 公司应按每个银行开户账号建立一本银行存款明细账，出纳员应及时将公司银行存款明细账与银行对账单逐笔进行核对。于每季度末做出银行核对余额调节明细表。
7. 银行出纳员对银行调节明细表所记载的账项必须及时查明原因，对出现的差错通知责任

人进行更正，对未达账项要及时予以清理。造成的账账不一致，应尽快解决。

8. 空白银行支票与预留印鉴必须实行分管。由出纳员逐笔登记，记录所签发支票的用途、使用单位、金额、支票号码等。

三、往来账款的管理

1. 应收账款的管理：公司各销售部门根据形成收入的确定标准及时开据发货票后，由财务部做好账务处理，编制会计记账凭证，登记有关收入和与客户应收账款往来的会计账簿，同时要定期与销售部门进行核对，保证双方账账核对一致。

2. 其他应收款的管理：公司各部门形成的出差借款、采购借款、各部门备用金应于业务发生后及时报销，每年 12 月中旬进行清理。各部门备用金于每年 12 月份中旬清理，进行还旧借新。

3. 应付账款的管理：公司各部门因采购形成的应付票据应及时进行账务处理，登记相应的账簿，定期与相关部门对账，保证双方账账核对一致。

四、内部牵制

1. 公司实行银行支票与银行预留印鉴分管制度。

2. 非出纳人员不能办理现金、银行收付业务。

3. 库存现金和有价证券每季抽查一次。

4. 现金出纳员不得担当制证工作，只能由财务部指定的制单人制单。

供应商：西峡县正通公路养护有限公司（电子签章）

法定代表人：_____（电子签名）

日 期：____2025____年__10__月__31__日

(四) 近年完成的类似项目情况表
业绩一

| | |
|-----------|---|
| 项目名称 | 西峡县2024年普通国省道穿村过镇平交路口治理项目 |
| 项目所在地 | 西峡境内 |
| 发包人名称 | 西峡县公路事业发展中心 |
| 发包人地址 | 西峡县伏牛路西段 |
| 发包人电话 | 方先生 0377-83816903 |
| 合同价格 | 6141141.92元 |
| 开工日期 | 2024年10月28日 |
| 交工日期 | 2024年11月27日 |
| 承担的工作 | G312线、G208线、G209线、G241线、S328线、S329线穿村过镇平交路口治理，共127处 |
| 工程质量 | 合格 |
| 项目经理 | 陈鹏程 |
| 项目总工 | 袁小杰 |
| 总监理工程师及电话 | 常礼达 16637728727 |
| 项目描述 | G312线、G208线、G209线、G241线、S328线、S329线穿村过镇平交路口治理，共127处 |
| 备注 | / |

- 注：1.每张表格只填写一个项目，并标明序号。
- 2.投标人应根据招标文件第二章“投标人须知”第 3.5.3 项的要求在本表后附相关证明材料。
- 3.如近年来，投标人法人机构发生合法变更或重组或法人名称变更时，应提供相关部门的合法批件或其他相关证明材料来证明其所附业绩的继承性。
- 4.以联合体形式参与投标的，联合体各成员应分别填写。

中标通知书

标段(包)编号: E4113231323000006001001

西峡县正通公路养护有限公司:

你方所递交的投标文件,经评标委员会评审,已被我方接受并报上级部门备案,现确定 中标单位: 西峡县正通公路养护有限公司,联合体投标: 无 为中标人。

中标价: 6141141.92 (元) 工期: 30日历天; 工程质量达到规范要求的合格标准;

项目经理: 陈鹏程

特此通知。



2024年10月28日

西峡县 2024 年普通国省道穿村过镇平 交路口治理项目

合同协议书
施工标 合同段
(正本)



西峡县公路事业发展中心
西峡县正通公路养护有限公司
二〇二四年十月二十八日



CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

合 同 协 议 书

_____西峡县公路事业发展中心_____（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施
_____西峡县 2024 年普通国省道穿村过镇平交路口治理项目_____（项目名称），已接
受 _____西峡县公路事业发展中心_____（承包人名称，以下简称“承包人”）对该项目
_____施工_____标段施工的投标。发包人和承包人共同达成如下协议。

1. 本项目为西峡境普通国省道 G312 线、G208 线、G209 线、G241 线、S328
线、S329 线穿村过镇平交路口治理，共 127 处。

2. 下列文件应视为构成合同文件的组成部分：

（1）本协议及各种合同附件（含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和
补充资料）；

（2）中标通知书；

（3）投标函及投标函附录；

（4）项目专用合同条款；

（5）公路工程专用合同条款；

（6）通用合同条款；

（7）工程量清单计量规则；

（8）技术规范；

（9）图纸；

（10）已标价工程量清单；

（11）承包人有关人员、设备投入的承诺及投标文件中的施工组织设计；

（12）其他合同文件。

上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或不一致之处，
以上述文件的排列顺序在先者为准。

3. 根据工程量清单所列的预计数量和单价或总额价计算的签约合同价：人民币
（大写） _____陆佰壹拾肆万壹仟壹佰肆拾壹元玖角贰分_____元（¥6141141.92）。

4. 承包人项目经理：_____陈鹏程_____。承包人项目总工：_____袁小杰_____。

5. 工程质量符合 _____合格_____标准。工程安全目标：_____安全生产零事故_____。

6. 承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。



CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

7. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

8. 承包人应按照监理人指示开工，工期为30日历天。

9. 本协议书由双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖单位章后生效。全部工程完工后经交工验收合格、缺陷责任期满签发缺陷责任终止证书后失效。

10. 本协议书正本二份、副本六份，合同双方各执正本一份，副本三份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

11. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人：西峡县公路事业发展中心

(盖单位章)

法定代表人或其委托代理人：

(签字)

2024 年 10 月 28 日

承包人：西峡县正通公路养护有限公司

(盖单位章)

法定代表人或其委托代理人：

(签字)

2024 年 10 月 28 日



CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

廉政合同

根据《关于在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》以及有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，西峡县 2024 年普通国省道穿村过镇平交路口治理项目（项目名称）的项目法人（项目法人名称，以下简称“发包人”）与该项目 施工 标段的施工单位 西峡县正通公路养护有限公司（施工单位名称，以下简称“承包人”），特订立如下合同。

1. 发包人和承包人双方的权利和义务

（1）严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规及交通运输部的有关规定。

（2）严格执行 西峡县 2024 年普通国省道穿村过镇平交路口治理项目（项目名称）施工 标段施工合同文件，自觉按合同办事。

（3）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。

（4）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

（5）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

（6）发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

2. 发包人的义务

（1）发包人及其工作人员不得索要或接受承包人的礼金、有价证券和贵重物品，不得让承包人报销任何应由发包人或发包人工作人员个人支付的费用等。

（2）发包人工作人员不得参加承包人安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受承包人提供的通信工具、交通工具和高档办公用品等。

（3）发包人及其工作人员不得要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

（4）发包人工作人员及其配偶、子女不得从事与发包人工程有关的材料设备



CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

供应、工程分包、劳务等经济活动等。

(5) 发包人及其工作人员不得以任何理由向承包人推荐分包单位或推销材料，不得要求承包人购买合同规定外的材料和设备。

(6) 发包人工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人施工队伍。

3. 承包人的义务

(1) 承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

(2) 承包人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人单位或个人支付的任何费用。

(3) 承包人不得以任何理由安排发包人工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。

(4) 承包人不得为发包人单位和个人购置或提供通信工具、交通工具和高档办公用品等。

4. 违约责任

(1) 发包人及其工作人员违反本合同第 1、2 条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

(2) 承包人及其工作人员违反本合同第 1、3 条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，发包人建议交通运输主管部门给予承包人一至三年内不得进入其主管的公路建设市场的处罚。

5. 双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察部门负责监督执行。由发包人或发包人上级单位的纪检监察部门约请承包人或承包人上级单位纪检监察部门对本合同执行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。

6. 本合同有效期为发包人和承包人签署之日起至该工程项目竣工验收后止。

7. 本合同作为 西峡县 2024 年普通国省道穿村过镇平交路口治理项目 (项目名称) 标段施工合同的附件，与工程施工合同具有同等的法律效力，经合同双方签署后立即生效。

8. 本合同一式四份，由发包人和承包人各执一份，送交发包人和承包人的监督



CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

单位各一份。

发包人：西峡县公路事业发展中心

(盖单位章)

法定代表人或其委托代理人：

(签字)

2024年 10月 28日

承包人：西峡县正通公路养护有限公司

(盖单位章)

法定代表人或其委托代理人：

(签字)

2024年 10月 28日



CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

安全生产合同

为在 西峡县 2024 年普通国省道穿村过镇平交路口治理项目（项目名称）施工 标段施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目发包人 西峡县公路事业发展中心（发包人名称，以下简称“发包人”）与承包人 西峡县正通公路养护有限公司（承包人名称，以下简称“承包人”）特此签订安全生产合同。

1. 发包人职责

- （1）严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。
- （2）按照“安全第一、预防为主、综合治理”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全同时计划、布置、检查、总结和评比。
- （3）重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。
- （4）定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。
- （5）组织对承包人施工现场进行安全生产检查，监督承包人及时处理发现的各种安全隐患。

2 . 承包人职责

- （1）严格遵守《中华人民共和国安全生产法》《建设工程安全生产管理条例》等国家有关安全生产的法律法规、《公路水运工程安全生产监督管理办法》和《公路工程施工安全技术规范》等有关安全生产的规定。认真执行工程承包合同中的有关安全要求。
- （2）坚持“安全第一、预防为主、综合治理”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本合同的各项规定，做到生产与安全同时计划、布置、检查、总结和评比。



(3) 建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按《公路水运工程安全生产监督管理办法》规定的最低数量和资质条件配备专职安全生产管理人员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

(4) 承包人在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

(5) 承包人必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产考核合格证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。

(6) 对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；承包人不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。

(7) 操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

(8) 所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

(9) 施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

(10) 承包人必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其他有关规定，及时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

(11) 安全生产费用按照《公路水运工程安全生产监督管理办法》的相关规定



使用和管理。

3. 违约责任

如因发包人或承包人违约造成安全事故，将依法追究责任。

4. 本合同由双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖单位章后生效，全部工程竣工验收后失效。

5. 本合同正本二份、副本六份，合同双方各执正本一份，副本三份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

发包人：西峡县公路事业发展中心

(盖单位章)

法定代表人或其委托代理人：

(签字)

2024 年 10 月 28 日

承包人：西峡县正通公路养护有限公司

(盖单位章)

法定代表人或其委托代理人：

(签字)

2024 年 10 月 28 日



CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

(四) 近年完成的类似项目情况表
业绩二

| | |
|-----------|---|
| 项目名称 | 西峡县公路事业发展中心南阳市西峡县G208线K1421+300-K1421+380段等2处灾害防治工程项目 |
| 项目所在地 | 西峡境内 |
| 发包人名称 | 西峡县公路事业发展中心 |
| 发包人地址 | 西峡县伏牛路西段 |
| 发包人联系人及电话 | 方政 0377-83816903 |
| 合同价格 | 2323950元 |
| 开工日期 | 2025年5月20日 |
| 竣工日期 | 2025年6月19日 |
| 承担的工作 | 西峡县G208线K1421+300-K1421+380段等2处灾害防治工程 |
| 工程质量 | 合格 |
| 项目经理 | 张庆 |
| 技术负责人 | 刘星辰 |
| 总监理工程师及电话 | 彤刚 15038791282 |
| 项目描述 | 西峡县G208线K1421+300-K1421+380段等2处灾害防治工程 |
| 备注 | / |

成交通知书

西峡县正通公路养护有限公司

西峡县公路事业发展中心南阳市西峡县 G208 线 K1421+300-K1421+380 段等 2 处灾害防治工程项目(二次)，经该项目磋商小组推荐及采购人确认，贵公司成交：

| | |
|------|---|
| 项目编号 | 西峡政采磋商-2025-10 |
| 项目名称 | 西峡县公路事业发展中心南阳市西峡县 G208 线 K1421+300-K1421+380 段等 2 处灾害防治工程项目(二次) |
| 成交金额 | 2323950 元 |
| 工期 | 本项目计划工期 30 日历天, 缺陷责任期为 6 个月。 |
| 质量要求 | 合格 |
| 项目经理 | 张庆 |

请尽快与采购人联系合同谈判及签约事宜。

特此通知。

采购人：（盖章）

西峡县公路事业发展中心

招标代理机构：（盖章）

河南宇盛工程咨询有限公司

2025 年 6 月 13 日

西峡县公路事业发展中心南阳市西峡县 G208 线
K1421+300-K1421+380 段等 2 处灾害防治工程项目

合同协议书
施工标 合同段
(正本)

西峡县公路事业发展中心
西峡县正通公路养护有限公司

日期: 2025 年 5 月 15 日



CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

合 同 协 议 书

西峡县公路事业发展中心（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施西峡县公路事业发展中心南阳市西峡县G208线K1421+300-K1421+380段等2处灾害防治工程项目（项目名称，）已接受西峡县正通公路养护有限公司（承包人名称，以下简称“承包人”）对该项目施工标段施工的投标。发包人和承包人共同达成如下协议。

1. 南阳市西峡县 G208 线 K1421+300~K1421+380 段全长 80 米，存在 1 处安全隐患，涉及里程 0.08 公里。南阳市西峡县 K1429+450~K1429+660 段全长 210 米，存在 1 处安全隐患，涉及里程 0.21 公里。项目路段技术等级为三级公路，沥青混凝土路面。设计时速 30km/h，路基宽度 8.5m，路面宽度 7.5m。

2. 下列文件应视为构成合同文件的组成部分：

（1）本协议书及各种合同附件（含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料）

（2）中标通知书；

（3）投标函及投标函附录；

（4）项目专用合同条款；

（5）公路工程专用合同条款；

（6）通用合同条款；

（7）工程量清单计量规则；

（8）技术规范；

（9）图纸；

（10）已标价工程量清单；

（11）承包人有关人员、设备投入的承诺及投标文件中的施工组织设计；

（12）其他合同文件。

上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。

3. 根据工程量清单所列的预计数量和单价或总额价计算的签约合同价：人民币（大写）贰佰叁拾贰万叁仟玖佰伍拾 元（¥2323950元。）



CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

4. 承包人项目经理： 张庆 。承包人项目总工： 刘星辰 。
5. 工程质量符合 合格 标准。工程安全目标： 安全生产零事故 。
6. 承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。
7. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。
8. 承包人应按照监理人指示开工，工期为 30 日历天，缺陷责任期： 6个月 。
9. 本协议书由双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖单位章后生效。全部工程完工后经交工验收合格、缺陷责任期满签发缺陷责任终止证书后失效。
10. 本协议书正本二份、副本 六 份，合同双方各执正本一份，副本 三 份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。
11. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人： 西峡县公路事业发展中心

(盖单位章)

法定代表人或其委托代理人：

(签字)

2025 年 5 月 15 日

承包人： 西峡县正通公路养护有限公司

(盖单位章)

法定代表人或其委托代理人：

(签字)

2025 年 5 月 15 日



CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

廉政合同

根据《关于在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》以及有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，西峡县公路事业发展中心南阳市西峡县G208线K1421+300-K1421+380段等2处灾害防治工程项目（项目名称）的项目法人西峡县公路事业发展中心（项目法人名称，以下简称“发包人”）与该项目施工标段的施工单位西峡县正通公路养护有限公司（施工单位名称，以下简称“承包人”，）特订立如下合同。

1. 发包人和承包人双方的权利和义务

（1）严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规及交通运输部的有关规定。

（2）严格执行西峡县公路事业发展中心南阳市西峡县G208线K1421+300-K1421+380段等2处灾害防治工程项目（项目名称）施工标段施工合同文件，自觉按合同办事。

（3）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。

（4）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

（5）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

（6）发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

2. 发包人的义务

（1）发包人及其工作人员不得索要或接受承包人的礼金、有价证券和贵重物品，不得让承包人报销任何应由发包人或发包人工作人员个人支付的费用等。

（2）发包人工作人员不得参加承包人安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受承包人提供的通信工具、交通工具和高档办公用品等。

（3）发包人及其工作人员不得要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。



CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

(4) 发包人工作人员及其配偶、子女不得从事与发包人工程有关材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。

(5) 发包人及其工作人员不得以任何理由向承包人推荐分包单位或推销材料，不得要求承包人购买合同规定外的材料和设备。

(6) 发包人工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人施工队伍。

3. 承包人的义务

(1) 承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

(2) 承包人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人单位或个人支付的任何费用。

(3) 承包人不得以任何理由安排发包人工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。

(4) 承包人不得为发包人单位和个人购置或提供通信工具、交通工具和高档办公用品等。

4. 违约责任

(1) 发包人及其工作人员违反本合同第1、2条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

(2) 承包人及其工作人员违反本合同第1、3条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，发包人建议交通运输主管部门给予承包人一至三年内不得进入其主管的公路建设市场的处罚。

5. 双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察部门负责监督执行。由发包人或其上级单位的纪检监察部门约请承包人或其上级单位纪检监察部门对本合同执行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。

6. 本合同有效期为发包人和承包人签署之日起至该工程项目竣工验收后止。

7. 本合同作为西峡县公路事业发展中心南阳市西峡县G208线K1421+300-K1421+380段等2处灾害防治工程项目（项目名称）标段施工合同的附件，与工程施工合同具有同等



的法律效力，经合同双方签署后立即生效。

8. 本合同一式四份，由发包人和承包人各执一份，送交发包人和承包人的监督单位各一份。

发包人：西峡县公路事业发展中心

(盖单位章)

法定代表人或其委托代理人：

(签字)

2025 年 5 月 15 日

承包人：西峡县正通公路养护有限公司

(盖单位章)

法定代表人或其委托代理人：

(签字)

2025 年 5 月 15 日



CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App

安全生产合同

为在 西峡县公路事业发展中心南阳市西峡县G208线K1421+300-K1421+380
段等2处灾害防治工程项目（项目名称）施工 标段施工合同的实施过程中创
造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目发包人西
峡县公路事业发展中心（发包人名称，以下简称“发包人”）与承包人西峡
县正通公路养护有限公司（承包人名称，以下简称“承包人”）特此签订安全
生产合同。

1. 发包人职责

（1）严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的
有关安全要求。

（2）按照“安全第一、预防为主、综合治理”和坚持“管生产必须管安全”
的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和
评比。

（3）重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设
计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。

（4）定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神
。

（5）组织对承包人施工现场进行安全生产检查，监督承包人及时处理发现
的各种安全隐患。

2. 承包人职责

（1）严格遵守《中华人民共和国安全生产法》《建设工程安全生产管理条例》
等国家有关安全生产的法律法规、《公路水运工程安全生产监督管理办法》
和《公路工程施工安全技术规范》等有关安全生产的规定。认真执行工程承包合
同中的有关安全要求。

（2）坚持“安全第一、预防为主、综合治理”和“管生产必须管安全”
的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生
产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领
导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人



员，必须熟悉和遵守本合同的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

(3) 建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按《公路水运工程安全生产监督管理办法》规定的最低数量和资质条件配备专职安全生产管理人员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

(4) 承包人在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

(5) 承包人必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产考核合格证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。

(6) 对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；承包人不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。

(7) 操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

(8) 所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。



(9) 施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

(10) 承包人必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其他有关规定，及时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

(11) 安全生产费用按照《公路水运工程安全生产监督管理办法》的相关规定使用和管理。

3. 违约责任

如因发包人或承包人违约造成安全事故，将依法追究责任。

4. 本合同由双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖单位章后生效，全部工程竣工验收后失效。

5. 本合同正本二份、副本 六 份，合同双方各执正本一份，副本 三 份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

发包人：西峡县公路事业发展中心

(盖单位章)

法定代表人或其委托代理人：

(签字)

2025 年 5 月 15 日

承包人：西峡县正通公路养护有限公司

(盖单位章)

法定代表人或其委托代理人：

(签字)

2025 年 5 月 15 日



CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

（四）近年完成的类似项目情况表
业绩三

| | |
|-----------|--|
| 项目名称 | 西峡县公路事业发展中心南阳市西峡县S328线K477+950-K478+050段公路灾害防治工程项目 |
| 项目所在地 | 西峡境内 |
| 发包人名称 | 西峡县公路事业发展中心 |
| 发包人地址 | 西峡县伏牛路西段 |
| 发包人联系人及电话 | 方政 0377-83816903 |
| 合同价格 | 690633元 |
| 开工日期 | 2025年5月13日 |
| 竣工日期 | 2025年6月12日 |
| 承担的工作 | 西峡县S328线K477+950-K478+050段公路灾害防治工程 |
| 工程质量 | 合格 |
| 项目经理 | 李永茂 |
| 技术负责人 | 周代源 |
| 总监理工程师及电话 | 熊茜 15688193515 |
| 项目描述 | 西峡县S328线K477+950-K478+050段公路灾害防治工程 |
| 备注 | / |

成 交 通 知 书

西峡县正通公路养护有限公司

西峡县公路事业发展中心南阳市西峡县 S328 线 K477+950-K478+050 段公路灾害防治工程项目（二次），经该项目磋商小组推荐及采购人确认，贵公司成交：

| | |
|------|--|
| 项目编号 | 西峡政采磋商-2025-11 |
| 项目名称 | 西峡县公路事业发展中心南阳市西峡县 S328 线 K477+950-K478+050 段公路灾害防治工程项目（二次） |
| 成交金额 | 690633 元 |
| 工期 | 本项目计划工期 30 日历天, 缺陷责任期为 6 个月。 |
| 质量要求 | 合格 |
| 项目经理 | 李永茂 |

请尽快与采购人联系合同谈判及签约事宜。

特此通知

采购人：（盖章）
西峡县公路事业发展中心

招标代理机构：（盖章）
河南宇盛工程咨询有限公司

2025 年 5 月 7 日

西峡县公路事业发展中心南阳市西峡县
S328线K477+950-K478+050段公路灾害防治工程项目

合同协议书
施工标 合同段
(正本)

西峡县公路事业发展中心
西峡县正通公路养护有限公司

日期: 2025 年 5 月 8 日



CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

合 同 协 议 书

西峡县公路事业发展中心（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施 西峡县公路事业发展中心南阳市西峡县S328线K477+950-K478+050段公路灾害防治工程项目（项目名称，）已接受 西峡县正通公路养护有限公司（承包人名称，以下简称“承包人”）对该项目 施工 标段施工的投标。发包人和承包人共同达成如下协议。

1. 西峡县 S328 线 K477+950-K478+050 段公路灾害防治工程。项目路段全长 0.1 公里，存在 1 处安全隐患，涉及里程 0.1 公里。项目路段技术等级为三级公路，沥青混凝土路面。设计时速 30km/h，路基宽度 8.5m，路面宽度 7.5m。

2. 下列文件应视为构成合同文件的组成部分：

（1）本协议书及各种合同附件（含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料）

（2）中标通知书；

（3）投标函及投标函附录；

（4）项目专用合同条款；

（5）公路工程专用合同条款；

（6）通用合同条款；

（7）工程量清单计量规则；

（8）技术规范；

（9）图纸；

（10）已标价工程量清单；

（11）承包人有关人员、设备投入的承诺及投标文件中的施工组织设计；

（12）其他合同文件。

上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。

3. 根据工程量清单所列的预计数量和单价或总额价计算的签约合同价：人民币（大写） 陆拾玖万零陆佰叁拾叁元（¥ 690633 元。）

4. 承包人项目经理： 李永茂 。承包人项目总工： 周代源 。



CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

5. 工程质量符合 合格 标准。工程安全目标: 安全生产零事故 。
6. 承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。
7. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。
8. 承包人应按照监理人指示开工, 工期为 30 日历天, 缺陷责任期: 6个月 。
9. 本协议书由双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖单位章后生效。全部工程完工后经交工验收合格、缺陷责任期满签发缺陷责任终止证书后失效。
10. 本协议书正本二份、副本 六 份, 合同双方各执正本一份, 副本 三 份, 当正本与副本的内容不一致时, 以正本为准。
11. 合同未尽事宜, 双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人: 西峡县公路事业发展中心

(盖单位章)

法定代表人或其委托代理人:

(签字)

2025年5月8日

承包人: 西峡县正通公路养护有限公司

(盖单位章)

法定代表人或其委托代理人:

(签字)

2025年5月8日



CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

廉政合同

根据《关于在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》以及有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，西峡县公路事业发展中心南阳市西峡县S328线K477+950-K478+050段公路灾害防治工程项目（项目名称）的项目法人西峡县公路事业发展中心（项目法人名称，以下简称“发包人”）与该项目施工标段的施工单位西峡县正通公路养护有限公司（施工单位名称，以下简称“承包人”）特订立如下合同。

1. 发包人和承包人双方的权利和义务

（1）严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规及交通运输部的有关规定。

（2）严格执行西峡县公路事业发展中心南阳市西峡县S328线K477+950-K478+050段公路灾害防治工程项目（项目名称）施工标段施工合同文件，自觉按合同办事。

（3）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。

。

（4）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

（5）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

（6）发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

2. 发包人的义务

（1）发包人及其工作人员不得索要或接受承包人的礼金、有价证券和贵重物品，不得让承包人报销任何应由发包人或发包人工作人员个人支付的费用等。

（2）发包人工作人员不得参加承包人安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受承包人提供的通信工具、交通工具和高档办公用品等。

（3）发包人及其工作人员不得要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。



CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

(4) 发包人工作人员及其配偶、子女不得从事与发包人工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。

(5) 发包人及其工作人员不得以任何理由向承包人推荐分包单位或推销材料，不得要求承包人购买合同规定外的材料和设备。

(6) 发包人工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人施工队伍。

3. 承包人的义务

(1) 承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

(2) 承包人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人单位或个人支付的任何费用。

(3) 承包人不得以任何理由安排发包人工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。

(4) 承包人不得为发包人单位和个人购置或提供通信工具、交通工具和高档办公用品等。

4. 违约责任

(1) 发包人及其工作人员违反本合同第 1、2 条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

(2) 承包人及其工作人员违反本合同第1、3条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，发包人建议交通运输主管部门给予承包人一至三年内不得进入其主管的公路建设市场的处罚。

5. 双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察部门负责监督执行。由发包人或发包人上级单位的纪检监察部门约请承包人或承包人上级单位纪检监察部门对本合同执行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。

6. 本合同有效期为发包人和承包人签署之日起至该工程项目竣工验收后止。

7. 本合同作为 西峡县公路事业发展中心南阳市西峡县S328线K477+950-K478+050段公路灾害防治工程项目（项目名称）标段施工合同的附件，与工程施工合同具有同等



的法律效力，经合同双方签署后立即生效。

8. 本合同一式四份，由发包人和承包人各执____份，送交发包人和承包人的
监督单位各____份。

发包人：西峡县公路事业发展中心

(盖单位章)

法定代表人或其委托代理人：

(签字)

2025年5月8日

承包人：西峡县正通公路养护有限公司

(盖单位章)

法定代表人或其委托代理人：

(签字)

2025年5月8日



CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

安全生产合同

为在西峡县公路事业发展中心南阳市西峡县S328线K477+950-K478+050段公路灾害防治工程项目（项目名称）施工标段施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目发包人西峡县公路事业发展中心（发包人名称，以下简称“发包人”）与承包人西峡县正通公路养护有限公司（承包人名称，以下简称“承包人”）特此签订安全生产合同。

1. 发包人职责

（1）严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

（2）按照“安全第一、预防为主、综合治理”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

（3）重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。

（4）定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

（5）组织对承包人施工现场进行安全生产检查，监督承包人及时处理发现的各种安全隐患。

2. 承包人职责

（1）严格遵守《中华人民共和国安全生产法》《建设工程安全生产管理条例》等国家有关安全生产的法律法规、《公路水运工程安全生产监督管理办法》和《公路工程施工安全技术规范》等有关安全生产的规定。认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

（2）坚持“安全第一、预防为主、综合治理”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员



，必须熟悉和遵守本合同的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

(3) 建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按《公路水运工程安全生产监督管理办法》规定的最低数量和资质条件配备专职安全生产管理人员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

(4) 承包人在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

(5) 承包人必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产考核合格证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。

(6) 对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；承包人不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。

(7) 操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

(8) 所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。



(9) 施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

(10) 承包人必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其他有关规定，及时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

(11) 安全生产费用按照《公路水运工程安全生产监督管理办法》的相关规定使用和管理。

3. 违约责任

如因发包人或承包人违约造成安全事故，将依法追究责任。

4. 本合同由双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖单位章后生效，全部工程竣工验收后失效。

5. 本合同正本二份、副本 六 份，合同双方各执正本一份，副本 三 份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

发包人：西峡县公路事业发展中心

(盖单位章)

法定代表人或其委托代理人：

(签字)

2025年5月8日

承包人：西峡县正通公路养护有限公司

(盖单位章)

法定代表人或其委托代理人：

(签字)

2025年5月8日



CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺

一、企业技术力量及专业能力

西峡县正通公路养护有限公司成立于 2018 年 10 月，注册资金为 4600 万元，地址在西峡县五里桥镇北堂村，公司在册职工为 163 人，是一家集公路养护、工程施工、公路设施的维修、安装及保养、公路绿化（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）于一体的综合型公路养护公司。通过六年多的经营，目前已建立了较为完善的公司经营管理体系，运行正常。

公司拥有程力威牌洒水车，大运牌洒水车，江铃牌五十铃，程力威牌洒布车，打桩机，LD50 沥青混合料搅拌设备、压浆设备，EC80D 沃尔沃挖机、BW131AC-5 压路机、GYS22 压路机、S1103-3 摊铺机、W130H 铣刨机等大型设备共计 20 多台。

自 2018 年以来在公司党政班子的带领下承揽了路面大中小修、安全防治、危桥改造、灾害防治、国道安全精细化提升工程等项目，获得业内人士的一致好评，被主管部门多次评为先进单位、精神文明建设先进单位等各种奖励。

公司秉承西峡县正通公路养护有限公司“产业富企、科技兴企、人才强企”的发展思路，以公路养护为主线，以养护材料、养护技术研究为支撑，注重高层次养护科技人员的培养，运用现代企业制度，健全法人治理机构，把养护公司打造成产权清晰、权责明确、规范运作、技术雄厚、富于创新的现代化养护企业。

我公司将本着立足业主，多元发展的经营理念，树立对业主负责的高度责任感，精细施工、竭诚与各界朋友真诚合作，携手共进，共创辉煌。

二、对本次采购的生产组织安排

（一）保证工期的合理化建议

1. 工程进度计划保证制度管理的原则

为保证工程总体进度计划的顺利完成，首先需在项目部管理体系中重点做好施工进度保障管理体系的建设，并由进度计划管理人员制定出进度计划管理制度和奖罚办法。

2. 工程进度计划保证制度

进度控制的主要方法有：行政方法、经济方法和管理技术方法。使用行政方法进行进度控制，直接、迅速、有效，但要提倡科学性，防止主观、武断、片面地瞎指挥。进度控制的经济方法，是指有关部门和单位用经济类手段对进度进行影响和制约。进度控制的管理技术方法，

就是通过规划、控制和协调，来保证工期目标的实现。

进度控制的措施包括组织措施、技术措施、合同措施、经济措施和信息管理措施等。在计划实施过程中，对施工队伍实际进度进行跟踪监督。当发现实际进度滞后于计划进度时，应签发《调度通知》，指令施工队伍采取调整措施。当实际进度严重滞后于计划进度时应及时报告项目经理，由项目经理与施工队伍协商采取相应措施。定期（最少一个月一次）召开工程例会，研究分析影响进度的主要原因，采取相应措施，并督促有关责任方实施。

3. 建立进度计划系统：

在总体进度计划的基础框架上，依照业主的具体要求及现场实际情况，分别编制相应的细部进度计划；将各个细部计划按需要的管理时间进行汇总，形成季度、月、周的进度计划。

4. 建立工地例会制度：

定期召开全体参施队伍和对口管理人员参加的工地例会，项目经理部每天召开一次例会，通过例会统计总结当天工程完成情况，对进度滞后项目分析原因、提出补救措施，同时布置第二天的工作任务。通过紧紧抓住每天的实际进度来确保每周、每月进度计划的完成。

5. 建立工作任务负责制度：

对每个分项工程，都将相应责任落实到具体负责人身上，同时引入奖惩制度，在每项任务布置时明确奖惩条件，在任务完成后根据完成情况落实奖惩措施，形成激励机制。

6. 进度计划管理信息透明化：

总体及分项计划上墙公示，明确各项工作任务的工作计划实施状况及任务负责人。

7. 材料及物资计划精细化：

对应于总体进度计划和分项工程进度计划，在编制总体一次性备料计划的基础上，进行分项材料计划的编制，切实保证材料设备落实到位。

8. 加强内部管理协调：

明确生产、安全、技术、测量、质检、试验、材料等与现场直接相关的各职能部门的工作关系和工作流程，使每个管理人员对自己的工作做到目标明确，对上明确负责对象、对下明确管理对象、左右明确各协调部门和工作程序，减少因管理原因造成的误工情况。

三、材料、机械设备保证

根据施工设计图纸、施工规范的要求，认真制定各种材料、机械设备总计划和采购清单。材料进场后及时做好复测。严格其他各种材料、机械设备采购的质量过程控制。对供方生产（制造）的各种材料、机械设备做好检验和验证，确保其各项质量指标符合和满足工程质量要求，对各种机械、设备按照采购合同文件的要求，严格进行验证，确保其技术状态良好，运转正常，

能够达到应有的施工能力和要求。对机械设备实行定机定人定岗管理，落实安全使用、维护、保管等责任制度。严格执行维修、保养、小修、大修计划，保证各种机械设备工作正常，确保施工和工程质量不受影响。

3、质量管理保证

组织制定工艺标准，积极落实创优规划。正确引导和开展工序样板先行、典型路工示范，整体推进的工程创优活动，严格按照创优规划和措施要求，加强现场技术指导和工序质量预控。各专业施工队严格按照施工规范、技术操作规程、审定的技术方案、工艺要求组织施工，按照《质量验收标准》进行验收，上道工序不合格，不交付下道工序施工。保证每个检验批、分项、分部、单位工程一次验收合格。做好隐蔽工程的检查验收。项目经理部和各专业施工队严格质量检查和抽查，各班组严格“自检、互检、专检”三检制，及时邀请现场监理工程师检查签证，不符合要求的不隐蔽。对关键工序、特殊过程和质量控制重点部位、混凝土作业等坚持技术试验人员跟班作业，实行 24 小时旁站监控，做好施工记录，保证实施过程具有可追溯性。严格岗位质量责任制和质量目标考核制度。各级落实质量包保责任和质量终身负责制，每项工程明确质量具体负责人，施工过程跟踪考核，实行工程质量直接与个人经济收入挂钩的分配制度，真正使质量责任落到实处。

4、测量、试验检测保证

（1）严格检测操作管理制度

认真执行《项目测试管理办法细则》中明确的仪器设备管理制度、样品管理制度检测工作负责保证制度、测试数据检验制度、检测报告审批制度、检测资料保密制度和试验资料管理制度、测量工作规程，以及试验和施工过程控制等制度。严格按照有关规定做好检测设备的使用、搬运、储存、维护等管理。所有检测、试验仪器按规定进行校准或检定，经国家有关部门标定认可，保证在有效期限内使用。

（2）加强原材料的进场检测

所有原材料进场前都应当严格检验控制，从源头上杜绝质量隐患。各种材料要有出厂合格证，并严格按照规范要求的批量或数量进行抽检。

（3）确保施工检测数据准确性对商品混凝土进行跟踪质量检测，及时出具资料，反馈有关信息，加强合作。混凝土浇筑现场按规定进行坍落度试验并记入施工记录，保证混凝土强度试验的频数、试件组数达到规定要求。

5、施工技术保证

（1）坚持图纸会审制

由项目总工程师组织对图纸进行分级会审，审核完成后，审核人员对审核结果有无问题均要进行有效标识，填写审核意见，汇总。必要时，及时与建设单位、设计单位及监理单位进行沟通，不断完善设计。

（2）坚持技术交底制度

根据建设单位审批通过的施工方案编制各工序技术交底，同时对管理人员、施工人员进行设计意图交底、施工方案交底、施工工艺交底、质量标准交底、创优措施交底。组织项目部人员、施工作业班组成员认真学习审批通过的施工方案，按照方案安排组织施工。

（3）坚持资料管理制度

按照建设单位、监理工程师的要求，结合 IS09000 标准质量管理体系的规定，对资料管理实行专人负责，分类归档，集中管理。施工中详细如实地记录施工全过程，最大程度地反映施工的可追溯性，使资料能够正确反映施工全过程并与施工进度同步积累。

供应商（盖章）： 西峡县正通公路养护有限公司

法定代表人或其授权代表（签字）： _____

日期： 2025 年 10 月 31 日

（五）投标人的信誉情况表

| 项 目 | 投标人情况说明 |
|---|---|
| 1. 在最新年度信用评价等级被交通运输部或河南省交通运输厅评为D级 | <input type="checkbox"/> 是，情况说明： <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 2. 投标人须出具无行贿犯罪承诺（承诺对象包括：企业、法定代表人、授权委托人、项目经理），并对其真实性负责。若承诺不实，所造成的一切后果由投标人自行承担。 | 提供无行贿犯罪承诺 |
| 3. 在国家企业信用信息公示系统（ http://www.gsxt.gov.cn ）中被列入严重违法失信企业名单的 | <input type="checkbox"/> 是，情况说明： <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 4. 在“信用中国”网站（ http://www.creditchina.gov.cn ）中被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单； | <input type="checkbox"/> 是，情况说明： <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 5. 在中国政府采购网（ http://www.ccgp.gov.cn ）被列入严重违法失信行为； | <input type="checkbox"/> 是，情况说明： <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 6. 被省级及以上主管部门取消招标项目所在地的投标资格且处于有效期内 | <input type="checkbox"/> 是，情况说明： <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 7. 被责令停业，暂扣或吊销执照，或吊销资质证书 | <input type="checkbox"/> 是，情况说明： <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 8. 进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形 | <input type="checkbox"/> 是，情况说明： <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 9. 存在法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形 | <input type="checkbox"/> 是，情况说明： <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| ... | |

注：1. 投标人应按照招标文件第二章“投标人须知”前附表附录4和“投标人须知”正文第1.4.4项规定，逐条说明其信誉情况。

2. 投标人应根据招标文件第二章“投标人须知”第3.5.4项的要求在本表后附相关证明材料。

**在最新年度信用评价等级没有被交通运输部或河南省交通运输厅评为D级的
承诺书**

西峡县公路事业发展中心（招标人名称）：

我方在此承诺：我方在最新年度信用评价等级没有被交通运输部或河南省交通运输厅评为D级。

我公司对此承诺的真实性负责，若承诺不实，造成的后果由我方自行负责，愿放弃本项目中标机会，并承担一切法律责任，

特此承诺

投标人： 西峡县正通公路养护有限公司（电子签章）

法定代表人或其委托代理人： _____（电子签名）

2025 年 10 月 31 日

无行贿犯罪行为承诺

西峡县公路事业发展中心（招标人名称）：

西峡县正通公路养护有限公司（投标人名称）郑重承诺，本公司包括企业本身西峡县正通公路养护有限公司（统一社会信用代码：91411323MA45W8TBXW）、企业法定代表人李永茂（身份证号码：411330198701141550）、委托代理人赵起兰（身份证号码：411330198903081541（姓名）、项目经理李永茂（身份证号：411330198701141550）、技术负责人蔡晓龙（身份证号：411330198809262530），近三年内无行贿犯罪记录，一经查实有行贿犯罪记录，自愿放弃中标资格。

我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假引起的一切责任及法律后果。

特此承诺。

投标人： 西峡县正通公路养护有限公司（电子签章）

法定代表人或其委托代理人： _____（电子签名）

2025 年 10 月 31 日

在国家企业信用信息公示系统未被列入严重违法失信企业名单的截图

15137...

国家企业信用信息公示系统

National Enterprise Credit Information Publicity System

企业信用信息公示 | 经营异常名录 | 严重违法失信名单

请输入企业名称、统一社会信用代码或注册号

营业执照

西峡县正通公路养护有限公司

存续(在署、开业、在册)

统一社会信用代码: 91411323MA45W8TBXW

注册号:

法定代表人: 李永范

登记机关: 南阳市西峡县市场监督管理局

成立日期: 2018年10月19日

发送报告

信息分享

信息打印

基础信息 | 行政许可信息 | 行政处罚信息 | 列入经营异常名录信息 | 列入严重违法失信名单(黑名单)信息 | 公告信息

列入严重违法失信名单(黑名单)信息

| 序号 | 类别 | 列入严重违法失信名单(黑名单)原因 | 列入日期 | 作出决定机关(列入) | 移出严重违法失信名单(黑名单)原因 | 移出日期 | 作出决定机关(移出) |
|---------------------|----|-------------------|------|------------|-------------------|------|------------|
| 暂无列入严重违法失信名单(黑名单)信息 | | | | | | | |

共 查询到 0 条记录 共 0 页

首页 < 上一页 下一页 > 末页

15:20:22

2025年10月22日 九月初二

2025年10月

| | | | | | | |
|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
| 29 初八 | 30 初九 | 1 初十 | 2 十一 | 3 十二 | 4 十三 | 5 十四 |
| 6 十五 | 7 十六 | 8 十七 | 9 十八 | 10 十九 | 11 二十 | 12 廿一 |
| 13 廿二 | 14 廿三 | 15 廿四 | 16 廿五 | 17 廿六 | 18 廿七 | 19 廿八 |
| 20 廿九 | 21 三十 | 22 十一 | 23 十二 | 24 十三 | 25 十四 | 26 十五 |
| 27 十六 | 28 十七 | 29 十八 | 30 十九 | 31 二十 | 1 廿一 | 2 廿二 |
| 3 廿三 | 4 廿四 | 5 廿五 | 6 廿六 | 7 廿七 | 8 廿八 | 9 廿九 |

日期和时间设置

主办单位: 国家市场监督管理总局


地址: 北京市西城区三里河东路八号 邮政编码: 100820 备案号: 京ICP备18022388号-2

京公网安备11040102000001 京ICP备18022388号-2

“信用中国”网站查询结果

欢迎来到信用中国

通知公告 | 网站声明



信用中国

WWW.CREDITCHINA.GOV.CN

信用信息

请输入主体名称或者统一社会信用代码

搜索

信息公示

信用动态

信用立法

政策法规

信用承诺

城市信用

走进信用


首页 > 专项查询 > 安全生产严重失信主体名单

安全生产严重失信主体名单

西峡县正通公路养护有限公司

查询

查询结果



很抱歉，没有找到您搜索的数据

社会信用体系建设部际联席会议成员单位

地方信用网站

信用示范地区

区域


关于我们

主办单位：国家公共信用和地理空间信息中心

信用中国APP下载

欢迎来到信用中国

通知公告 | 网站声明



信用中国

WWW.CREDITCHINA.GOV.CN

信用信息

请输入主体名称或者统一社会信用代码

搜索

信息公示

信用动态

信用立法

政策法规

信用承诺

城市信用

走进信用

首页 > 专项查询 > 安全生产严重失信主体名单信息查询（自然人）

安全生产严重失信主体名单信息查询（自然人）

李永茂

1550

查询

该自然人不存在相关数据

社会信用体系建设部际联席会议成员单位

地方信用网站

信用示范地区

区域

关于我们

主办单位：国家公共信用和地理空间信息中心

信用中国APP下载

欢迎来到信用中国

通知公告 | 网站声明

15:34:02

2025年10月22日 九月初二

2025年10月

| | | | | | | |
|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
| 29 初八 | 30 初九 | 1 初十 | 2 十一 | 3 十二 | 4 十三 | 5 十四 |
| 6 十五 | 7 十六 | 8 十七 | 9 十八 | 10 十九 | 11 二十 | 12 廿一 |
| 13 廿二 | 14 廿三 | 15 廿四 | 16 廿五 | 17 廿六 | 18 廿七 | 19 廿八 |
| 20 廿九 | 21 三十 | 22 十一 | 23 十二 | 24 十三 | 25 十四 | 26 十五 |
| 27 十六 | 28 十七 | 29 十八 | 30 十九 | 31 二十 | 1 廿一 | 2 廿二 |
| 3 廿三 | 4 廿四 | 5 廿五 | 6 廿六 | 7 廿七 | 8 廿八 | 9 廿九 |

日期和时间设置

15:35:30

2025年10月22日 九月初二

2025年10月

| | | | | | | |
|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
| 29 初八 | 30 初九 | 1 初十 | 2 十一 | 3 十二 | 4 十三 | 5 十四 |
| 6 十五 | 7 十六 | 8 十七 | 9 十八 | 10 十九 | 11 二十 | 12 廿一 |
| 13 廿二 | 14 廿三 | 15 廿四 | 16 廿五 | 17 廿六 | 18 廿七 | 19 廿八 |
| 20 廿九 | 21 三十 | 22 十一 | 23 十二 | 24 十三 | 25 十四 | 26 十五 |
| 27 十六 | 28 十七 | 29 十八 | 30 十九 | 31 二十 | 1 廿一 | 2 廿二 |
| 3 廿三 | 4 廿四 | 5 廿五 | 6 廿六 | 7 廿七 | 8 廿八 | 9 廿九 |

日期和时间设置


首页 > 专项查询 > 重大税收违法失信主体

重大税收违法失信主体

西峡县正通公路养护有限公司

查询

查询结果



很抱歉，没有找到您搜索的数据

15:36:12

2025年10月22日 九月初二

2025年10月

| | | | | | | |
|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
| 29 初八 | 30 初九 | 1 初十 | 2 十一 | 3 十二 | 4 十三 | 5 十四 |
| 6 十五 | 7 十六 | 8 十七 | 9 十八 | 10 十九 | 11 二十 | 12 廿一 |
| 13 廿二 | 14 廿三 | 15 廿四 | 16 廿五 | 17 廿六 | 18 廿七 | 19 廿八 |
| 20 廿九 | 21 三十 | 22 十一 | 23 十二 | 24 十三 | 25 十四 | 26 十五 |
| 27 十六 | 28 十七 | 29 十八 | 30 十九 | 31 二十 | 1 廿一 | 2 廿二 |
| 3 廿三 | 4 廿四 | 5 廿五 | 6 廿六 | 7 廿七 | 8 廿八 | 9 廿九 |

日期和时间设置



中国执行信息公开网

司法为民 司法便民

首页 执行公开服务

综合查询被执行人

被执行人姓名/名称:

西峡县正通公路养护有限公司

身份证号码/组织机构代码:

91411323MA45W8TBXW

执行法院范围:

全国法院 (包含地方各级法院)

验证码:

iYiz

验证码正确!

查询

查询结果

在全国法院 (包含地方各级法院) 范围内没有找到 91411323MA45W8TBXW 西峡县正通公路养护有限公司相关的结果。

全国法院被执行人信息查询使用声明

为推进社会信用体系建设，切实解决执行难问题，促进被执行人自动履行生效法律文书确定的义务，保障公民、法人和其他组织依法获取执行案件信息，充分发挥执行案件信息对人民群众生产生活和经济社会活动的服务作用，参照《中华人民共和国政府信息公开条例》，最高人民法院从2009年3月30日起向社会开通“全国法院被执行人信息查询”平台。社会各界通过该平台可查询全国法院（不包括军事法院）2007年1月1日以后新收及此前未结的执行实施案件的被执行人信息。现就有关事项申明如下：

一、被执行人信息由执行法院录入和审核。若有关当事人对相关信用信息内容有异议的，可依据《最高人民法院关于全国法院被执行人信息查询平台信息异议处理的若干规定》向执行法院书面申请更正。

二、本网站提供的信息仅供查询人参考，如有异议，以执行法院有关法律文书为准。因使用本网站信息而造成不良后果的，人民法院不承担任何责任。

三、查询人必须依法使用查询信息，不得用于非法目的和不正当用途。非法使用本网站信息给他人造成损害的，由使用人自行承担相应责任。

四、本网站信息查询免费，严禁任何单位和个人利用本网站信息牟取非法利益。

五、本网站属于政府网站，未经许可，任何商业性网站不得建立与本网站及其内容的链接，不得建立本网站的镜像（包括全部和局部镜像），不得拷贝、复制或传播本网站信息。

最高人民法院
二〇〇九年三月三十日

15:38:49

2025年10月22日 九月初二


2025年10月

| | | | | | | |
|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
| 29 初八 | 30 初九 | 1 初十 | 2 十一 | 3 十二 | 4 十三 | 5 十四 |
| 6 十五 | 7 十六 | 8 十七 | 9 十八 | 10 十九 | 11 二十 | 12 廿一 |
| 13 廿二 | 14 廿三 | 15 廿四 | 16 廿五 | 17 廿六 | 18 廿七 | 19 廿八 |
| 20 廿九 | 21 三十 | 22 十一 | 23 十二 | 24 十三 | 25 十四 | 26 十五 |
| 27 十六 | 28 十七 | 29 十八 | 30 十九 | 31 二十 | 1 廿一 | 2 廿二 |
| 3 廿三 | 4 廿四 | 5 廿五 | 6 廿六 | 7 廿七 | 8 廿八 | 9 廿九 |

日期和时间设置

欢迎来到信用中国

通知公告 | 网站声明



信用中国WWW.CREDITCHINA.GOV.CN

信用信息 ▾ 请输入主体名称或者统一社会信用代码

搜索

信息公示

信用动态

信用立法

政策法规

信用承诺

城市信用

走进信用


首页 > 专项查询 > 重点领域查询

拖欠农民工工资失信联合惩戒对象名单

西峡县正通公路养护有限公司

查询

查询结果





很抱歉，没有找到您搜索的数据

社会信用代码建设部际联席会议成员单位


地方信用网站

信用示范地区






政府网站



关于我们

主办单位：国家公共信用和地理空间信息中心

指导单位：国家发展和改革委员会 中国人民银行




信用中国APP下载

社会信用代码建设部际联席会议成员单位


地方信用网站

信用示范地区

区域




政府网站



关于我们

主办单位：国家公共信用和地理空间信息中心

指导单位：国家发展和改革委员会 中国人民银行



信用中国APP下载

15:40:02

2025年10月22日 九月初二

2025年10月

| | | | | | | |
|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
| 29 初八 | 30 初九 | 1 初十 | 2 十一 | 3 十二 | 4 十三 | 5 十四 |
| 6 十五 | 7 十六 | 8 十七 | 9 十八 | 10 十九 | 11 二十 | 12 廿一 |
| 13 廿二 | 14 廿三 | 15 廿四 | 16 廿五 | 17 廿六 | 18 廿七 | 19 廿八 |
| 20 廿九 | 21 三十 | 22 十一 | 23 十二 | 24 十三 | 25 十四 | 26 十五 |
| 27 十六 | 28 十七 | 29 十八 | 30 十九 | 31 二十 | 1 廿一 | 2 廿二 |
| 3 廿三 | 4 廿四 | 5 廿五 | 6 廿六 | 7 廿七 | 8 廿八 | 9 廿九 |

日期和时间设置

15:40:37

2025年10月22日 九月初二

2025年10月

| | | | | | | |
|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
| 29 初八 | 30 初九 | 1 初十 | 2 十一 | 3 十二 | 4 十三 | 5 十四 |
| 6 十五 | 7 十六 | 8 十七 | 9 十八 | 10 十九 | 11 二十 | 12 廿一 |
| 13 廿二 | 14 廿三 | 15 廿四 | 16 廿五 | 17 廿六 | 18 廿七 | 19 廿八 |
| 20 廿九 | 21 三十 | 22 十一 | 23 十二 | 24 十三 | 25 十四 | 26 十五 |
| 27 十六 | 28 十七 | 29 十八 | 30 十九 | 31 二十 | 1 廿一 | 2 廿二 |
| 3 廿三 | 4 廿四 | 5 廿五 | 6 廿六 | 7 廿七 | 8 廿八 | 9 廿九 |

日期和时间设置

首页 > 专项查询 > 社会组织严重违法失信名单

社会组织严重违法失信名单

西峡县正通公路养护有限公司

查询

查询结果



很抱歉，没有找到您搜索的数据

社会信用体系建设部际联席会议成员单位 | 地方信用网站 | 信用示范地区 | 区域

关于我们 | 主办单位：国家公共信用和地理空间信息中心 | 信用中国APP下载

首页 > 专项查询 > 政府采购严重违法失信行为记录名单

政府采购严重违法失信行为记录名单

西峡县正通公路养护有限公司

查询

查询结果



很抱歉，没有找到您搜索的数据

社会信用体系建设部际联席会议成员单位 | 地方信用网站 | 信用示范地区 | 区域

关于我们 | 主办单位：国家公共信用和地理空间信息中心 | 信用中国APP下载

15:41:20

2025年10月22日 九月初二

2025年10月

| | | | | | | |
|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
| 29 初八 | 30 初九 | 1 初十 | 2 十一 | 3 十二 | 4 十三 | 5 十四 |
| 6 十五 | 7 十六 | 8 十七 | 9 十八 | 10 十九 | 11 二十 | 12 廿一 |
| 13 廿二 | 14 廿三 | 15 廿四 | 16 廿五 | 17 廿六 | 18 廿七 | 19 廿八 |
| 20 廿九 | 21 十月 | 22 十一 | 23 十二 | 24 十三 | 25 十四 | 26 十五 |
| 27 十六 | 28 十七 | 29 十八 | 30 十九 | 31 二十 | 1 廿一 | 2 廿二 |
| 3 廿三 | 4 廿四 | 5 廿五 | 6 廿六 | 7 廿七 | 8 廿八 | 9 廿九 |

日期和时间设置

15:42:05

2025年10月22日 九月初二

2025年10月

| | | | | | | |
|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
| 29 初八 | 30 初九 | 1 初十 | 2 十一 | 3 十二 | 4 十三 | 5 十四 |
| 6 十五 | 7 十六 | 8 十七 | 9 十八 | 10 十九 | 11 二十 | 12 廿一 |
| 13 廿二 | 14 廿三 | 15 廿四 | 16 廿五 | 17 廿六 | 18 廿七 | 19 廿八 |
| 20 廿九 | 21 十月 | 22 十一 | 23 十二 | 24 十三 | 25 十四 | 26 十五 |
| 27 十六 | 28 十七 | 29 十八 | 30 十九 | 31 二十 | 1 廿一 | 2 廿二 |
| 3 廿三 | 4 廿四 | 5 廿五 | 6 廿六 | 7 廿七 | 8 廿八 | 9 廿九 |

日期和时间设置

“中国政府采购网”严重违法失信行为记录查询结果

财政部唯一指定政府采购信息网络发布媒体 国家级政府采购专业网站

服务热线：400-810-1996 | 服务投诉：010-63819289



首页 政策法规 购买服务 监督检查 信息公告 国际专栏

当前位置：首页 » 政府采购严重违法失信行为记录名单 »



政府采购严重违法失信行为信息记录

http://www.ccgp.gov.cn

| 企业名称： | 西峡县正通公路养护有限公司 | 统一社会信用代码（或组织机构代码）： | 91411323MA45W8TBXW | | | | | | |
|--|---------------|--------------------|--------------------|---------------|------|------|------|------|------|
| 执法单位： | 请输入执法单位 | 重置 | 查找 | | | | | | |
| 提示：请至少输入一个查询条件 | | | | | | | | | |
| 序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码（或组织机构代码） | 企业地址 | 严重违法失信行为的具体情形 | 处罚结果 | 处罚依据 | 处罚日期 | 公布日期 | 执法单位 |
| 查询结果：政府采购严重违法失信行为记录名单中没有该企业的相关记录 | | | | | | | | | |
| 查询内容： 企业名称：西峡县正通公路养护有限公司 统一社会信用代码(或组织机构代码)：91411323MA45W8TBXW 查询时间：2025年10月22日 15时42分 | | | | | | | | | |

提示：本平台信息依据《关于报送政府采购严重违法失信行为信息记录的通知》（财办库[2014]526号）发布，如有疑问请联系具体执法单位。

版权所有 © 2025 中华人民共和国财政部

15:42:41

2025年10月22日 九月初二

2025年10月

| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 29 初八 | 30 初九 | 1 初十 | 2 十一 | 3 十二 | 4 十三 | 5 十四 |
| 6 十五 | 7 十六 | 8 十七 | 9 十八 | 10 十九 | 11 二十 | 12 廿一 |
| 13 廿二 | 14 廿三 | 15 廿四 | 16 廿五 | 17 廿六 | 18 廿七 | 19 廿八 |
| 20 廿九 | 21 三十 | 22 十一 | 23 十二 | 24 十三 | 25 十四 | 26 十五 |
| 27 十六 | 28 十七 | 29 十八 | 30 十九 | 31 二十 | 1 廿一 | 2 廿二 |
| 3 廿三 | 4 廿四 | 5 廿五 | 6 廿六 | 7 廿七 | 8 廿八 | 9 廿九 |

日期和时间设置



主办单位：中华人民共和国财政部国库司

联系电话：010-63819289 | 技术支持：010-63819289 | 电子邮箱：ccgp@ccgp.gov.cn

信用报告



信用中国

WWW.CREDITCHINA.GOV.CN



扫一扫

核验码

法人和非法人组织 公共信用信息报告

版本号V2.0

机构名称：西峡县正通公路养护有限公司
统一社会信用代码：91411323MA45W8TBXW
报告编号：2025102215364571019X10

| | |
|--------|-----------------|
| 报告生成日期 | 2025年10月22日 |
| 报告出具单位 | 国家公共信用和地理空间信息中心 |

公共信用信息概览



西峡县正通公路养护有限公司

存续

守信激励对象

登记注册基本信息

基础信息

| | | | |
|----------|--------------------|-------------------|------------|
| 统一社会信用代码 | 91411323MA45W8TBXW | 法定代表人/负责人/执行事务合伙人 | 李永茂 |
| 企业类型 | 有限责任公司(国有控股) | 成立日期 | 2018-10-19 |
| 住所 | 西峡县五里桥镇北堂村 | | |

信用信息概要

| | | | |
|--------|-------------|--------|-----------------|
| 行政管理 | 5条 | 诚实守信 | 1条 |
| 严重失信 | 0条 | 经营异常 | 0条 |
| 信用承诺 | 112条 | 信用评价 | 0条 |
| 司法判决 | 0条 | 其他 | 0条 |
| 报告生成日期 | 2025年10月22日 | 报告出具单位 | 国家公共信用和地理空间信息中心 |

报告说明



- 1.本报告所展示的数据和资料为公共信用信息，“信用中国”网站承诺在数据汇总、加工、整合的过程中保持客观中立，不主动编辑或修改信息的内容。
- 2.受限于现有技术水平等原因，对此报告信息的展示，并不视为“信用中国”对其内容的真实性、准确性、完整性、时效性作出任何形式的确认或担保。请在依据本报告信息作出判断或决策前，自行进一步核实此类信息的完整或准确性，并自行承担使用后果。
- 3.如认为本报告所展示信息存在错误、遗漏、重复公示、不应公示、超期公示或与认定机关信息不一致等情况，请以数据源单位的信息为准，并可按照网站“信用信息异议申诉指南”提出异议申诉；如需对相关行政处罚信息进行信用修复，可按照网站“行政处罚信息信用修复流程指引”提出信用修复申请；如需对相关严重失信主体名单进行信用修复，请咨询名单认定单位。
- 4.本报告已添加“信用中国”水印、生成唯一的报告编号和报告核验码。如需对内容的真实性进行核验，可通过扫一扫报告首页“核验码”，查看本报告生成时的内容与纸质版报告内容是否一致。
- 5.本报告展示行政管理、诚实守信、严重失信、经营异常、信用承诺、信用评价、司法判决以及其他类等信息，因篇幅有限，单类信息仅按更新程度展示最近日期的100条。如有特殊需求，请与我们联系。

正文



西峡县正通公路养护有限公司

存续

守信激励对象

一、登记注册基本信息

基础信息

企业名称：西峡县正通公路养护有限公司

统一社会信用代码：91411323MA45W8TBXW

法定代表人/负责人/执行事务合伙人：李永茂

企业类型：有限责任公司(国有控股)

成立日期：2018-10-19

住所：西峡县五里桥镇北堂村

二、行政管理信息 (共 5 条)

行政许可

行政许可决定书号：2502-411323-04-01-120467 第 1 条

行政许可决定书名称：西峡县S328线独阜岭隧道道班房建设项目

许可证书名称：——

许可类别：普通

许可编号：——

许可决定日期：2025-02-25

有效期自：2025-02-25

有效期至：2099-12-31

许可内容：该项目需占地922.44平方米，建筑面积228平方米，包含独阜岭隧道养护道班房、应急物资储备仓库、养护机械停放场地等。

许可机关：西峡县发展和改革委员会

许可机关统一社会信用代码：11411323737439886W

数据来源单位：西峡县发展和改革委员会

数据来源单位统一社会信用代码：11411323737439886W

| 行政许可

行政许可决定书号：豫交建管许〔2024〕154号

第 2 条

行政许可决定书名称：关于河南省2024年第四批公路养护作业单位资质许可决定的公告

许可证书名称：——

许可类别：普通

许可编号：——

许可决定日期：2024-09-16

有效期自：2024-09-16

有效期至：2029-09-16

许可内容：根据《公路养护作业单位资质管理办法》（交通运输部令2021年第22号）、《关于印发河南省公路养护作业单位资质管理实施细则的通知》（豫交规〔2021〕6号）相关规定，省厅组织对2024年第四批公路养护作业单位资质申请材料进行了审查和公示。现将准予许可的公路养护作业单位资质审查结果予以公布。取得公路养护作业单位资质的企业，应在资质等级允许范围内开展公路养护业务，自觉接受交通运输主管部门的监督管理。附件：河南省2024年第四批公路养护作业单位资质准予许可名单 2024年9月16日

许可机关：河南省交通运输厅

许可机关统一社会信用代码：11410000005184435G

数据来源单位：河南省交通运输厅

数据来源单位统一社会信用代码：11410000005184435G

| 行政许可

行政许可决定书号：4113232024YG0003416

第 3 条

行政许可决定书名称：建设用地规划许可证

许可证书名称：建设用地规划许可证

许可类别：普通
许可编号：4113232024YG0003416
许可决定日期：2024-01-10
有效期自：2024-01-10
有效期至：2099-12-31
许可内容：2704平方米
许可机关：西峡县自然资源局
许可机关统一社会信用代码：11411323419285009B
数据来源单位：西峡县自然资源局
数据来源单位统一社会信用代码：11411323419285009B

| 行政许可

行政许可决定书号：2401-411323-04-01-895120 第 4 条
行政许可决定书名称：西峡县正通公路养护有限公司加油站项目
许可证书名称：——
许可类别：普通
许可编号：——
许可决定日期：2024-01-02
有效期自：2024-01-02
有效期至：2099-12-31
许可内容：该项目总用地面积2704平方米，设置汽油罐2个，柴油罐2个，油罐客量150立方米，加油机6台，站房一座，建筑面积600平方米，罩棚一座。
许可机关：西峡县发展和改革委员会
许可机关统一社会信用代码：11411323737439886W
数据来源单位：西峡县发展和改革委员会
数据来源单位统一社会信用代码：11411323737439886W

码：

行政许可

| | | |
|-----------------|--------------------------|-------|
| 行政许可决定书号： | (宛西税)许变准字(2021)第(2)号 | 第 5 条 |
| 行政许可决定书名称： | 准予税务行政许可决定书 | |
| 许可证名称： | —— | |
| 许可类别： | 普通 | |
| 许可编号： | —— | |
| 许可决定日期： | 2021-01-11 | |
| 有效期自： | 2021-01-11 | |
| 有效期至： | 2099-12-31 | |
| 许可内容： | 增值税专用发票（增值税税控系统）最高开票限额审批 | |
| 许可机关： | 国家税务总局西峡县税务局 | |
| 许可机关统一社会信用代码： | 11411323MB19515617 | |
| 数据来源单位： | 国家税务总局西峡县税务局 | |
| 数据来源单位统一社会信用代码： | 11411323MB19515617 | |

三、诚实守信相关荣誉信息 (共 1 条)

纳税信用A级纳税人

| | | |
|---------|--------------------|-------|
| 纳税人名称： | 西峡县正通公路养护有限公司 | 第 1 条 |
| 纳税人识别号： | 91411323MA45W8TBXW | |
| 评价年度： | 2024 | |
| 数据来源： | 国家税务总局 | |

四、严重失信信息 (共 0 条)

查询期内无相关记录

五、经营（活动）异常名录（状态）信息（共 0 条）

查询期内无相关记录

六、信用承诺信息（共 100 条）

企业信用承诺信息

承诺编码：41132320230509419764
承诺类型：主动型
承诺事由：主动型，自愿作出承诺
承诺内容：按照环境保护法要求，在生产经营中达标排放
承诺作出日期：2023-05-09
承诺履行状态：全部履行
承诺受理单位：南阳市生态环境局西峡分局
承诺受理单位统一社会信用代码：114113230060528801

第 1 条

企业信用承诺信息

承诺编码：41132320230613000483
承诺类型：主动型
承诺事由：主动作出承诺
承诺内容：创建文明城市
承诺作出日期：2023-06-13
承诺履行状态：全部履行
承诺受理单位：西峡县市容环卫中心
承诺受理单位统一社会信用代码：12411323419290270J

第 2 条

| 企业信用承诺信息

| | | |
|-----------------|----------------------|-------|
| 承诺编码： | 41132320230105013328 | 第 3 条 |
| 承诺类型： | 主动型 | |
| 承诺事由： | 主动型，自愿作出承诺 | |
| 承诺内容： | 依法保护区域内环境卫生 | |
| 承诺作出日期： | 2023-01-05 | |
| 承诺履行状态： | 全部履行 | |
| 承诺受理单位： | 南阳市生态环境局西峡分局 | |
| 承诺受理单位统一社会信用代码： | 114113230060528801 | |

| 企业信用承诺信息

| | | |
|-----------------|----------------------|-------|
| 承诺编码： | 41132320230510041764 | 第 4 条 |
| 承诺类型： | 主动型 | |
| 承诺事由： | 主动型，自愿作出承诺 | |
| 承诺内容： | 构建网络诚信“诚信经营 | |
| 承诺作出日期： | 2023-05-10 | |
| 承诺履行状态： | 全部履行 | |
| 承诺受理单位： | 西峡县公安局 | |
| 承诺受理单位统一社会信用代码： | 11411323006051941E | |

| 企业信用承诺信息

| | | |
|-------|----------------------|-------|
| 承诺编码： | 41132320230215A00348 | 第 5 条 |
| 承诺类型： | 主动型 | |
| 承诺事由： | 主动型，自愿作出承诺 | |
| 承诺内容： | 自觉履行保护环境的义务 | |

承诺作出日期：2023-02-15
承诺履行状态：全部履行
承诺受理单位：南阳市生态环境局西峡分局
承诺受理单位统一社会信用代码：114113230060528801

| 企业信用承诺信息

承诺编码：41132320220712562123 第 6 条
承诺类型：主动型
承诺事由：主动型，自愿作出承诺
承诺内容：1.严格遵守法律、法规和规章，积极落实企业安全生产主体责任，扎实有效地开展安全生产工作，不断提升企业安全生产本质水平，努力塑造企业诚实守信的良好形象，促进企业健康有序发展。2.提供给应急管理部门的所有资料均合法、真实、有效，无伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责。3.严格依法开展生产经营活动，建立健全并严格落实安全生产责任制度，确保职工生命健康安全。4.主动接受应急管理部门的监管，自愿接受依法开展的日常检查并严格执行执法指令。

承诺作出日期：2022-07-12
承诺履行状态：全部履行
承诺受理单位：西峡县应急管理局
承诺受理单位统一社会信用代码：11411323MB15367040

| 企业信用承诺信息

承诺编码：41132320220614M00348 第 7 条
承诺类型：主动型
承诺事由：主动承诺
承诺内容：关于守法诚信经营的承诺
承诺作出日期：2022-06-14
承诺履行状态：全部履行

承诺受理单位：西峡县人力资源和社会保障局

承诺受理单位统一社会信用代码：11411323006052899X

企业信用承诺信息

承诺编码：41132320230614022081 第 8 条

承诺类型：主动型

承诺事由：主动作出承诺

承诺内容：承诺在从事财务工作中诚实守信，遵守会计法律、行政法规和国家统一的会计制度规定

承诺作出日期：2023-06-14

承诺履行状态：全部履行

承诺受理单位：西峡县财政局

承诺受理单位统一社会信用代码：11411323006052004P

企业信用承诺信息

承诺编码：41132320230323000236 第 9 条

承诺类型：主动型

承诺事由：主动型，自愿作出承诺

承诺内容：不拖欠工资

承诺作出日期：2023-03-23

承诺履行状态：全部履行

承诺受理单位：西峡县人力资源和社会保障局

承诺受理单位统一社会信用代码：11411323006052899X

企业信用承诺信息

承诺编码：41132320230102M00348 第 10 条

承诺类型：主动型
承诺事由：主动型，自愿作出承诺
承诺内容：疫情防控
承诺作出日期：2023-01-02
承诺履行状态：全部履行
承诺受理单位：西峡县卫生健康委员会
承诺受理单位统一社会信用代码：11411323006051984U

| 企业信用承诺信息

承诺编码：41132320220708552784 第 11 条
承诺类型：主动型
承诺事由：主动型，自愿作出承诺
承诺内容：1.严格遵守法律、法规和规章，积极落实企业安全生产主体责任，扎实有效地开展安全生产工作，不断提升企业安全生产本质水平，努力塑造企业诚实守信的良好形象，促进企业健康有序发展。2.提供给应急管理部门的所有资料均合法、真实、有效，无伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责。3.严格依法开展生产经营活动，建立健全并严格落实安全生产责任制度，确保职工生命健康安全。4.主动接受应急管理部门的监管，自愿接受依法开展的日常检查并严格执行执法指令。
承诺作出日期：2022-07-08
承诺履行状态：全部履行
承诺受理单位：西峡县应急管理局
承诺受理单位统一社会信用代码：11411323MB15367040

| 企业信用承诺信息

承诺编码：41132320220712M00348 第 12 条
承诺类型：主动型

承诺事由：主动型，自愿作出承诺

承诺内容：严格依法开展生产经营活动，建立健全并严格落实安全生产责任制度，确保职工生命健康安全。

承诺作出日期：2022-07-12

承诺履行状态：全部履行

承诺受理单位：南阳市西峡县市场监督管理局

承诺受理单位统一社会信用代码：11411323006052792J

企业信用承诺信息

承诺编码：41132320220512M00348 第 13 条

承诺类型：主动型

承诺事由：主动型，自愿作出承诺

承诺内容：严格按照疫情防控要求，做好来访人员登记等工作。

承诺作出日期：2022-05-12

承诺履行状态：全部履行

承诺受理单位：西峡县卫生健康委员会

承诺受理单位统一社会信用代码：11411323006051984U

企业信用承诺信息

承诺编码：41132320230415006296 第 14 条

承诺类型：主动型

承诺事由：主动作出承诺

承诺内容：个体、企业自主年报公示承诺

承诺作出日期：2023-04-15

承诺履行状态：全部履行

承诺受理单位：西峡县市场监督管理局

承诺受理单位统一社会信用代码：11411323006052792J

企业信用承诺信息

承诺编码：41132320230411000609 第 15 条
承诺类型：主动型
承诺事由：主动作出承诺
承诺内容：承诺依法接受税务机关依法进行的税务检查，如实反映情况，提供有关资料，不得拒绝、隐瞒。
承诺作出日期：2023-04-11
承诺履行状态：全部履行
承诺受理单位：国家税务总局西峡县税务局
承诺受理单位统一社会信用代码：11411323MB19515617

企业信用承诺信息

承诺编码：41132320230413000598 第 16 条
承诺类型：主动型
承诺事由：遵守劳动法
承诺内容：承诺遵守用工制度，及时全量支付农民工工资
承诺作出日期：2023-04-13
承诺履行状态：全部履行
承诺受理单位：西峡县人力资源和社会保障局
承诺受理单位统一社会信用代码：11411323006052899X

企业信用承诺信息

| | | |
|-----------------|----------------------|--------|
| 承诺编码： | 41132320230116RL4988 | 第 17 条 |
| 承诺类型： | 主动型 | |
| 承诺事由： | 主动型，自愿作出承诺 | |
| 承诺内容： | 按照劳动法及时发放工资报酬 | |
| 承诺作出日期： | 2023-01-16 | |
| 承诺履行状态： | 全部履行 | |
| 承诺受理单位： | 西峡县人力资源和社会保障局 | |
| 承诺受理单位统一社会信用代码： | 11411323006052899X | |

| 企业信用承诺信息

| | | |
|-----------------|--|--------|
| 承诺编码： | 41132320230312001010 | 第 18 条 |
| 承诺类型： | 主动型 | |
| 承诺事由： | 主动型，自愿作出承诺 | |
| 承诺内容： | 严格依法开展生产经营活动，建立健全并严格落实安全生产责任制度，确保职工生命健康安全。 | |
| 承诺作出日期： | 2023-03-12 | |
| 承诺履行状态： | 全部履行 | |
| 承诺受理单位： | 西峡县市场监督管理局 | |
| 承诺受理单位统一社会信用代码： | 11411323006052792J | |

| 企业信用承诺信息

| | | |
|---------|----------------------|--------|
| 承诺编码： | 41132320230112A00348 | 第 19 条 |
| 承诺类型： | 主动型 | |
| 承诺事由： | 主动型，自愿作出承诺 | |
| 承诺内容： | 疫情防控 | |
| 承诺作出日期： | 2023-01-12 | |

承诺履行状态：全部履行
承诺受理单位：西峡县卫生健康委员会
承诺受理单位统一社会信用代码：11411323006051984U

| 企业信用承诺信息

承诺编码：41132320220628515428 第 20 条
承诺类型：主动型
承诺事由：主动型，自愿作出承诺
承诺内容：1.严格按照国家、省市相关规定，落实企业主体责任，对来自或去过疫情重点地区的返工人员，实行从严管控。如发现可疑病例，及时报告相关信息，协助做好医学观察、隔离等措施。2.全面加强复工后返工人员登记管理，严密关注其健康状况，确保“早发现、早报告、早隔离、早处置”。3.本承诺书交由所在地卫生防疫部门留存。
承诺作出日期：2022-06-28
承诺履行状态：全部履行
承诺受理单位：西峡县卫生健康委员会
承诺受理单位统一社会信用代码：11411323006051984U

| 企业信用承诺信息

承诺编码：41132320220718580801 第 21 条
承诺类型：主动型
承诺事由：主动型，自愿作出承诺
承诺内容：1.严格遵守法律、法规和规章，积极落实企业安全生产主体责任，扎实有效地开展安全生产工作，不断提升企业安全生产本质水平，努力塑造企业诚实守信的良好形象，促进企业健康有序发展。2.提供给应急管理部门的所有资料均合法、真实、有效，无伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责。3.严格依法开展生产经营活动，建立健全并严格落实安全生产责任制度，确保职工生命健康安全。4.主动接受应急管理部门的监管，自愿接受依法开展的日常检查并严格执行执法指令。
承诺作出日期：2022-07-18
承诺履行状态：全部履行

承诺受理单位：西峡县应急管理局
承诺受理单位统一社会信用代码：11411323MB15367040

企业信用承诺信息

承诺编码：41132320230118015318 第 22 条
承诺类型：主动型
承诺事由：主动型，自愿作出承诺
承诺内容：依法设立应急设施，并保证可随时使用
承诺作出日期：2023-01-18
承诺履行状态：全部履行
承诺受理单位：西峡县应急管理局
承诺受理单位统一社会信用代码：11411323MB15367040

企业信用承诺信息

承诺编码：41132320230614031420 第 23 条
承诺类型：主动型
承诺事由：主动作出承诺
承诺内容：做到法务诚信
承诺作出日期：2023-06-14
承诺履行状态：全部履行
承诺受理单位：西峡县司法局
承诺受理单位统一社会信用代码：1141132300605283XM

企业信用承诺信息

承诺编码：41132320220605M00348 第 24 条

承诺类型：主动型
承诺事由：主动型，自愿作出承诺
承诺内容：关于落实安全生产守法诚信的承诺
承诺作出日期：2022-06-05
承诺履行状态：全部履行
承诺受理单位：南阳市西峡县应急管理局
承诺受理单位统一社会信用代码：11411323MB15367040

| 企业信用承诺信息

承诺编码：41132320220315M00348 第 25 条
承诺类型：主动型
承诺事由：主动承诺
承诺内容：依法履行纳税义务
承诺作出日期：2022-03-15
承诺履行状态：全部履行
承诺受理单位：国家税务总局西峡县税务局
承诺受理单位统一社会信用代码：11411323MB19515617

| 企业信用承诺信息

承诺编码：41132320230510042348 第 26 条
承诺类型：主动型
承诺事由：主动型，自愿作出承诺
承诺内容：严格依法开展生产经营活动，建立健全并严格落实安全生产责任制度，确保职工生命健康安全。

承诺作出日期：2023-05-10
承诺履行状态：全部履行
承诺受理单位：西峡县应急管理局
承诺受理单位统一社会信用代码：11411323MB15367040

企业信用承诺信息

承诺编码：41132320230614040760 第 27 条
承诺类型：审批替代型
承诺事由：自愿作出承诺
承诺内容：承诺坚决抵制不合格产品的经营销售，发现不合格的产品后，及时更改
承诺作出日期：2023-06-14
承诺履行状态：全部履行
承诺受理单位：西峡县市场监督管理局
承诺受理单位统一社会信用代码：11411323006052792J

企业信用承诺信息

承诺编码：41132320230216000600 第 28 条
承诺类型：主动型
承诺事由：自愿作出承诺
承诺内容：切实保证产品质量，维护消费者的合法权益
承诺作出日期：2023-02-16
承诺履行状态：全部履行
承诺受理单位：西峡县市场监督管理局
承诺受理单位统一社会信用代码：11411323006052792J

企业信用承诺信息

承诺编码：41132320230610002097 第 29 条

承诺类型：主动型

承诺事由：主动型，自愿作出承诺

承诺内容：主动接受应急管理部門的監管，自願接受依法開展的日常檢查並嚴格執行執法指令。

承诺作出日期：2023-06-10

承诺履行状态：全部履行

承诺受理单位：西峡县应急管理局

承诺受理单位统一社会信用代码：11411323MB15367040

企业信用承诺信息

承诺编码：41132320230310001967 第 30 条

承诺类型：主动型

承诺事由：主动型，自愿作出承诺

承诺内容：依法設立應急設施，並保證可隨時使用

承诺作出日期：2023-03-10

承诺履行状态：全部履行

承诺受理单位：西峡县应急管理局

承诺受理单位统一社会信用代码：11411323MB15367040

企业信用承诺信息

承诺编码：41132320230110039361 第 31 条

承诺类型：主动型

承诺事由：主动型，自愿作出承诺

承诺内容：严格依法开展生产经营活动，建立健全并严格落实安全生产责任制度，确保职工生命健康安全。

承诺作出日期：2023-01-10

承诺履行状态：全部履行

承诺受理单位：西峡县应急管理局

承诺受理单位统一社会信用代码：11411323MB15367040

企业信用承诺信息

承诺编码：41132320220620478072 第 32 条

承诺类型：主动型

承诺事由：主动型，自愿作出承诺

承诺内容：1.严格按照国家、省市相关规定，落实企业主体责任，对来自或去过疫情重点地区的返工人员，实行从严管控。如发现可疑病例，及时报告相关信息，协助做好医学观察、隔离等措施。2.全面加强复工后返工人员登记管理，严密关注其健康状况，确保“早发现、早报告、早隔离、早处置”。3.本承诺书交由所在地卫生防疫部门留存。

承诺作出日期：2022-06-20

承诺履行状态：全部履行

承诺受理单位：西峡县卫生健康委员会

承诺受理单位统一社会信用代码：11411323006051984U

企业信用承诺信息

承诺编码：41132320230225000580 第 33 条

承诺类型：行业自律型

承诺事由：行业自律型

承诺内容：共同维护诚信体系，维护良好市场环境

承诺作出日期：2023-02-25

承诺履行状态：全部履行

承诺受理单位：西峡县民政局

承诺受理单位统一社会信用代码：114113230060519761

| 企业信用承诺信息

| | | |
|-----------------|----------------------|--------|
| 承诺编码： | 41132320230125M00348 | 第 34 条 |
| 承诺类型： | 主动型 | |
| 承诺事由： | 主动型，自愿作出承诺 | |
| 承诺内容： | 关于依法履行纳税义务的承诺 | |
| 承诺作出日期： | 2023-01-25 | |
| 承诺履行状态： | 全部履行 | |
| 承诺受理单位： | 国家税务总局西峡县税务局 | |
| 承诺受理单位统一社会信用代码： | 11411323MB19515617 | |

| 企业信用承诺信息

| | | |
|-----------------|--|--------|
| 承诺编码： | 41132320220622487411 | 第 35 条 |
| 承诺类型： | 主动型 | |
| 承诺事由： | 主动型，自愿作出承诺 | |
| 承诺内容： | 1.严格按照国家、省市相关规定，落实企业主体责任，对来自或去过疫情重点地区的返工人员，实行从严管控。如发现可疑病例，及时报告相关信息，协助做好医学观察、隔离等措施。2.全面加强复工后返工人员登记管理，严密关注其健康状况，确保“早发现、早报告、早隔离、早处置”。3.本承诺书交由所在地卫生防疫部门留存。 | |
| 承诺作出日期： | 2022-06-22 | |
| 承诺履行状态： | 全部履行 | |
| 承诺受理单位： | 西峡县卫生健康委员会 | |
| 承诺受理单位统一社会信用代码： | 11411323006051984U | |

| 企业信用承诺信息

| | | |
|---------|---------------------|--------|
| 承诺类型： | 主动型 | 第 36 条 |
| 承诺事由： | 证明事项告知承诺，申请办理住所证明文件 | |
| 承诺作出日期： | 2021-03-01 | |
| 承诺受理单位： | 南阳市西峡县市场监督管理局 | |
| 承诺履行状态： | —— | |

| 企业信用承诺信息

| | | |
|-----------------|----------------------|--------|
| 承诺编码： | 41132320230621000373 | 第 37 条 |
| 承诺类型： | 主动型 | |
| 承诺事由： | 主动作出承诺 | |
| 承诺内容： | 节约用电 | |
| 承诺作出日期： | 2023-06-21 | |
| 承诺履行状态： | 全部履行 | |
| 承诺受理单位： | 国网河南省电力公司西峡县供电公司 | |
| 承诺受理单位统一社会信用代码： | 91411323MA40WCR971 | |

| 企业信用承诺信息

| | | |
|-----------------|----------------------|--------|
| 承诺编码： | 41132320230110020934 | 第 38 条 |
| 承诺类型： | 主动型 | |
| 承诺事由： | 主动型，自愿作出承诺 | |
| 承诺内容： | 构建网络诚信“诚信经营 | |
| 承诺作出日期： | 2023-01-10 | |
| 承诺履行状态： | 全部履行 | |
| 承诺受理单位： | 西峡县公安局 | |
| 承诺受理单位统一社会信用代码： | 11411323006051941E | |

| 企业信用承诺信息

| | | |
|-----------------|--------------------------------|--------|
| 承诺编码： | 41132320230625002911 | 第 39 条 |
| 承诺类型： | 主动型 | |
| 承诺事由： | “围绕联合奖惩构建网络诚信”诚信经营承诺书 | |
| 承诺内容： | 同意将信用承诺纳入信用中国各级网站并上网公示，接受社会监督。 | |
| 承诺作出日期： | 2023-06-25 | |
| 承诺履行状态： | 全部履行 | |
| 承诺受理单位： | 西峡县发展和改革委员会 | |
| 承诺受理单位统一社会信用代码： | 11411323737439886W | |

| 企业信用承诺信息

| | | |
|-----------------|----------------------|--------|
| 承诺编码： | 41132320230510030380 | 第 40 条 |
| 承诺类型： | 主动型 | |
| 承诺事由： | 主动型，自愿作出承诺 | |
| 承诺内容： | 遵守法律法规，诚信经营，确保产品质量 | |
| 承诺作出日期： | 2023-05-10 | |
| 承诺履行状态： | 全部履行 | |
| 承诺受理单位： | 西峡县市场监督管理局 | |
| 承诺受理单位统一社会信用代码： | 11411323006052792J | |

| 企业信用承诺信息

| | | |
|-------|----------------------|--------|
| 承诺编码： | 41132320230406000348 | 第 41 条 |
| 承诺类型： | 主动型 | |
| 承诺事由： | 主动型，自愿作出承诺 | |

承诺内容：严格依法开展生产经营活动，建立健全并严格落实安全生产责任制度，确保职工生命健康安全。

承诺作出日期：2023-04-06

承诺履行状态：全部履行

承诺受理单位：西峡县市场监督管理局

承诺受理单位统一社会信用代码：11411323006052792J

| 企业信用承诺信息

承诺编码：41132320230410004755 第 42 条

承诺类型：主动型

承诺事由：主动型，自愿作出承诺

承诺内容：遵守商业道德，承担社会责任

承诺作出日期：2023-04-10

承诺履行状态：全部履行

承诺受理单位：西峡县市场监督管理局

承诺受理单位统一社会信用代码：11411323006052792J

| 企业信用承诺信息

承诺编码：41132320230109000590 第 43 条

承诺类型：主动型

承诺事由：主动型，自愿作出承诺

承诺内容：严格依法开展生产经营活动，建立健全并严格落实安全生产责任制度，确保职工生命健康安全。

承诺作出日期：2023-01-09

承诺履行状态：全部履行

承诺受理单位：西峡县应急管理局

承诺受理单位统一社会信用代码：11411323MB15367040

码：

| 企业信用承诺信息

| | | |
|-----------------|--|--------|
| 承诺编码： | 41132320230110005498 | 第 44 条 |
| 承诺类型： | 主动型 | |
| 承诺事由： | 主动型，自愿作出承诺 | |
| 承诺内容： | 严格遵守法律、法规和规章，积极落实企业安全生产主体责任，扎实有效地开展安全生产工作，不断提升企业安全生产本质水平，努力塑造企业诚实守信的良好形象，促进企业健康有序发展。 | |
| 承诺作出日期： | 2023-01-10 | |
| 承诺履行状态： | 全部履行 | |
| 承诺受理单位： | 西峡县应急管理局 | |
| 承诺受理单位统一社会信用代码： | 11411323MB15367040 | |

| 企业信用承诺信息

| | | |
|-----------------|------------------------|--------|
| 承诺编码： | 41132320230412037965 | 第 45 条 |
| 承诺类型： | 主动型 | |
| 承诺事由： | 主动作出承诺 | |
| 承诺内容： | 承诺爱护林木，积极种植，为改善生态环境做贡献 | |
| 承诺作出日期： | 2023-04-12 | |
| 承诺履行状态： | 全部履行 | |
| 承诺受理单位： | 西峡县林业局 | |
| 承诺受理单位统一社会信用代码： | 11411323006052354X | |

| 企业信用承诺信息

承诺编码：41132320230522000668 第 46 条

承诺类型：主动型

承诺事由：主动型，自愿作出承诺

承诺内容：严格依法开展生产经营活动，建立健全并严格落实安全生产责任制度，确保职工生命健康安全。

承诺作出日期：2023-05-22

承诺履行状态：全部履行

承诺受理单位：西峡县应急管理局

承诺受理单位统一社会信用代码：11411323MB15367040

企业信用承诺信息

承诺编码：41132320220711M00348 第 47 条

承诺类型：行业自律型

承诺事由：行业自律型

承诺内容：共同维护诚信体系，维护良好市场环境

承诺作出日期：2022-07-11

承诺履行状态：全部履行

承诺受理单位：西峡县民政局

承诺受理单位统一社会信用代码：114113230060519761

企业信用承诺信息

承诺编码：41132320230620000496 第 48 条

承诺类型：主动型

承诺事由：主动作出承诺

承诺内容：严格遵守环保法规，贯彻落实环境保护政策

承诺作出日期：2023-06-20

承诺履行状态：全部履行
承诺受理单位：南阳市生态环境局西峡分局
承诺受理单位统一社会信用代码：114113230060528801

企业信用承诺信息

承诺编码：41132320230422000348 第 49 条
承诺类型：主动型
承诺事由：主动承诺
承诺内容：自愿遵守环保法律法规
承诺作出日期：2023-04-22
承诺履行状态：全部履行
承诺受理单位：南阳市生态环境局西峡分局
承诺受理单位统一社会信用代码：114113230060528801

企业信用承诺信息

承诺编码：41132320220706543445 第 50 条
承诺类型：主动型
承诺事由：主动型，自愿作出承诺
承诺内容：1.严格遵守法律、法规和规章，积极落实企业安全生产主体责任，扎实有效地开展安全生产工作，不断提升企业安全生产本质水平，努力塑造企业诚实守信的良好形象，促进企业健康有序发展。2.提供给应急管理部门的所有资料均合法、真实、有效，无伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责。3.严格依法开展生产经营活动，建立健全并严格落实安全生产责任制度，确保职工生命健康安全。4.主动接受应急管理部门的监管，自愿接受依法开展的日常检查并严格执行执法指令。
承诺作出日期：2022-07-06
承诺履行状态：全部履行
承诺受理单位：西峡县应急管理局

承诺受理单位统一社会信用代码：11411323MB15367040

企业信用承诺信息

承诺编码：41132320220411M00348 第 51 条

承诺类型：主动型

承诺事由：主动型，自愿作出承诺

承诺内容：严格依法开展生产经营活动，建立健全并严格落实安全生产责任制度，确保职工生命健康安全。

承诺作出日期：2022-04-11

承诺履行状态：全部履行

承诺受理单位：西峡县应急管理局

承诺受理单位统一社会信用代码：11411323MB15367040

企业信用承诺信息

承诺编码：41132320220626506089 第 52 条

承诺类型：主动型

承诺事由：主动型，自愿作出承诺

承诺内容：1.严格按照国家、省市相关规定，落实企业主体责任，对来自或去过疫情重点地区的返工人员，实行从严管控。如发现可疑病例，及时报告相关信息，协助做好医学观察、隔离等措施。2.全面加强复工后返工人员登记管理，严密关注其健康状况，确保“早发现、早报告、早隔离、早处置”。3.本承诺书交由所在地卫生防疫部门留存。

承诺作出日期：2022-06-26

承诺履行状态：全部履行

承诺受理单位：西峡县卫生健康委员会

承诺受理单位统一社会信用代码：11411323006051984U

企业信用承诺信息

承诺编码：41132320230619013961 第 53 条
承诺类型：主动型
承诺事由：主动作出承诺
承诺内容：承诺减少排放，进行绿色生产
承诺作出日期：2023-06-19
承诺履行状态：全部履行
承诺受理单位：南阳市生态环境局西峡分局
承诺受理单位统一社会信用代码：114113230060528801

企业信用承诺信息

承诺编码：41132320230116000874 第 54 条
承诺类型：主动型
承诺事由：自愿作出承诺
承诺内容：自觉接受政府、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督。
承诺作出日期：2023-01-16
承诺履行状态：全部履行
承诺受理单位：西峡县市场监督管理局
承诺受理单位统一社会信用代码：11411323006052792J

企业信用承诺信息

承诺编码：41132320220624496750 第 55 条
承诺类型：主动型
承诺事由：主动型，自愿作出承诺
承诺内容：1.严格按照国家、省市相关规定，落实企业主体责任，对来自或去过疫情重点地区的返

工人员，实行从严管控。如发现可疑病例，及时报告相关信息，协助做好医学观察、隔离等措施。2.全面加强复工后返工人员登记管理，严密关注其健康状况，确保“早发现、早报告、早隔离、早处置”。3.本承诺书交由所在地卫生防疫部门留存。

承诺作出日期：2022-06-24
承诺履行状态：全部履行
承诺受理单位：西峡县卫生健康委员会
承诺受理单位统一社会信用代码：11411323006051984U

| 企业信用承诺信息

承诺编码：41132320220711M00348
承诺类型：主动型
承诺事由：主动承诺
承诺内容：关于提供资料的及时性、真实性、完整性的承诺
承诺作出日期：2022-07-11
承诺履行状态：全部履行
承诺受理单位：西峡县审计局
承诺受理单位统一社会信用代码：11411323006052776W

第 56 条

| 企业信用承诺信息

承诺编码：41132320230110040265
承诺类型：主动型
承诺事由：主动型，自愿作出承诺
承诺内容：主动接受应急管理部門的監管，自願接受依法開展的日常檢查並嚴格執行執法指令。
承诺作出日期：2023-01-10
承诺履行状态：全部履行
承诺受理单位：西峡县应急管理局
承诺受理单位统一社会信用代码：11411323MB15367040

第 57 条

码：

| 企业信用承诺信息

| | | |
|-----------------|----------------------|--------|
| 承诺编码： | 41132320230110000598 | 第 58 条 |
| 承诺类型： | 主动型 | |
| 承诺事由： | 主动型，自愿作出承诺 | |
| 承诺内容： | 遵守法律法规，诚信经营，确保产品质量 | |
| 承诺作出日期： | 2023-01-10 | |
| 承诺履行状态： | 全部履行 | |
| 承诺受理单位： | 西峡县市场监督管理局 | |
| 承诺受理单位统一社会信用代码： | 11411323006052792J | |

| 企业信用承诺信息

| | | |
|-----------------|----------------------|--------|
| 承诺编码： | 41132320221010M03044 | 第 59 条 |
| 承诺类型： | 主动型 | |
| 承诺事由： | 主动型，自愿作出承诺 | |
| 承诺内容： | 疫情防控 | |
| 承诺作出日期： | 2022-10-10 | |
| 承诺履行状态： | 全部履行 | |
| 承诺受理单位： | 南阳市西峡县卫健委 | |
| 承诺受理单位统一社会信用代码： | 11411323006051984U | |

| 企业信用承诺信息

| | | |
|-------|----------------------|--------|
| 承诺编码： | 41132320230516016041 | 第 60 条 |
|-------|----------------------|--------|

承诺类型：主动型
承诺事由：自愿作出承诺
承诺内容：切实保证产品质量，维护消费者的合法权益
承诺作出日期：2023-05-16
承诺履行状态：全部履行
承诺受理单位：西峡县市场监督管理局
承诺受理单位统一社会信用代码：11411323006052792J

| 企业信用承诺信息

承诺编码：41132320230412001361 第 61 条
承诺类型：主动型
承诺事由：主动作出承诺
承诺内容：承诺按照规定申领、保管、开具、取得发票。
承诺作出日期：2023-04-12
承诺履行状态：全部履行
承诺受理单位：国家税务总局西峡县税务局
承诺受理单位统一社会信用代码：11411323MB19515617

| 企业信用承诺信息

承诺编码：41132320230420000348 第 62 条
承诺类型：主动型
承诺事由：主动型，自愿作出承诺
承诺内容：严格依法开展生产经营活动，建立健全并严格落实安全生产责任制度，确保职工生命健康安全。
承诺作出日期：2023-04-20
承诺履行状态：全部履行

承诺受理单位：西峡县应急管理局
承诺受理单位统一社会信用代码：11411323MB15367040

| 企业信用承诺信息

承诺编码：41132320220214M00348 第 63 条
承诺类型：主动型
承诺事由：主动型，自愿作出承诺
承诺内容：关于提供资料的及时性、真实性、完整性的承诺
承诺作出日期：2022-02-14
承诺履行状态：全部履行
承诺受理单位：西峡县审计局
承诺受理单位统一社会信用代码：11411323006052776W

| 企业信用承诺信息

承诺编码：41132320230516015864 第 64 条
承诺类型：审批替代型
承诺事由：自愿作出承诺
承诺内容：本单位(人)已认真学习了相关法律法规规章和规范性文件，了解了该项行政许可的有关要求，对有关规定的內容已经知晓和全面理解，承诺自身能够满足办理该事项的条件、标准技术要求。
承诺作出日期：2023-05-16
承诺履行状态：全部履行
承诺受理单位：西峡县市场监督管理局
承诺受理单位统一社会信用代码：11411323006052792J

| 企业信用承诺信息

| | | |
|-----------------|----------------------|--------|
| 承诺编码： | 41132320230510042236 | 第 65 条 |
| 承诺类型： | 主动型 | |
| 承诺事由： | 主动型，自愿作出承诺 | |
| 承诺内容： | 依法保护区域内环境卫生 | |
| 承诺作出日期： | 2023-05-10 | |
| 承诺履行状态： | 全部履行 | |
| 承诺受理单位： | 南阳市生态环境局西峡分局 | |
| 承诺受理单位统一社会信用代码： | 114113230060528801 | |

| 企业信用承诺信息

| | | |
|-----------------|---------------------------------|--------|
| 承诺编码： | 41132320230114009088 | 第 66 条 |
| 承诺类型： | 审批替代型 | |
| 承诺事由： | 自愿作出承诺 | |
| 承诺内容： | 承诺坚决抵制不合格产品的经营销售，发现不合格的产品后，及时更改 | |
| 承诺作出日期： | 2023-01-14 | |
| 承诺履行状态： | 全部履行 | |
| 承诺受理单位： | 西峡县市场监督管理局 | |
| 承诺受理单位统一社会信用代码： | 11411323006052792J | |

| 企业信用承诺信息

| | | |
|---------|-------------------------------|--------|
| 承诺编码： | 41132320230412000609 | 第 67 条 |
| 承诺类型： | 主动型 | |
| 承诺事由： | 主动作出承诺 | |
| 承诺内容： | 承诺依法按照规定的期限申报办理税务登记、变更或者注销登记。 | |
| 承诺作出日期： | 2023-04-12 | |

承诺履行状态：全部履行
承诺受理单位：国家税务总局西峡县税务局
承诺受理单位统一社会信用代码：11411323MB19515617

| 企业信用承诺信息

承诺编码：41132320220630524767 第 68 条
承诺类型：主动型
承诺事由：主动型，自愿作出承诺
承诺内容：1.严格遵守法律、法规和规章，积极落实企业安全生产主体责任，扎实有效地开展安全生产工作，不断提升企业安全生产本质水平，努力塑造企业诚实守信的良好形象，促进企业健康有序发展。2.提供给应急管理部门的所有资料均合法、真实、有效，无伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责。3.严格依法开展生产经营活动，建立健全并严格落实安全生产责任制度，确保职工生命健康安全。4.主动接受应急管理部门的监管，自愿接受依法开展的日常检查并严格执行执法指令。
承诺作出日期：2022-06-30
承诺履行状态：全部履行
承诺受理单位：西峡县应急管理局
承诺受理单位统一社会信用代码：11411323MB15367040

| 企业信用承诺信息

承诺编码：41132320220720590140 第 69 条
承诺类型：主动型
承诺事由：主动型，自愿作出承诺
承诺内容：1.严格遵守法律、法规和规章，积极落实企业安全生产主体责任，扎实有效地开展安全生产工作，不断提升企业安全生产本质水平，努力塑造企业诚实守信的良好形象，促进企业健康有序发展。2.提供给应急管理部门的所有资料均合法、真实、有效，无伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责。3.严格依法开展生产经营活动，建立健全并严格落实安全生产责任制度，确保职工生命健康安全。4.主动接受应急管理部门的监管，自愿接受依法开展的日常检查并严格执行执法指令。
承诺作出日期：2022-07-20

承诺履行状态：全部履行

承诺受理单位：西峡县应急管理局

承诺受理单位统一社会信用代码：11411323MB15367040

| 企业信用承诺信息

承诺编码：41132320230412028626 第 70 条

承诺类型：主动型

承诺事由：主动作出承诺

承诺内容：承诺节约用水，节约社会资源。

承诺作出日期：2023-04-12

承诺履行状态：全部履行

承诺受理单位：西峡县住房和城乡建设局

承诺受理单位统一社会信用代码：11411323006052864B

| 企业信用承诺信息

承诺编码：41132320230510036229 第 71 条

承诺类型：主动型

承诺事由：主动型，自愿作出承诺

承诺内容：对所提供的项目备案资料合法性、真实性、准确性、完整性和有效性负责

承诺作出日期：2023-05-10

承诺履行状态：全部履行

承诺受理单位：西峡县发展和改革委员会

承诺受理单位统一社会信用代码：11411323737439886W

| 企业信用承诺信息

承诺编码：41132320230309211688 第 72 条
承诺类型：主动型
承诺事由：主动型，自愿作出承诺
承诺内容：按照环境保护法要求，在生产经营中达标排放
承诺作出日期：2023-03-09
承诺履行状态：全部履行
承诺受理单位：南阳市生态环境局西峡分局
承诺受理单位统一社会信用代码：114113230060528801

| 企业信用承诺信息

承诺编码：41132320230616000381 第 73 条
承诺类型：主动型
承诺事由：诚信兴商承诺
承诺内容：承诺遵守法律法规，诚信经营
承诺作出日期：2023-06-16
承诺履行状态：全部履行
承诺受理单位：西峡县商务局
承诺受理单位统一社会信用代码：11411323795740386Y

| 企业信用承诺信息

承诺编码：41132320230110021095 第 74 条
承诺类型：主动型
承诺事由：主动型，自愿作出承诺
承诺内容：遵守商业道德，承担社会责任

承诺作出日期：2023-01-10
承诺履行状态：全部履行
承诺受理单位：西峡县市场监督管理局
承诺受理单位统一社会信用代码：11411323006052792J

企业信用承诺信息

承诺编码：41132320230625021981 第 75 条
承诺类型：审批替代型
承诺事由：申请办理项目备案
承诺内容：对所提供的资料合法性、真实性、准确性、完整性和有效性负责。
承诺作出日期：2023-06-25
承诺履行状态：全部履行
承诺受理单位：西峡县发展和改革委员会
承诺受理单位统一社会信用代码：11411323737439886W

企业信用承诺信息

承诺编码：41132320230412019287 第 76 条
承诺类型：主动型
承诺事由：主动作出承诺
承诺内容：承诺积极加入全县反诈行动，做诚信商户、诚信居民
承诺作出日期：2023-04-12
承诺履行状态：全部履行
承诺受理单位：西峡县公安局
承诺受理单位统一社会信用代码：11411323006051941E

| 企业信用承诺信息

| | | |
|-----------------|----------------------|--------|
| 承诺编码： | 41132320230515038006 | 第 77 条 |
| 承诺类型： | 主动型 | |
| 承诺事由： | 主动作出承诺 | |
| 承诺内容： | 法定代表人、自然人股东身份真实性诚信承诺 | |
| 承诺作出日期： | 2023-05-15 | |
| 承诺履行状态： | 全部履行 | |
| 承诺受理单位： | 西峡县市场监督管理局 | |
| 承诺受理单位统一社会信用代码： | 11411323006052792J | |

| 企业信用承诺信息

| | | |
|-----------------|--|--------|
| 承诺编码： | 41132320230325000693 | 第 78 条 |
| 承诺类型： | 主动型 | |
| 承诺事由： | 主动型，自愿作出承诺 | |
| 承诺内容： | 1.传承传统美德。自觉传承爱物知恩、尊重劳动、勤俭节约、珍惜幸福的传统美德，踊跃参与“光盘行动”，努力打造温馨和谐的就餐环境，享受“文明用餐、节俭惜福”的快乐。2.引导理性消费。主动引导接待对象节约用餐，合理设计菜单，调整菜品分量，提供小份菜，半份菜，餐后主动帮助打包，避免餐桌上的浪费。350.营造良好氛围。在醒目位置张贴“浪费可耻、节约光荣”、“光盘行动”宣传标语、海报，营造节约用餐的良好氛围。 | |
| 承诺作出日期： | 2023-03-25 | |
| 承诺履行状态： | 全部履行 | |
| 承诺受理单位： | 西峡县发展和改革委员会 | |
| 承诺受理单位统一社会信用代码： | 11411323737439886W | |

| 企业信用承诺信息

承诺编码：41132320230504000348
承诺类型：主动型
承诺事由：主动承诺
承诺内容：关于守法诚信经营的承诺
承诺作出日期：2023-05-04
承诺履行状态：全部履行
承诺受理单位：西峡县人力资源和社会保障局
承诺受理单位统一社会信用代码：11411323006052899X

第 79 条

| 企业信用承诺信息

承诺编码：41132320230111000585
承诺类型：主动型
承诺事由：主动承诺
承诺内容：自愿遵守环保法律法规
承诺作出日期：2023-01-11
承诺履行状态：全部履行
承诺受理单位：南阳市生态环境局西峡分局
承诺受理单位统一社会信用代码：114113230060528801

第 80 条

| 企业信用承诺信息

承诺编码：41132320221010M00348
承诺类型：主动型
承诺事由：主动型，自愿作出承诺
承诺内容：关于守法诚信经营的承诺
承诺作出日期：2022-10-10
承诺履行状态：全部履行

第 81 条

承诺受理单位：南阳市西峡县市场监督管理局

承诺受理单位统一社会信用代码：11411323006052792J

企业信用承诺信息

承诺类型：主动型 第 82 条
承诺事由：主动公示型
承诺作出日期：2021-12-31
承诺受理单位：国家税务总局西峡县税务局
承诺履行状态：——

企业信用承诺信息

承诺编码：41132320230625047508 第 83 条
承诺类型：主动型
承诺事由：主动作出承诺
承诺内容：承诺响应政府号召，净化城市环境，‘做文明市民’
承诺作出日期：2023-06-25
承诺履行状态：全部履行
承诺受理单位：西峡县城市管理局（西峡县城市综合执法局）
承诺受理单位统一社会信用代码：124113237967999027

企业信用承诺信息

承诺编码：41132320230116000988 第 84 条
承诺类型：审批替代型
承诺事由：自愿作出承诺

承诺内容： 本单位(人)已认真学习了相关法律法规规章和规范性文件，了解了该项行政许可的有要求，对有关规定的內容已经知晓和全面理解，承诺自身能够满足办理该事项的条件、标准技术要求。

承诺作出日期： 2023-01-16

承诺履行状态： 全部履行

承诺受理单位： 西峡县市场监督管理局

承诺受理单位统一社会信用代码： 11411323006052792J

| 企业信用承诺信息

承诺编码： 41132320230310000701 第 85 条

承诺类型： 主动型

承诺事由： 主动型，自愿作出承诺

承诺内容： 依法保护自然资源。

承诺作出日期： 2023-03-10

承诺履行状态： 全部履行

承诺受理单位： 西峡县自然资源局

承诺受理单位统一社会信用代码： 11411323419285009B

| 企业信用承诺信息

承诺编码： 41132320230410000736 第 86 条

承诺类型： 主动型

承诺事由： 主动型，自愿作出承诺

承诺内容： 节约用水，杜绝浪费

承诺作出日期： 2023-04-10

承诺履行状态： 全部履行

承诺受理单位： 西峡县水利局

承诺受理单位统一社会信用代码： 11411323006052194N

码：

| 企业信用承诺信息

| | | |
|-----------------|----------------------|--------|
| 承诺编码： | 41132320230121M00348 | 第 87 条 |
| 承诺类型： | 主动型 | |
| 承诺事由： | 主动型，自愿作出承诺 | |
| 承诺内容： | 维护市场正常经营 | |
| 承诺作出日期： | 2023-01-21 | |
| 承诺履行状态： | 全部履行 | |
| 承诺受理单位： | 西峡县市场监督管理局 | |
| 承诺受理单位统一社会信用代码： | 11411323006052792J | |

| 企业信用承诺信息

| | | |
|-----------------|----------------------|--------|
| 承诺编码： | 41132320230110005338 | 第 88 条 |
| 承诺类型： | 主动型 | |
| 承诺事由： | 主动型，自愿作出承诺 | |
| 承诺内容： | 安全生产 | |
| 承诺作出日期： | 2023-01-10 | |
| 承诺履行状态： | 全部履行 | |
| 承诺受理单位： | 西峡县应急管理局 | |
| 承诺受理单位统一社会信用代码： | 11411323MB15367040 | |

| 企业信用承诺信息

| | | |
|-------|----------------------|--------|
| 承诺编码： | 41132320230612028222 | 第 89 条 |
|-------|----------------------|--------|

承诺类型：行业自律型
承诺事由：主动作出承诺
承诺内容：行业自律型，参加企业协会组织的信用承诺活动
承诺作出日期：2023-06-12
承诺履行状态：全部履行
承诺受理单位：西峡县民政局
承诺受理单位统一社会信用代码：114113230060519761

| 企业信用承诺信息

承诺编码：41132320230303000275
承诺类型：主动型
承诺事由：主动型，自愿作出承诺
承诺内容：关于依法履行纳税义务的承诺
承诺作出日期：2023-03-03
承诺履行状态：全部履行
承诺受理单位：国家税务总局西峡县税务局
承诺受理单位统一社会信用代码：11411323MB19515617

第 90 条

| 企业信用承诺信息

承诺编码：41132320230512000348
承诺类型：主动型
承诺事由：主动型，自愿作出承诺
承诺内容：严格按照疫情防控要求，做好来访人员登记等工作。
承诺作出日期：2023-05-12
承诺履行状态：全部履行
承诺受理单位：西峡县卫生健康委员会

第 91 条

承诺受理单位统一社会信用代码：11411323006051984U

企业信用承诺信息

承诺编码：41132320230610000359 第 92 条

承诺类型：主动型

承诺事由：主动型，自愿作出承诺

承诺内容：严格依法开展生产经营活动，建立健全并严格落实安全生产责任制度，确保职工生命健康安全。

承诺作出日期：2023-06-10

承诺履行状态：全部履行

承诺受理单位：西峡县应急管理局

承诺受理单位统一社会信用代码：11411323MB15367040

企业信用承诺信息

承诺编码：41132320230516015075 第 93 条

承诺类型：主动型

承诺事由：自愿作出承诺

承诺内容：自觉接受政府、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督。

承诺作出日期：2023-05-16

承诺履行状态：全部履行

承诺受理单位：西峡县市场监督管理局

承诺受理单位统一社会信用代码：11411323006052792J

企业信用承诺信息

承诺编码：41132320230320000558 第 94 条

承诺类型：主动型

承诺事由：主动型，自愿作出承诺

承诺内容：诚信参与政府采购

承诺作出日期：2023-03-20

承诺履行状态：全部履行

承诺受理单位：西峡县财政局

承诺受理单位统一社会信用代码：11411323006052004P

| 企业信用承诺信息

承诺编码：41132320230110005614 第 95 条

承诺类型：主动型

承诺事由：主动型，自愿作出承诺

承诺内容：依法缴纳职工医保费用

承诺作出日期：2023-01-10

承诺履行状态：全部履行

承诺受理单位：西峡县人力资源和社会保障局

承诺受理单位统一社会信用代码：11411323006052899X

| 企业信用承诺信息

承诺编码：41132320230409019080 第 96 条

承诺类型：主动型

承诺事由：主动型，自愿作出承诺

承诺内容：自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督。

承诺作出日期：2023-04-09

承诺履行状态：全部履行

承诺受理单位：西峡县文化广电和旅游局
承诺受理单位统一社会信用代码：11411323569840549X

| 企业信用承诺信息

承诺编码：41132320230110006325 第 97 条
承诺类型：主动型
承诺事由：主动型，自愿作出承诺
承诺内容：依法缴纳职工医保费用
承诺作出日期：2023-01-10
承诺履行状态：全部履行
承诺受理单位：西峡县医疗保障局
承诺受理单位统一社会信用代码：11411323MB19742103

| 企业信用承诺信息

承诺编码：41132320230126000099 第 98 条
承诺类型：主动型
承诺事由：主动型，自愿作出承诺
承诺内容：诚信参与政府采购
承诺作出日期：2023-01-26
承诺履行状态：全部履行
承诺受理单位：西峡县财政局
承诺受理单位统一社会信用代码：11411323006052004P

| 企业信用承诺信息

承诺编码：41132320230614000368 第 99 条
承诺类型：主动型
承诺事由：主动承诺
承诺内容：关于守法诚信经营的承诺
承诺作出日期：2023-06-14
承诺履行状态：全部履行
承诺受理单位：西峡县人力资源和社会保障局
承诺受理单位统一社会信用代码：11411323006052899X

企业信用承诺信息

承诺编码：41132320230510000611 第 100 条
承诺类型：主动型
承诺事由：主动承诺
承诺内容：对所提供的项目备案资料合法性、真实性、准确性等。
承诺作出日期：2023-05-10
承诺履行状态：全部履行
承诺受理单位：西峡县发展和改革委员会
承诺受理单位统一社会信用代码：11411323737439886W

七、信用评价信息 (共 0 条)

此项信息相关部门暂未提供

八、司法判决及执行信息 (共 0 条)

此项信息相关部门暂未提供

九、其他信息 (共 0 条)

查询期内无相关记录

十、信用状况提升建议

建议秉持诚信理念，合法有序开展经营活动。

结束

“信用河南”无违法违规记录证明版专项信用报告



信用中国(河南)

CREDIT.HENAN.GOV.CN



2026年10月22日之前
可扫码核验本报告

市场主体专项信用报告

(无违法违规记录证明版)

机构名称：西峡县正通公路养护有限公司
统一社会信用代码：91411323MA45W8TBXW
报告编号：20251022KLK74Q016347

报告生成时间：2025年10月22日15:52:00

报告出具单位：河南省营商环境和社会信用建设中心

报告说明

1. 本报告所展示的信息为截至本报告生成时间的前一日, 由本省行政机关、法律法规授权的具有管理公共事务职能的组织、有关中央垂直管理单位等向河南省信用信息平台提供的信息。“信用中国(河南)”网站(credit.henan.gov.cn)承诺在数据汇总、加工、整合的过程中保持客观中立, 不主动编辑或修改数据, 数据的全面性、合法性、准确性由数据来源单位负责。

2. 本报告所指的违法违规记录是河南省各级各相关单位产生的行政处罚(含已修复的行政处罚信息, 不含简易程序处罚信息)、行政强制、严重失信主体名单以及依法纳入的其他信用信息。

3. 本报告涵盖的时间范围和领域由市场主体根据应用场景自行选定, 本报告可用于替代市场主体在本省行政区域内在其选定时间范围和领域内的无违法违规记录证明。

4. 市场主体伪造、篡改本报告信息的, 依法承担法律责任。因市场主体未妥善保管本报告, 造成本报告内容被不当使用或导致其他后果的, 相关责任由市场主体自行承担。

5. 本报告已在河南省信用信息平台“豫信链”(区块链)上存证并添加报告核验码。如需对内容的真实性进行核验, 可通过扫一扫报告首页“核验码”, 查看与本报告生成时的内容是否一致。

6. 信用修复

(1) 如需对专项信用报告中相关失信信息进行信用修复, 可进入“信用中国(河南)”网站“信用修复一件事”专区按照相关流程修复指引进行信用修复申请。

(2) 信用主体信用修复后, 相关失信信息将在信用中国、信用中国(河南)及地市信用网站撤销公示; 然而, 因违法违规行为已经发生, 专项信用报告中相应领域违法违规情况仍显示为“有”, 但在违法违规详情中该条信息将标注为“已修复”。

(3) 对于按照国家要求不予公示的信息(包括被处以警告、通报批评的行政处罚信息), 将标注为“无需信用修复”; 对于最长公示期已届满的行政处罚信息, 将标注为“已满最长公示期”。

注: 根据国家有关规定, 行政强制信息目前暂无信用修复渠道, 因此不对其进行标注。

7. 如市场主体发现报告信息存在错误、遗漏、收录期限不符合规定或与数据源单位信息不一致等情况, 可通过以下流程进行异议申诉:

- (1) 进入“信用中国(河南)”网站的“无违法违规记录证明”专栏;
- (2) 点击“我要办理”, 完成法人登录, 选择时间范围、用途等;
- (3) 点击“报告预览”按钮, 找到存在异议的信息, 点击该信息右上角的“异议申诉”按钮, 提出异议。

信息概览

一、主体身份信息

| | | | |
|-----------|---------------|------|---------------|
| 主体名称 | 西峡县正通公路养护有限公司 | | |
| 主体类型 | 企业 | | |
| 法定代表人/负责人 | 李永茂 | 成立日期 | 2018-10-19 |
| 存续状态 | 存续（在营、开业、在册） | 登记机关 | 南阳市西峡县市场监督管理局 |
| 注册地址 | 西峡县五里桥镇北堂村 | | |

二、本报告涵盖的时间范围

根据申请人的选择，本报告涵盖的时间范围为：2022年10月22日（含）至2025年10月21日（含）。

三、报告摘要

近3年（2022年10月22日-2025年10月21日），在申请人选择的47个领域中，未查询到违法违规信息。

四、本报告涵盖的领域

本报告所涵盖的领域由申请人在所有可选领域中自主选择。申请人所选择的47个领域的违法违规情况如下：

| 领域 | 违法违规情况 | 领域 | 违法违规情况 | 领域 | 违法违规情况 |
|------------|--------|------------|--------|----------|--------|
| 发展改革 | 无 | 教育 | 无 | 科技 | 无 |
| 工业和信息化 | 无 | 公安 | 无 | 民政 | 无 |
| 司法行政 | 无 | 财政 | 无 | 人力资源社会保障 | 无 |
| 自然资源 | 无 | 生态环境 | 无 | 住房城乡建设 | 无 |
| 交通运输 | 无 | 水利 | 无 | 农业农村 | 无 |
| 商贸流通（商务） | 无 | 文化旅游 | 无 | 卫生健康 | 无 |
| 退役军人事务管理 | 无 | 应急管理（安全生产） | 无 | 林业 | 无 |
| 市场监管 | 无 | 广播电视 | 无 | 体育 | 无 |
| 统计 | 无 | 医疗保障 | 无 | 人民防空 | 无 |
| 金融（地方金融监管） | 无 | 知识产权 | 无 | 粮食和物资储备 | 无 |
| 药品安全 | 无 | 电影和新闻出版 | 无 | 税务 | 无 |
| 气象 | 无 | 通信 | 无 | 邮政 | 无 |
| 城市管理 | 无 | 消防安全 | 无 | 法院执行 | 无 |
| 烟草专卖 | 无 | 网信 | 无 | 审计 | 无 |
| 文物 | 无 | 住房公积金 | 无 | 密码管理 | 无 |
| 档案 | 无 | 地震 | 无 | | |

备注：

1. 对于无违法违规记录的领域，显示为“无”，在第五部分“[违法违规详情](#)”中将不再列出该领域。
2. 对于有违法违规记录的领域，显示为“有”，在第五部分“[违法违规详情](#)”中列出该领域具体违法违规记录信息。

五、违法违规详情

未查询到违法违规信息

未被省级及以上主管部门取消招标项目所在地的投标资格且处于有效期内

承诺书

西峡县公路事业发展中心（招标人名称）：

我方在此承诺：我方未被省级及以上主管部门取消招标项目所在地的投标资格且处于有效期内。

我公司对此承诺的真实性负责，若承诺不实，造成的后果由我方自行负责，愿放弃本项目中标机会，并承担一切法律责任，

特此承诺

投标人： 西峡县正通公路养护有限公司 （电子签章）

法定代表人或其委托代理人：_____（电子签名）

2025 年 10 月 31 日

未被责令停业，暂扣或吊销执照，或吊销资质证书的承诺书

西峡县公路事业发展中心（招标人名称）：

我方在此承诺：我方未被责令停业，暂扣或吊销执照，或吊销资质证书。

我公司对此承诺的真实性负责，若承诺不实，造成的后果由我方自行负责，愿放弃本项目中标机会，并承担一切法律责任，

特此承诺

投标人：西峡县正通公路养护有限公司（电子签章）

法定代表人或其委托代理人：_____（电子签名）

2025 年 10 月 31 日

不存在进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形的承诺书

西峡县公路事业发展中心（招标人名称）：

我方在此承诺：我方不存在进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形。

我公司对此承诺的真实性负责，若承诺不实，造成的后果由我方自行负责，愿放弃本项目中标机会，并承担一切法律责任，

特此承诺

投标人：西峡县正通公路养护有限公司（电子签章）

法定代表人或其委托代理人：_____（电子签名）

2025 年 10 月 31 日

决不存在下列情形之一的承诺

（招标人名称）：西峡县公路事业发展中心

我方在此承诺：决不存在下列情形之一。

- （1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；
- （2）为本标段前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；
- （3）为本标段的监理人；
- （4）为本标段的代建人；
- （5）为本标段提供招标代理服务的；
- （6）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；
- （7）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；
- （8）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；
- （9）被责令停业的；
- （10）被暂停或取消投标资格的；
- （11）财产被接管或冻结的；
- （12）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。

我公司对此承诺的真实性负责，若承诺不实，造成的后果由我方自行负责，并愿放弃本项目中标机会，承担一切法律责任。

特此承诺

投标人：西峡县正通公路养护有限公司（电子签章）

法定代表人：_____（电子签名）

2025 年 10 月 31 日

(六) 拟委派的项目经理和项目总工资历表
拟委派的项目经理资历表

| | | | | | |
|-----------|---|--|----|---------------|-------------------------------------|
| 姓名 | 李永茂 | 年龄 | 38 | 专业 | 道路桥梁与渡河工程 |
| 技术职称 | 高级工程师 | 学历 | 本科 | 拟在本标段工程任职 | 项目经理 |
| 执业资格证书编号: | 豫241181835142 | | | 安全生产考核合格证书编号: | 豫交安B24G01660 |
| 身份证号码: | 411330198701141550 | | | | |
| 工作年限 | 18年 | | | 类似施工经验年限 | 17年 |
| 毕业学校 | 2014年毕业于武汉理工大学学校 道路桥梁与渡河工程 专业，学制2.5年 | | | | |
| 经 历 | | | | | |
| 时间 | 参加过的类似工程项目名称 | | | 担任职务 | 发包人及联系电话 |
| 2023年 | 西峡县2023年国省干线公路桥梁改造项目 | | | 项目经理 | 西峡县公路事业发展中心 联系电话: 0377-838169036 |
| 2024年 | 西峡县公路事业发展中心河南省南阳市西峡县G208线磨眼沟桥危桥改造工程项目 | | | 项目经理 | 西峡县公路事业发展中心 联系电话: 0377-838169036 |
| 2025年 | 西峡县公路事业发展中心河南省南阳市西峡县S328线K477+950-K478+050线公路灾害防治工程 | | | 项目经理 | 西峡县公路事业发展中心 联系电话: 0377-838169036 |
| 获奖情况 | | / | | | |
| 说明在岗情况 | | <input checked="" type="checkbox"/> 目前未在其他项目上任职，现从事工作为: 日常工作。 <input type="checkbox"/> 目前虽在其他项目上任职，但本项目中标后能够从该项目撤离,目前任职项目: /,担任职位: /。 | | | |
| 备 注 | | / | | | |

注：1. 本表应填写项目经理和项目总工相关情况。
2. 投标人应根据招标文件第二章“投标人须知”第 3.5.5 项的要求在本表后附相关证明材料。

项目经理二级建造师证



中华人民共和国二级建造师注册证书

姓 名: 李永茂

性 别: 男


出生日期: 1987-01-14

注册编号: 豫241181835142

聘用企业: 西峡县正通公路养护有限公司

注册专业: 公路工程 (2024年10月17日 至 2027年10月16日)



个人签名: 
签名日期: 2025.10.



CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

项目经理身份证

姓名 李永茂

性别 男 民族 汉

出生 1987 年 1 月 14 日

住址 河南省西峡县城关镇河防
路7号附17号



公民身份号码 411330198701141550



中华人民共和国
居民身份证

签发机关 西峡县公安局

有效期限 2017.09.26-2037.09.26

项目经理交安B证

公路水运工程施工企业主要负责人和安全生产
管理人员安全生产考核合格证书



姓名: 李永茂 性别: 男
出生年月: 1987-01-14 身份证号: 411330198701141550

经公路水运工程施工企业主要负责人和安全生产管理人员安全生产考核合格, 特发此证。

企业名称: 西峡县正通公路养护有限公司

证书编号: 豫交安B24G01660

有效期: 2024-12-13 至 2027-12-13

考核部门: 河南省交通运输厅



中华人民共和国交通运输部监制

项目经理高级工程师证

| | |
|---|---|
| 本证书由河南省人力资源和社会保障厅统一编号制发。 | 河南省专业技术人员 职称证书 (高级) |
| |  |
| | 河南省人力资源和社会保障厅制 |
| | 编号: Nº 00541177 |
|  |  |
| |  扫描全能王 亿人都在用的扫描App |

| | |
|---|---|
| 从事专业 <u>道路与桥梁工程</u> |  |
| 取得职称名称 <u>高级工程师</u> | |
| 取得职称级别 <u>副高级</u> | |
| 取得方式 <u>评审</u> | |
| 评审组织 (认定部门) <u>河南省工程系列交通运输专业副高级职称评审委员会</u> | 姓名 <u>李永茂</u> 性别 <u>男</u> |
| 评审(认定) 通过时间 <u>2024. 12</u> | 出生年月 <u>1987. 01</u> |
| 发证单位 <u>河南省人力资源和社会保障厅</u> | 工作单位 <u>西峡县正通公路养护有限公司</u> |
| | 证书编号 <u>B202409131300301</u> |
| | <u>2025 年 02 月 12 日</u> |
|  |  |
| |  扫描全能王 亿人都在用的扫描App |

项目经理学历证明

| | | |
|--|--|--|
| 普通高等学校 | |  |
| 毕业证书 | | |
| 学生 李永茂 性别 男 ，一九八七年一月十四日生，于二〇一一年三月至二〇一四年七月在本校网络教育 道路桥梁与渡河工程 专业 2.5 年制专升本 学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。 | | |
| 校 名： |  武汉理工大学 | 校 长：  |
| 证书编号： | 104977201405002624 | 二〇一四年七月一日 |

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：<http://www.chsi.com.cn>

(六) 拟委派的项目经理和项目总工资历表

拟委派的项目总工资历表

| | | | | | |
|------------------|--|--|----|-----------------------|------------------------------------|
| 姓 名 | 蔡晓龙 | 年 龄 | 37 | 专业 | 水利工程实验与检测技术 |
| 技术职称 | 工程师 | 学 历 | 本科 | 拟在本标段工程任职 | 项目总工 |
| 执 业 资 格 证书编号： | 豫1412023202402191 | | | 安全生产考 核合格证书 编号： | / |
| 身份证号 码： | 411330198809262530 | | | | |
| 工作年限 | 14年 | | | 类似施工经 验年限 | 8年 |
| 毕业学校 | 2011年毕业于黄河水利职业技术学院学校水利工程实验与检测技术专业，学 制四年 | | | | |
| 经 历 | | | | | |
| 时间 | 参加过的类似工程项目名称 | | | 担任职务 | 发包人及联系电话 |
| 2024年 | 西峡县公路事业发展中心河南省南阳市西峡县G208线青山沟 桥危桥改造工程项目 | | | 试验检测负 责人 | 西峡县公路事业发展中心 联系电话：0377-838169036 |
| 2024年 | 西峡县公路事业发展中心河南省南阳市G312线黄棟树桥2危 桥改造工程项目 | | | 试验检测负 责人 | 西峡县公路事业发展中心 联系电话：0377-838169036 |
| | | | | | |
| 获奖情况 | | / | | | |
| 说明在岗情况 | | <input checked="" type="checkbox"/> 目前未在其他项目上任职，现从事工作为： <u>且常生产工作</u> 。 <input type="checkbox"/> 目前虽在其他项目上任职，但本项目中标后能够从该项目 撤离,目前任职项目： <u>/</u> ,担任职位： <u>/</u> 。 | | | |
| 备 注 | | / | | | |

项目总工身份证



项目总工职称证

| | | | | | |
|----------------|------------------------|--|-----------------------|----|---|
| 从事专业 | 道路与桥梁工程 |  | | | |
| 取得职称名称 | 工程师 | | | | |
| 取得职称级别 | 中级 | | | | |
| 取得方式 | 评审 | | | | |
| 评审组织 (认定部门) | 南阳市工程系列交通运输专业中级职称评审委员会 | 姓名 | 蔡晓龙 | 性别 | 男 |
| 评审(认定) 通过时间 | 2020.06 | 出生年月 | 1988.09 | | |
| 发证单位 | 南阳市人力资源和社会保障局 | 工作单位 | 河南省中州公路工程有限公司 | | |
| | | 证书编号 | 0201909B6132307400028 | | |
| | | | 2020年07月5日 | | |

4113230001069

项目总工一级建造师证



使用有效期: 2025年10月17日
- 2026年04月15日

中华人民共和国一级建造师注册证书

姓 名: 蔡晓龙

性 别: 男

出生日期: 1988年09月26日

注册编号: 豫1412023202402191

聘用企业: 西峡县正通公路养护有限公司

注册专业: 公路工程(有效期: 2025-09-25至2028-09-24)



请登录中国建造师网
微信公众号扫一扫查询

个人签名: 蔡晓龙

签名日期: 2025年10月



签发日期: 2025年09月25日

项目总工毕业证



(七) 拟委派的其他管理和技术人员汇总表

| 姓名 | 年龄 | 拟在本标段任职 | 技术职称 | 工作年限 | 备注 |
|-----|----|---------|------|------|----|
| 吕晗 | 36 | 财务负责人 | 中级会计 | 12年 | / |
| 周代源 | 40 | 结构工程师 | 工程师 | 17年 | / |
| 薛迪 | 42 | 测量工程师 | 工程师 | 20年 | / |
| 刘星辰 | 34 | 试验检测负责人 | 工程师 | 10年 | / |
| 袁小杰 | 38 | 质检工程师 | 工程师 | 18年 | / |
| 张森 | 33 | 专职安全员 | 无 | 14年 | / |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

（八）拟委派的其他人员资历表

财务负责人资历表

| | | | | | |
|--------|---------------------------------------|---|----|---------------|--|
| 姓 名 | 吕晗 | 年 龄 | 36 | 专 业 | 会计 |
| 技术职称 | 无 | 学 历 | 本科 | 拟在本标段 工程任职 | 财务负责人 |
| 工作年限 | 12年 | | | 类似施工经验年限 | 12年 |
| 毕业学校 | 2016年7月毕业于南阳师范学院学校会计学专业，学制3年 | | | | |
| 经 历 | | | | | |
| 时 间 | 参加过的类似工程项目名称 | | | 担任职务 | 发包人及联系电话 |
| 2023年 | 西峡县2023年国省干线公路桥梁改造项目 | | | 财务 | 西峡县公路事业发展中心 联系电话： 0377-838169036 |
| 2024年 | 西峡县2024年普通国省道穿村过镇平交路口治理项目 | | | 财务 | 西峡县公路事业发展中心 联系电话： 0377-838169036 |
| 2024年 | 西峡县公路事业发展中心河南省南阳市西峡县G208线宵山沟桥危桥改造工程项目 | | | 财务 | 西峡县公路事业发展中心 联系电话： 0377-838169036 |
| 2024年 | 西峡县公路事业发展中心河南省南阳市G312线黄棟树桥2危桥改造工程项目 | | | 财务 | 西峡县公路事业发展中心 联系电话： 0377-838169036 |
| 获奖情况 | | / | | | |
| 说明在岗情况 | | <input checked="" type="checkbox"/> 目前未在其他项目上任职，现从事工作为：公司财务。 <input type="checkbox"/> 目前虽在其他项目上任职，但本项目中标后能够从该项目撤离,目前任职项目：/,担任职位：/。 | | | |
| 备 注 | | / | | | |

注：本表后附相关证明材料。

姓名 吕 晗

性别 女 民族 汉

出生 1989 年 4 月 14 日

住址 河南省西峡县五里桥镇前
营村马沟口组 2 3 号

公民身份号码 411330198904142027



中华人民共和国
居民身份证

签发机关 西峡县公安局

有效期限 2022.10.25-2042.10.25



会计专业技术资格
Accounting Professional Qualification

本证书由中华人民共和国人力资源和社会保障部、财政部批准颁发，表明持证人通过全国统一组织的考试，取得相应的专业技术资格。

姓名：吕 晗

证件号码：411330198904142027

性 别：女

出生年月：1989 年 04 月

级 别：中 级

批准日期：2020 年 09 月 07 日

管 理 号：12026135101078



（八）拟委派的其他人员资历表

结构工程师资历表

| | | | | | |
|--------|---|---|----|-----------|--|
| 姓 名 | 周代源 | 年 龄 | 40 | 专 业 | 道路桥梁工程技术 |
| 技术职称 | 工程师 | 学 历 | 专科 | 拟在本标段工程任职 | 结构工程师 |
| 工作年限 | 17年 | | | 类似施工经验年限 | 10年 |
| 毕业学校 | 2013 年7月毕业于 武汉理工大学 学校 道路桥梁工程技术 专业，学制2.5年 | | | | |
| 经 历 | | | | | |
| 时 间 | 参加过的类似工程项目名称 | | | 担任职务 | 发包人及联系电话 |
| 2023年 | 西峡县2023年国省干线公路桥梁改造项目 | | | 施工员 | 西峡县公路事业发展中心 联系电话： 0377-838169036 |
| 2024年 | 西峡县公路事业发展中心河南省南阳市西峡县G208线磨眼沟桥危桥改造工程项 目 | | | 技术负责人 | 西峡县公路事业发展中心 联系电话： 0377-838169036 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 获奖情况 | | / | | | |
| 说明在岗情况 | | <input checked="" type="checkbox"/> 目前未在其他项目上任职，现从事工作为：日常生产工作。 <input type="checkbox"/> 目前虽在其他项目上任职，但本项目中标后能够从该项目撤离,目前任职项目：/,担任职位：/。 | | | |
| 备 注 | | / | | | |

姓名 周代源
性别 男 民族 汉
出生 1985 年 12 月 13 日
住址 河南省内乡县板厂乡冯庄村柴营 3 号



公民身份号码 411327198512133510

中华人民共和国
居民身份证



签发机关 内乡县公安局
有效期限 2020.11.10-2040.11.10

普通高等学校

毕业证书



学生 周代源 性别 男， 一九八五年十二月 十三 日生，于二〇一一年 三月至二〇一三年 七月在本校 道路桥梁工程技术 专业网络教育 专科 学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。


校 名： 武汉理工大学

校 长： 

证书编号：104977201306007635

二〇一三年 七 月 一 日


中华人民共和国教育部学历证书查询网址：<http://www.chsi.com.cn>

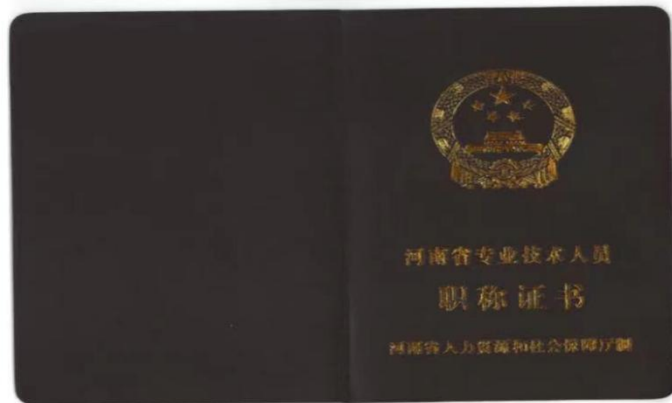

（八）拟委派的其他人员资历表

测量工程师资历表

| | | | | | |
|--------|-------------------------------------|---|----|---------------|--|
| 姓 名 | 薛迪 | 年 龄 | 42 | 专 业 | 土木工程 |
| 技术职称 | 工程师 | 学 历 | 本科 | 拟在本标段 工程任职 | 测量工程师 |
| 工作年限 | 20年 | | | 类似施工经验年限 | 3年 |
| 毕业学校 | 2022年 7 月毕业于 南阳师范学院 学校土木工程专业，学制2.5年 | | | | |
| 经 历 | | | | | |
| 时 间 | 参加过的类似工程项目名称 | | | 担任职务 | 发包人及联系电话 |
| 2022年 | 西峡县2022年干线公路路面处治及交安设施等附属工程治理项目 | | | 测量员 | 西峡县公路事业发展中心 联系电话： 0377-838169036 |
| 2023年 | 西峡县2023年国省干线公路桥梁改造项目 | | | 测量员 | 西峡县公路事业发展中心 联系电话： 0377-838169036 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 获奖情况 | | / | | | |
| 说明在岗情况 | | <input checked="" type="checkbox"/> 目前未在其他项目上任职，现从事工作为：日常工作。 <input type="checkbox"/> 目前虽在其他项目上任职，但本项目中标后能够从该项目撤离,目前任职项目：/,担任职位：/。 | | | |
| 备 注 | | / | | | |

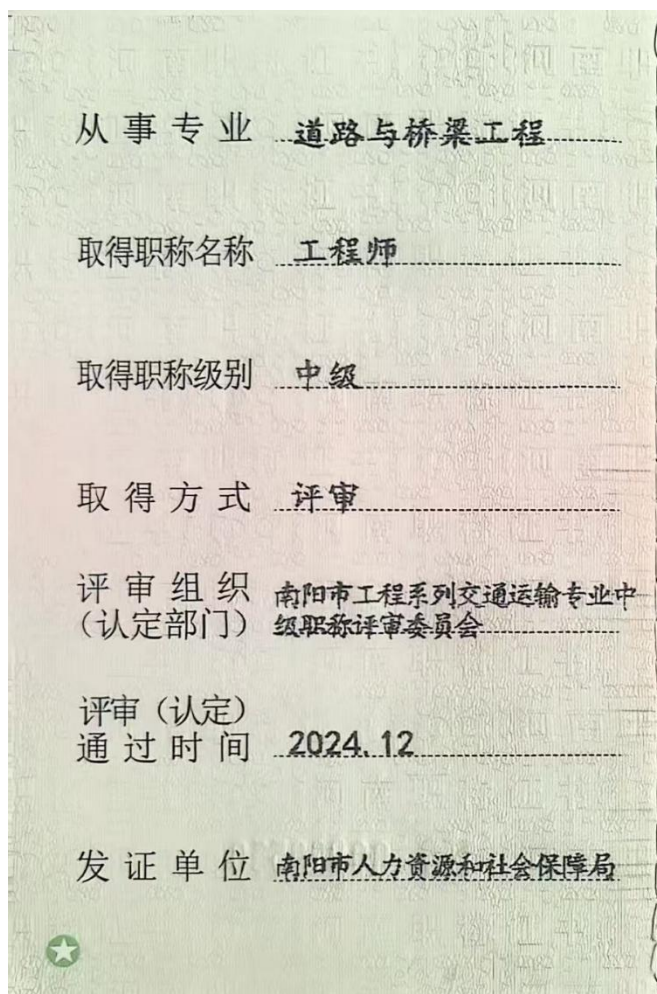



南阳师范学院
Nanyang Normal University

成人高等教育

毕业证书



学生 **薛迪** 性别 **女**，一九八三年一月八日生，于二〇二〇年三月至二〇二二年七月在本校 **土木工程** 专业 **函授** 学习，修完 **专科起点本** 科教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校名：**南阳师范学院**

校（院）长：

张宝锋

批准文号：**(87)教高三字022号**

证书编号：**104815202205710088**

二〇二二年七月一日

（八）拟委派的其他人员资历表

试验检测负责人资历表

| | | | | | |
|--------|--|---|-------|------------------------------------|---------|
| 姓 名 | 刘星辰 | 年 龄 | 34 | 专 业 | 土木工程 |
| 技术职称 | 工程师 | 学 历 | 本科 | 拟在本标段 工程任职 | 试验检测负责人 |
| 工作年限 | 10年 | | | 类似施工经验年限 | 6年 |
| 毕业学校 | 2014年7月毕业于河南理工大学万方科技学院建筑工程技术专业，学制3年。后 在职进修本科，2021年毕业于南阳师范学院土木工程系。 | | | | |
| 经 历 | | | | | |
| 时 间 | 参加过的类似工程项目名称 | | 担任职务 | 发包人及联系电话 | |
| 2023年 | 西峡县2023年国省干线公路桥梁改 造项目 | | 施工员 | 西峡县公路事业发展中心 联系电话：0377-838169036 | |
| 2024年 | 西峡县公路事业发展中心河南省南 阳市西峡县G208线宵山沟桥危桥改 造工程项目 | | 技术负责人 | 西峡县公路事业发展中心 联系电话：0377-838169036 | |
| 2025年 | 西峡县公路事业发展中心南阳市西 峡县G208线K1421+300-K1421+380段 等2处灾害防治工程项目 | | 技术负责人 | 西峡县公路事业发展中心 联系电话：0377-838169036 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 获奖情况 | | / | | | |
| 说明在岗情况 | | <input checked="" type="checkbox"/> 目前未在其他项目上任职，现从事工作为：日常生产工作。 <input type="checkbox"/> 目前虽在其他项目上任职，但本项目中标后能够从该项目 撤离,目前任职项目：/,担任职位：/。 | | | |
| 备 注 | | / | | | |

姓名 刘星辰
性别 男 民族 汉
出生 1991 年 7 月 9 日
住址 河南省西峡县城关镇灌河
路 1 2 3 号
公民身份号码 411330199107091516



中华人民共和国
居民身份证



签发机关 西峡县公安局
有效期限 2023.05.22-2043.05.22

 **南阳师范学院**
Nanyang Normal University
成人高等教育

毕业证书



学生 刘星辰 性别 男，一九九一年 七月 九 日生，于 二〇一九
年 三 月至二〇二一年 七 月在本校 土木工程
专业 函授 学习，修完 专科起点本 科教学计划规定的全部课程，
成绩合格，准予毕业。

校 名：南阳师范学院

批准文号：(87)教高三字022号
证书编号：104815202105702823

校（院）长：张宝锋

二〇二一年 七 月 一 日

从事专业 道路与桥梁工程

取得职称名称 工程师

取得职称级别 中级

取得方式 评审

评审组织
(认定部门) 南阳市工程系列交通运输专业中级职称评审委员会

评审(认定)
通过时间 2023.12

发证单位 南阳市人力资源和社会保障局



姓名 刘星辰 性别 男

出生年月 1991.07

工作单位 西峡县正通公路养护有限公司


证书编号 G202309B6132309500043
2024 年 02 月 29 日

（八）拟委派的其他人员资历表

质检工程师资历表

| | | | | | |
|--------|--|--|----|-----------|------------------------------------|
| 姓名 | 袁小杰 | 年龄 | 38 | 专业 | 道路与桥梁工程技术 |
| 技术职称 | 工程师 | 学历 | 大专 | 拟在本标段工程任职 | 质检工程师 |
| 工作年限 | 18年 | | | 类似施工经验年限 | 15年 |
| 毕业学校 | 2016年7月毕业于 <u>武汉理工大学</u> 学校 <u>道路与桥梁工程技术</u> 专业，学制2.5年 | | | | |
| 经 历 | | | | | |
| 时 间 | 参加过的类似工程项目名称 | | | 担任职务 | 发包人及联系电话 |
| 2021年 | 西峡县2021年干线公路路面面层、基层结构物修复及交安设施等安装项目 | | | 技术负责人 | 西峡县公路事业发展中心 联系电话：0377-838169036 |
| 2022年 | 西峡县2022年干线公路路面处治及交安设施等附属工程治理项目 | | | 项目总工 | 西峡县公路事业发展中心 联系电话：0377-838169036 |
| 2023年 | 西峡县2023年国省干线公路结构物修复及交安附属设施安装等项目 | | | 项目总工 | 西峡县公路事业发展中心 联系电话：0377-838169036 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 获奖情况 | | / | | | |
| 说明在岗情况 | | <input checked="" type="checkbox"/> 目前未在其他项目上任职，现从事工作为： <u>日常生产工作</u> 。 <input type="checkbox"/> 目前虽在其他项目上任职，但本项目中标后能够从该项目撤离,目前任职项目： <u>/</u> ,担任职位： <u>/</u> 。 | | | |
| 备 注 | | / | | | |



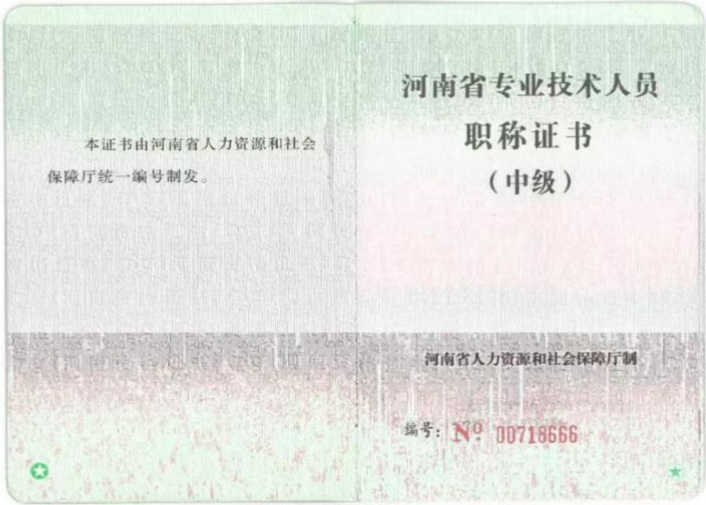

(八) 拟委派的其他人员资历表

专职安全员资历表

| | | | | | |
|--------|---------------------------------------|---|------|------------------------------------|-------|
| 姓名 | 张森 | 年龄 | 33 | 专业 | 无 |
| 技术职称 | 无 | 学历 | 高中 | 拟在本工程任职 | 专职安全员 |
| 工作年限 | 14年 | | | 类似施工经验年限 | 8年 |
| 毕业学校 | 西峡县第二高级中学，学制 3 年 | | | | |
| 经 历 | | | | | |
| 时 间 | 参加过的类似工程项目名称 | | 担任职务 | 发包人及联系电话 | |
| 2023年 | 西峡县2023年国省干线公路桥梁改造项目 | | 安全员 | 西峡县公路事业发展中心 联系电话：0377-838169036 | |
| 2024年 | 西峡县公路事业发展中心河南省南阳市西峡县G208线宵山沟桥危桥改造工程项目 | | 施工员 | 西峡县公路事业发展中心 联系电话：0377-838169036 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 获奖情况 | | / | | | |
| 说明在岗情况 | | <input checked="" type="checkbox"/> 目前未在其他项目上任职，现从事工作为：日常生产工作。 <input type="checkbox"/> 目前虽在其他项目上任职，但本项目中标后能够从该项目撤离,目前任职项目：/,担任职位：/。 | | | |
| 备注 | | / | | | |



注：为避免因网络延迟导致打印平台问题，请实时生成或打印



项目部成员在岗保证措施

致： 西峡县公路事业发展中心

我方在此承诺，我公司参与的本项目若成交，我公司特做出以下承诺：

一旦我公司有幸成交，保证按响应文件的项目经理、项目总工和其他技术管理骨干（财务负责人、结构工程师、测量工程师、试验检测负责人、质检工程师、专职安全员等）及时到岗到位，决不更换。若我公司擅自更换投标时承诺派出的项目经理和项目技术负责人的，发包人有权终止合同。我公司保证必须无条件退场，由此产生的责任全部由我公司负责，给发包人造成损失的，我公司应全额赔偿。

在施工过程中，发包人及有关主管部门发现项目经理、项目技术负责人和“八大员”等现场管理人员有重大失误或不能胜任工作，有权要求我公司予以更换。我方应无条件接受，且按合同约定承担违约责任。

我公司保证项目经理、项目技术负责人和其他主要管理人员常驻工地负责工程施工管理。发包人将随时检查我公司的上述人员是否到位，如发包人以上人员没有在现场履行职责，且未向发包人事先书面说明并获得书面同意，则发包人可按合同约定对我公司进行处罚，其罚款由监理工程师签发、发包人批准后直接从我公司的工程款中扣除。

我公司承诺项目经理必须常驻施工现场，要求其本人每周不少于5日、每日不少于8小时在本工程现场工作，项目经理必须参加每周召开的工程例会，有事必须请假。如项目经理未经发包人同意违反上述规定，每缺席一日或缺席一次例会支付违约金1000元整。如一周有两个工作日或两个月累计10天不在现场或两个月缺席例会三次，为严重违约，发包人有权解除合同，将我公司清退出场，解除合同的同时不免除承包人应当承担的上述违约责任。

项目经理岗位职责

一、认真贯彻执行《建筑法》《合同法》等各项法令和制度。贯彻“安全第一，预防为主”的方针，做到讲效益必须讲安全，抓生产首先必须抓安全。

二、全面负责本工程的一切事务，认真熟悉施工图纸、编制施工组织设计方案和施工安全技术措施，建立统一规格的“五牌一图”。

三、制定适合本工程项目的管理细则、方案及措施，组织职工按期开会学习，合理安排、

科学引导、顺利完成本工程的各项施工任务。

四、认真履行《建设工程施工合同》条款，保证施工顺利进行，维护企业的信誉和经济利益。

五、根据本工程施工现场情况合理规划布局现场平面图，安排、实施、创建文明工地。要求布局合理、经济。

六、编制本工程总进度计划表和月进度计划表及各施工班组的月进度计划表。

七、和工地相关管理人员一起商定、制定和签订本工地的单项工程承包合同、材料进购合同、劳动合同及零工的处理商定。

八、按单项和分部分项组织好成本核算，并根据核算结果改进施工计划及方案，增创更高效益。

九、及时向各班组下达施工任务书及材料限额领料单；认真记录好项目经理台账。

十、深入实际了解员工的生活、工作和学习情况，采纳合理化建议，保质、保量按期完成本工程的施工任务。

项目总工岗位职责

一、认真贯彻执行国家有关法律法规、规范标准，积极进行技术创新，实施新材料、新工艺、新技术的推广应用，提高工程的科技含量。

二、组织项目部技术人员编制单位工程的施工组织设计与施工方案，并进行审批。

三、组织并会同项目部技术人员进行工程的图纸会审工作，技术核定工作。

四、检查、督促项目部技术人员技术质量资料的整理工作，保证资料整理的真实性、及时性、完整性。

五、帮助项目部技术人员解决工程当中的技术问题，对一般技术问题作出处理方案，对疑难问题上报公司技术部，由技术部会同总工程师作出处理意见或处理方案。

六、对关键、特殊工序以及易产生质量通病的工序进行技术交底，做到事前预防、事中控制、事后监督。

七、负责审核项目部上报的分部或分项工程施工方案。

八、组织项目部的技术人员学习贯彻有关标准规范、规程和建设工程强制性条文。

九、负责项目部上报的竣工资料的初审工作，初审合格上报公司技术部，组织制竣工图。

十、负责工程的验线工作，负责工程的核查工作。

十一、检查项目部施工组织设计与技术交底的执行情况，对不符合要求的提出整改措施。

十二、实施质量和环境管理体系文件，保持有效运行。

财务负责人的岗位职责

一、负责记好行政方面的财务总账及各种明细账目，确保手续完备、数字准确、书写整洁、登记及时、账面清楚。

二、编制月、季、年终决算和其他相关报表，提供准确的财务信息。

三、协助经理编制并执行预算，确保公司财务目标的达成。

四、认真审核原始凭证，拒绝不符合规定或不合格的凭证入账，严格掌握开支范围和开支标准。

五、定期核对固定资产账目，确保账物相符。

六、每月书面向总经理汇报财务情况，提供财务分析和建议。

七、负责掌管财务印章，严格控制支票的签发。

八、定期装订会计凭证、账簿、表册等，妥善保管和存档。

结构工程师的岗位职责

一、贯彻执行国家关于建筑业的政策法规，熟悉国家颁布的各项规范与标准。对工程技术、质量、安全工作负责。

二、熟悉施工图纸，了解工程概况，绘制现场平面布置图，搞好现场布局，组织班组认真按图施工。

三、全面负责本工程施工项目的测量、施工组织和安全防护等具体工作，对施工中的有关问题及时解决，向上报告并保证施工进度。

四、参加图纸会审，审理和解决图纸中的疑难问题，坚持按图施工，分项工程施工前，应写出书面技术交底。

五、参与班组各项交底。严守施工操作规程，严抓质量，确保安全，负责岗前培训，教育督促工人不违章作业。

六、编制单位工程生产计划。填写施工日志和隐蔽工程的验收记录，配合质检员做好安排各分部分项的检测。

七、负责施工计划安排实施，编制月或旬施工计划进度表，合理安排劳动力资源，合理组织实施施工，并保证工程如期完成。

八、对原材料、设备、成品或半成品、安全防护用品等做好检测复试工作。

九、按照安全操作规程规定和质量验收标准要求，组织班组开展质量及安全的自检、互检、交接检三检制度，努力提高工人技术素质和自我防护能力。

十、认真做好隐蔽工程分项、分部及单位工程竣工验收签证工作，收集整理、保存技术原始资料，办理工程变更手续。

测量工程师的岗位职责

一、测量工程师对工程施工测量负有直接责任。

二、努力学习技术知识，熟悉各种测量技术、规章制度、标准、规定。

三、贯彻执行国家测绘行业法规、规章和各项施工管理条例。

四、严格遵守项目部规定的各项规章制度。

五、爱护测量仪器，做好测量仪器的保管与维护工作，定期进行检验与校正，确保仪器精度达标，保证测量工作顺利进行。

六、熟悉常用仪器的构造、性能并牢固掌握其操作方法。

七、承接项目部交付的各种测量控制点和标志，并做好各项保护工作。

八、熟悉施工图纸，了解施工部署，制定项目的测量方案和复核程序，制定测量工作计划。

九、认真做好现场的测量放线工作，严格执行自检制度，自检完成后及时按规定报监理工程师负责完成相邻工序的测量交接。

十、负责控制点的阶段性复核及维护，确保施工放样的准确性。

十一、负责对施工过程中被破坏的控制点进行恢复，确保施工的顺利进行。

十二、按照规范及设计要求对建筑物进行沉降观测，整理观测结果（数据和曲线图）。

十三、认真做好测量内业资料，对测量资料按工程进度进行整理，完成竣工测量资料的编制。

十四、协助质检工程师做好项目测量方面的技术复核工作。

十五、及时完成领导交办的其他任务。

试验检测负责人的岗位职责

一、试验检测负责人依据图纸施工内容与技术总工一起制定本项目实验计划对项目工程所涉及的试验周期长的检测项目，要提前进行送检，为工程的正式开工做好技术准备。

二、负责组建工地试验室，养护室，保证工地试验工作正常进行。

三、负责水泥，砂，石，钢筋，混凝土，回填土，外加剂等原材料的复试取样，并填写委托试验单位进行委外试验，做好见证取样工作。

四、熟悉掌握原材料，半成品等检验批次的划分及检测项目。

五、协助有关人员对进入工地的。主要材料做好质量验收与分类堆放工作。

六、负责收集和整理复试报告和合格证书，并及时移交给资料员做好试验专业内业工作。

七、根据试验室提供的配合比申请单，测量原材料含水率，换算混凝土和砂浆的施工配合比，经项目总工审批后监督施工现场操作实施。

八、熟练掌握试验设备的使用方法，负责按照检验，测量和试验设备的控制工作程序管理，使用，校准和维修检验设备，并按合同要求向业主提供这些设备的技术资料。

九、配合技术，质检人员对在施工过程实体质量的试验检测工作。试验检测负责人对需要检测的施工部位必须实际检测，检测频率与规范要求一致，杜绝只报资料不实际检测的行为发生。

十、对各项检测的规范要求标准必须烂熟于心，按规范要求把控工程质量。

十一、负责对需复试进场物质的检查和试验状态的标识工作。

十二、协助主管工程师监督原材料的使用情况，及时反映并制止违规使用。

质检工程师的岗位职责

一、认真学习贯彻《建筑法》《安全生产法》《劳动法》等法律法规，执行工程建设强制性标准和强制性条款，贯彻落实各项管理规章制度；

二、在项目经理的领导下，负责工程实体的质量检查工作，对工程项目的质检管理负具体责任；

三、精通专业知识，熟悉施工图纸，认真执行施工验收规范及工艺标准，熟悉掌握工程洽商、技术变更等内容；

四、督促和指导施工班组做好质量自检工作，随时检查 and 解决施工质量问题，并做出检查记录和质量分析记录；

五、负责对现场班组和作业人员执行施工组织设计、质量设计、作业指导书各专项施工方案和技术交底的情况进行监督、检查；

六、负责对工程的特殊工程进行监控、检验，做好预防纠正措施的实施及质量检验工作，重要工序和隐蔽工序，质检工程师必须全过程进行旁站检查；

七、负责组织参加分部、分项工程的质量评定工作、隐蔽工程验收及分项工程的交接检查，参加工程竣工验收工作；

八、对工程检查中的不合格品有权停止施工，及时进行标识、评审、处置；

九、在进行工作质量检查时，有权制止施工现场的违章指挥和违章作业行为；

十、及时提供月度质检分析会所需要的有关信息；

十一、协调配合项目部其他部门的工作，完成领导交办的其他工作。

专职安全员岗位职责

一、协助项目经理及技术负责人对本工程的安全管理，对施工现场出现的安全问题负主要责任，贯彻执行国家及地方有关主管部门关于安全的方针政策、规范、制度的规定，坚持“安全预防为主”的方针。

二、检查督促施工现场的安全生产劳动保护及各项安全规定的落实，确保施工现场符合安全标准，

三、参加施工方案中安全生产技术措施的条款拟定工作，检查督促条款的实施。负责安全措施标识的管理和使用，及时记录好安全台账，确保安全措施的有效执行。

四、负责本工程的常规安全检查活动，并做好检查记录，对违章现象进行制止，对一般事故做出处理和记录。定期组织或参与项目安全检查和设备设施的验收，及时发现并督促整改安全隐患。对危险性较大分部分项工程施工过程进行旁 站监督，确保关键环节的施工安全。

五、对进入施工现场的新工人进行安全教育及日常的安全教育工作，增强全员安全意识。组织施工技术人员进行安全学习，定期开展安全教育和培训活动，做好学习记录。

六、监督特种作业人员持证上岗，确保特种作业安全。事故处理与应急响应，参加对工伤事故的调查、分析处理总结及上报工作，提出改进措施，防止类似事故再次发生，制定生产安全事故应急救援预案，并组织演练，提高应急响应能力。

七、协助制定和完善公司安全管理制度，并监督实施。建立和完善现场安全制度标准，并

进行监督检查确保各项安全制度得到有效执行。

八、负责施工现场全面的安全管理和文明施工工作，确保施工现场的安全、整洁、有序。对脚手架、用电及机械设备、防护装置等进行安全检查，确保防护装置验收合格后方可使用。

九、组织安全文件的编写，安全教育及安全文件的管理，确保各项安全文件齐全、有效。收集整理项目施工安全资料，上报各项安全信息，及时整理和归档各项安全资料。

十、组织对进场工人进行安全知识教育，开展安全技术交底，确保每位作业人员都了解作业风险和安全操作规程。定期组织安全教育和培训活动，增强全体作业人员的安全意识和技能水平。

十一、做好与业主、监理单位、施工班组等沟通协调工作，确保安全信息的畅通和安全管理措施的有效执行。配合项目经理、安全总监等做好与项目相关的安全方面协调工作，共同推动项目安全管理的持续改进。

十二、参与编制并实施生产安全事故应急救援预案，定期组织应急演练，提高应急响应能力。发生安全事故时，立即保护现场、及时上报，并积极参加事故调查和处理工作。

我公司对此承诺的真实性负责，若承诺不实，造成的后果由供应商自行负责，建设并愿放弃本项目成交机会，并承担一切法律责任。

特此承诺

投标人（电子签章）： 西峡县正通公路养护有限公司

法人代表或委托代理人（电子签名）： _____

日 期： 2025 年 10 月 31 日

(九) 主要机械设备和试验检测设备配置表

| 序号 | 用途 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 备 注 |
|----|-------|--------|-------------|--------|-----|
| 1 | 砂浆搅拌 | 砂浆搅拌机 | JZC350 | 3 台 | |
| 2 | 运输 | 自卸汽车 | 斯太尔 | 2 辆 | |
| 3 | 本工程 | 注浆泵 | BW-150 | 1 台 | |
| 4 | 装载 | 装载机 | ZL40A | 2 辆 | |
| 5 | 本工程 | 铲车 | ZL50 型 | 2 辆 | |
| 6 | 本工程 | 起重机 | STC2400C8-8 | 2 辆 | |
| 7 | 养护、清洁 | 洒水车 | Z5.5 | 3 辆 | |
| 8 | 本工程 | 挖掘机 | 小松 220 | 4 台 | |
| 9 | 本工程 | 吊篮 | ZLP800 | 2 台 | |
| 10 | 本工程 | 钢管脚手架 | / | 满足工程需要 | |
| 11 | 本工程 | 电动钻机 | ZJ70D 型 | 2 台 | |
| 12 | 本工程 | 螺栓切割机 | NS-3651 | 1 台 | |
| 13 | 本工程 | 安全带 | / | 10 条 | |
| 14 | 本工程 | 气焊设备 | 氧气、乙炔 | 2 台 | |
| 15 | 本工程 | 划线设备一套 | / | 1 套 | |
| 16 | 本工程 | 水准仪 | S3 | 1 台 | |
| 17 | 本工程 | 全站仪 | TE500 | 1 台 | |
| 18 | 本工程 | 风镐 | / | 5 台 | |

七、其他资料

1. 承诺书及声明

（一）承诺书

(招标人名称) 西峡县公路事业发展中心 :

我方在此声明，我方拟派往（南阳市西峡县G208线K1418+100-K1418+300段等7处灾害防治工程）（以下简称“本工程”）的项目主要管理人员与实际施工人员一致，招标人在施工过程中发现人员不一致的，招标人有权解除合同，我方愿意承担由此而给招标人带来的一切损失。

特此承诺

投标人： 西峡县正通公路养护有限公司 （电子签章）

法定代表人或其委托代理人：_____（电子签章或签字）

2025 年 10 月 31 日

(二) 无在建承诺书

西峡县公路事业发展中心 (招标人名称):

我方在此声明,我方拟派往(南阳市西峡县 G208 线 K1418+100-K1418+300 段等 7 处灾害防治工程)(以下简称“本工程”)的项目经理(李永茂)在本项目报名之日起不再担任其他正在施工建设项目的经理。我方保证上述信息的真实和准确,如果发现并证实项目经理有在建工程。

我方愿意自动放弃中标资格。

特此承诺

投标人: 西峡县正通公路养护有限公司 (电子签章)

法定代表人或其委托代理人: _____ (电子签章或签字)

2025 年 10 月 31 日



CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

（三）信誉承诺书

(招标人名称) 西峡县公路事业发展中心 :

我方在此承诺，我方信誉良好，现阶段没有处于被责令停产、停业、行贿不良记录行为，或者投标资格被取消，近三年以来没有骗取中标或者严重违约或者重大工程质量安全生产事故等问题；我方承诺上述信息的真实和准确，一经发现我方愿意无条件自动放弃中标资格。

特此承诺

投标人： 西峡县正通公路养护有限公司 （电子签章）

法定代表人或其委托代理人：_____（电子签章或签字）

2025 年 10 月 31 日

（四）招标代理服务费缴纳承诺书

河南宇盛工程咨询有限公司：

我公司于 2025 年 10 月 31 日投标贵司代理的 南阳市西峡县G208线K1418+100-K1418+300段等7处灾害防治工程 项目，经评审、公示，我公司中标。招标代理服务费依据《河南省招标代理服务收费指导意见》豫招协〔2023〕2号“河南省招标代理服务收费计算标准”，本项目类型为工程。

根据招标文件“由中标人按河南省招标投标协会《河南省招标代理服务收费指导意见》豫招协〔2023〕2号“河南省招标代理服务收费计算标准”支付招标代理服务费”的规定，我公司郑重承诺如下：

承诺1. 承诺在领取中标通知书后30日内，将本项目招标代理服务费缴纳贵公司指定账户。

承诺2. 逾期缴纳的，按照300元/天另外缴纳滞纳金，滞纳金最高不超过本项目招标代理服务费。

承诺3. 我公司若违反上述承诺，我公司承担由此造成的一切损失。如若贵公司因此提起诉讼，诉讼费由我公司承担。

承诺人： 西峡县正通公路养护有限公司 （盖章）

法定代表人或其委托代理人： _____ （签字）

2025 年 10 月 31 日

(五) 无行贿行为承诺

西峡县公路事业发展中心 (招标人名称):

(投标人名称) 西峡县正通公路养护有限公司 郑重承诺, 本公司包括企业本身 (西峡县正通公路养护有限公司)、企业法定代表人 (李永茂)、授权委托人 (赵起兰) 及拟担任本项目的项目经理 (李永茂) 在近三年内 (自本项目招标公告发布之日往前顺推) 无任何行贿犯罪行为。

我方保证上述信息的真实和准确, 并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切责任及法律后果。

特此承诺。

投标人: 西峡县正通公路养护有限公司 (电子签章)

法定代表人或其委托代理人: _____ (电子签章或签字)

2025 年 10 月 31 日



CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

（六）不拖欠农民工工资承诺

致： 西峡县公路事业发展中心 （招标人名称）

我方于年月日参加（项目名称）（南阳市西峡县G208线K1418+100-K1418+300段等7处灾害防治工程）的投标，我方承诺：如果我单位中标，我单位将按照国家规定、合同要求支付农民工工资，绝不拖欠农民工工资，绝不发生违反规定拖欠或克扣农民工工资行为。

投标人： 西峡县正通公路养护有限公司 （电子签章）

法定代表人或其委托代理人： _____ （电子签章或签字）

2025 年 10 月 31 日

（七）工程质量保证信用承诺书

致(采购人或采购代理机构): 西峡县公路事业发展中心

单位名称(自然人姓名): 西峡县正通公路养护有限公司

统一社会信用代码(身份证号码): 91411323MA45W8TBXW

法定代表人(负责人): 李永茂

联系地址和电话: 西峡县五里桥镇北堂村 13703773426

为保证工程建设质量，树立诚实守信的政府采购供应商形象，我单位（本人）自愿做出以下承诺：

一、如中标（成交）成为本项目的供应商，我单位（本人）保证对项目承担工程质量终身责任，由我单位（本人）原因造成的工程质量缺陷，我单位（本人）负责维修，并承担鉴定、维修费用以及损失赔偿费用。

二、如拒不履行质量保修责任，自愿按照规定将违背承诺行为作为失信行为记录到社会信用信息平台，并同意依照国家、省、市、县有关规定由有关部门依法依规处理。

供应商（电子印章）: 西峡县正通公路养护有限公司

法定代表人、负责人、本人、或授权代表(签字或电子印章): _____

日 期: 2025 年 10 月 31 日

注：投标人的法定代表人或者授权代表的签字或盖章应真实、有效，如由授权代表签字或盖章的，应提供“法定代表人授权书”

法定代表人授权书

本人李永茂（姓名）系西峡县正通公路养护有限公司（投标人名称）的法定代表人，现委托赵起兰（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改南阳市西峡县G208线K1418+100-K1418+300段等7处灾害防治工程（项目名称、标段）施工投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：投标有效期内（60日历天，从投标截止之日起计算）。

代理人无转委托权。

附：法定代表人和授权代表身份证明

投标人：西峡县正通公路养护有限公司（电子签章）

法定代表人：_____（电子签名）

身份证号码：411330198701141550

委托代理人：赵起兰

身份证号码：411330198903081541

手机号码：15137703400

2025 年 10 月 31 日

法定代表人身份证



授权代表身份证



（八）中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加西峡县公路事业发展中心（单位名称）的南阳市西峡县G208线K1418+100-K1418+300段等7处灾害防治工程（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. 南阳市西峡县G208线K1418+100-K1418+300段等7处灾害防治工程（标的名称），属于建筑业；承建（承接）企业为西峡县正通公路养护有限公司（企业名称），从业人员163人，营业收入为2216.17万元，资产总额为3617.96万元，属于小型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（招标文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：西峡县正通公路养护有限公司

日期：2025年10月31日

说明：

1. 该声明函是针对中小微企业的，非中小微企业投标时不用提供该声明。

2. 中标人享受本办法规定的中小企业扶持政策的，招标人、招标代理机构应当在公示中标候选人时公开中标候选人的《中小企业声明函》。提供声明函内容不实的，属于弄虚作假骗取中标，依照《中华人民共和国招标投标法》等国家有关规定追究相应责任。

3. 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

（九）残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加___/___单位的___/___项目采购活动提供本单位制造的货物及服务（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物及服务（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物及服务）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（电子签章）：___西峡县正通公路养护有限公司___

日期：___2025___年___10___月___31___日

说明：

1. 该声明函是针对残疾人福利性单位的，非残疾人福利性单位投标时不用提供该声明。
2. 中标人享受本办法规定的中小企业扶持政策的，招标人、招标代理机构应当在公示中标候选人时公开中标候选人的声明函。提供声明函内容不实的，属于弄虚作假骗取中标，依照《中华人民共和国招标投标法》等国家有关规定追究相应责任。

2. 招标文件要求的其他材料及投标人认为有必要提供的材料

- (一) 企业技术能力
- (二) 履约信誉
- (三) 设备配置
- (四) 服务承诺
- (五) 有不拖欠农民工工资的具体承诺、相应措施
- (六) 保证连续施工的实质性的承诺
- (七) 质量保证期内、外服务优惠承诺

（一）企业技术能力

一、企业技术力量及专业能力

西峡县正通公路养护有限公司成立于 2018 年 10 月，注册资金为 4600 万元，地址在西峡县五里桥镇北堂村，公司在册职工为 163 人，是一家集公路养护、工程施工、公路设施的维修、安装及保养、公路绿化（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）于一体的综合型公路养护公司。通过六年多的经营，目前已建立了较为完善的公司经营管理体系，运行正常。

公司拥有程力威牌洒水车，大运牌洒水车，江铃牌五十铃，程力威牌洒布车，打桩机，LD50 沥青混合料搅拌设备、压浆设备，EC80D 沃尔沃挖机、BW131AC-5 压路机、GYS22 压路机、S1103-3 摊铺机、W130H 铣刨机等大型设备共计 20 多台。

自 2018 年以来在公司党政班子的带领下承揽了路面大中小修、安全防治、危桥改造、灾害防治、国道安全精细化提升工程等项目，获得业内人士的一致好评，被主管部门多次评为先进单位、精神文明建设先进单位等各种奖励。

西峡县正通公路养护有限公司秉承“产业富企、科技兴企、人才强企”的发展思路，以公路养护为主线，以养护材料、养护技术研究为支撑，注重高层次养护科技人员的培养，运用现代企业制度，健全法人治理机构，把养护公司打造成产权清晰、权责明确、规范运作、技术雄厚、富于创新的现代化养护企业。

我公司将本着立足业主，多元发展的经营理念，树立对业主负责的高度责任感，精细施工、竭诚与各界朋友真诚合作，携手共进，共创辉煌。

二、对本项目的合理化建议和本次响应生产组织安排

（一）保证工期的合理化建议

1. 工程进度计划保证制度管理的原则

为保证工程总体进度计划的顺利完成，首先需在项目部管理体系中重点做好施工进度保障管理体系的建设，并由进度计划管理人员制定出进度计划管理制度和奖罚办法。

2. 工程进度计划保证制度

进度控制的主要方法有：行政方法、经济方法和管理技术方法。使用行政方法进行进度控制，直接、迅速、有效，但要提倡科学性，防止主观、武断、片面地瞎指挥。进度控制的经济

方法，是指有关部门和单位用经济类手段对进度进行影响和制约。进度控制的管理技术方法，就是通过规划、控制和协调，来保证工期目标的实现。

进度控制的措施包括组织措施、技术措施、合同措施、经济措施和信息管理措施等。在计划实施过程中，对施工队伍实际进度进行跟踪监督。当发现实际进度滞后于计划进度时，应签发《调度通知》，指令施工队伍采取调整措施。当实际进度严重滞后于计划进度时应及时报告项目经理，由项目经理与施工队伍协商采取相应措施。定期（最少一个月一次）召开工程例会，研究分析影响进度的主要原因，采取相应措施，并督促有关责任方实施。

3. 建立进度计划系统：

在总体进度计划的基础框架上，依照业主的具体要求及现场实际情况，分别编制相应的细部进度计划；将各个细部计划按需要的管理时间进行汇总，形成季度、月、周的进度计划。

4. 建立工地例会制度：

定期召开全体参施队伍和对口管理人员参加的工地例会，项目经理部每天召开一次例会，通过例会统计总结当天工程完成情况，对进度滞后项目分析原因、提出补救措施，同时布置第二天的工作任务。通过紧紧抓住每天的实际进度来确保每周、每月进度计划的完成。

5. 建立工作任务负责制度：

对每个分项工程，都将相应责任落实到具体负责人身上，同时引入奖惩制度，在每项任务布置时明确奖惩条件，在任务完成后根据完成情况落实奖惩措施，形成激励机制。

6. 进度计划管理信息透明化：

总体及分项计划上墙公示，明确各项工作任务的工作计划实施状况及任务负责人。

7. 材料及物资计划精细化：

对应于总体进度计划和分项工程进度计划，在编制总体一次性备料计划的基础上，进行分项材料计划的编制，切实保证材料设备落实到位。

8. 加强内部管理协调：

明确生产、安全、技术、测量、质检、试验、材料等与现场直接相关的各职能部门的工作关系和工作流程，使每个管理人员对自己的工作做到目标明确，对上明确负责对象、对下明确管理对象、左右明确各协调部门和工作程序，减少因管理原因造成的误工情况。

（二）降低造价的合理化建议

1. 成本控制目标

在确保本工程工期、质量的前提下，通过科学的管理，采用新技术、新工艺等手段并充分利用我单位已有的临时设施、部分周转材料、确保既定的预算成本目标的实现，力争降低工程成本。

2. 项目成本管理体系

建立、健全以项目经理为首的成本管理体系，以项目主管会计作为项目成本的控制中心，负责整个成本管理体系的运转工作。各职能部门积极配合主管会计开展成本管理工作，同时充分发挥主观能动作用，依据相关专业优势，为降低成本献计献策。完善各项成本制度，确保成本管理有章可循。建立健全成本责任到人制度、计量验收制度、考勤考核制度等等，并采取得力措施，保证各项制度运行良好。

3. 成本管理制度

工程的施工成本目标使工程实际成本始终控制在合同价范围之内，并保证各项上缴费用。在此基础上，通过及时、严密有效的成本管理工作力争多获利润，取得较好的经济效益。

（1）成本管理核算形式

工程项目经理部负责对工程的工期、质量、安全、成本等进行全面管理协调。在预算成本的基础上实行全额经济承包。项目经理部负责项目的成本归集、核算，竣工决算和各项成本分析。

（2）预算成本

项目预算成本是按照现行河南省相关定额及工程类别取费，并结合具体情况编制，是考核工程成本的依据，但最终将合同价按费用分解后直接作为项目的预算成本。

（3）计划成本

计划成本是在预算成本的基础上，根据施工组织设计和历年来在单位工程上各项费用的开支水平、进一步挖掘的可能性及上级下达的成本降低指标，按照成本组织的内容经分解后组成。

（4）成本控制

成本根据判定的成本目标，执行成本管理程序，对成本形式的每项经营活动进行监督和调整，使成本始终控制在预算成本活动范围内。通过成本管理程序能够及时发现成本偏差，随即分析原因，采取措施及时纠正，达到预期的降低成本目的。在计划成本初步确定后，为了保证

成本计划的实现，业务部门按各自职能范围具体落实。外管部门按照劳动力计划及其动态曲线，计算人工费，向项目经理提供人员使用情况报表。

对材料费控制：材料费的控制主要从材料采购单价入手，在市场价格低落时购入或签订材料采购合同，将因材料市场价格波动引起费用增加，调整施工工艺。

施工控制中的成本控制：通过及时的成本分析，检查各个时期各项费用的使用情况和成本计划的执行情况，分析节约和超支的原因，从而挖掘成本的潜力。

4. 降低成本的措施

（1）管理节约措施

①根据材料计划用量，用料时间，选择合格的材料供应方，确保材料质高价低，按用料时间进场，采用公司集中采购，降低材料采购成本。

②建立材料用量台账，施工管理中严格执行限额取料，把材料节约落实到一袋水泥一根铁丝上。

③周转材料进出场认真清点，及时回收，妥善保管，按时进场和出场，节约租赁费。

④材料进场必须有分批计划和累计数量，控制材料单价成本，施工中严格限额领料建立节约用材奖励措施。

⑤合理划分施工段，组织流水段施工。控制劳动力和周转材料投入总规模，提高劳动生产率，降低施工成本。

⑥加强机械维修保养，提高作业率，既保证进度，又节约费用。

（2）技术节约措施

①做好施工前的准备工作，审好图纸，制定合理的施工方案，避免返工。

②在型钢、钢筋下料中，提前编制材料计划，合理配料。

③模板施工中，通过根据结构构件的不同部位的施工特点进行选型，加强模板的标准化施工，以加快速度。特别采用定型钢制模板、木胶合模板配备快拆支撑体系、定型柱模施工技术，加快施工速度，节约工时。特别是成型质量好，砼成型后达到清水面效果。

④采用在混凝土中掺加粉煤灰，利用粉煤灰后期强度的施工技术，一方面可以提高砼的和易性能，另一方面可节约水泥，从而降低成本。混凝土中采用外加剂，提高混凝土性能，同时降低成本。墩柱混凝土采用保湿养护的方法，可节约用水，同时保证质量。水质脱模剂的应用，

确保砼成型质量，减少模板损耗。

⑤施工中，增强全员的成品保护意识，采取措施，加强成品保护，避免下道工序对上道工序成品的破坏，对于人为破坏行为，给予重惩。

⑥加大计算机在工程施工中的技术应用，通过实现计算机经理部范围内的局域联网使技术、生产、经营、财务、材料部门达到资源共享，提高经理部整体的办公效率，保证资源的统一性，使项目管理走向科学、系统、规范化。

（3）材料节约措施

①材料采购货比三家。在施工中加强材料管理，进场各种材料要验收点数、称重或量方。

②加强木材从进场到保管的管理工作，加强木材的周转、节约木材。

③现场开展“修废利旧”活动，利用工程的一些下脚料制造一部分施工工具，如手锤、钢钎、安全防护栏、木抹子等。

⑤进场的周转材料必须严格按照规定码放，使用合理，严禁长料短用、优料劣用，不随意裁断架子管、钢支架等，不得在钢模板面上开孔和焊接，拆卸模板及脚手架时，不准从高处摔扔，并及时维修与保养。

（4）其他节约措施

对施工垃圾进行分拣，修旧利废，回收有用垃圾再利用。本着质量为本，成本经济，在保证质量达到要求的同时，通过科学管理、优化方案、推广新工艺、新材料等措施降低成本。

（三）本次响应生产组织安排

我公司根据本项目的特点编写了详细的组织规划，见施工组织设计第一章第五节及第十章其他应说明的事项（劳动力安排计划、拟投入的主要施工机械与主要物资计划）等内容。

投标人：西峡县正通公路养护有限公司（电子签章）

法定代表人或其委托代理人：_____（电子签名）

日 期： 2025 年 10 月 31 日

（二）履约信誉

本工程履约信誉承诺书是为了明确双方在工程合作中的责任和义务，保证工程按照合同要求进行，并保证工程质量和进度的落实。

一、承诺内容

作为相关人员，我们郑重承诺如下：

1、我们将严格按照合同约定的工程期限和工程质量标准进行施工。无论是人力、物力还是技术要求，我们将严格符合合同要求，并积极主动地与您沟通和协调工程进展。

2、我们将为工程提供高质量的材料和设备，并配备具备专业知识和经验的施工队伍。我们将从施工开始到项目竣工期间，严格遵守相关法律法规和安全生产规定，确保工程施工过程中没有发生事故并保证工程质量。

3、如果在工程施工过程中出现不可抗力因素导致工程无法按时竣工或产生质量问题，我们将及时与您沟通并提供相应的解决方案。我们将承担相应的责任和损失，并积极主动地采取措施来避免或减少不可抗力因素对工程的影响。

二、承诺保证

1、我公司是未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人；提供了规范的信用报告、《无违法违规记录证明版专项信用报告》以及《无行贿犯罪记录承诺函》（承诺对象包括：投标企业、法定代表人、授权委托人，并对以上所有内容的真实性负责。

2、如果我们未能按照合同约定的工程期限和工程质量标准进行施工，我们将承担相应的经济责任并配合您的要求进行整改直到工程达到合同约定的标准和质量。

3、如果出现不可抗力因素导致工程无法按时竣工或产生质量问题，我们将及时与您沟通，并提供相应的解决方案。同时我们也将承担相应的责任和赔偿责任。

4、我们将始终保持诚信守约的态度，积极与您沟通，并配合您的要求进行工程履约。作为相关人员，我们将遵守合同约定保证工程按照约定的质量标准 and 工程期限进行施工。

我们深知工程履约信誉对双方的合作关系至关重要，我们郑重承诺遵守以上内容，并愿意

承担相应的责任和义务。我们相信，在双方共同努力下，本工程一定能够顺利进行，达到预期的目标。

投标人：西峡县正通公路养护有限公司（电子签章）

法定代表人或其委托代理人：_____（电子签名）

日 期：____2025____年__10__月__31__日

（三）设备配置

一、主要机械设备配备原则

1. 适用性原则：

1) 机械装备必须与施工体制、施工能力相适应，形成专业的或综合的生产能力，保证施工生产完成任务的需要。既要防止设备不足，又要防止装备积压。

2) 机械装备必须与施工项目的设计结构和施工方法相适应。有时装备要服从设计施工方法，有时施工方法要服从设备。

3) 根据公路建设的具体情况，选择适合的机械设备。不同的施工阶段和工序需要不同类型的设备，配置时应充分考虑施工的实际需求。

2. 经济性原则：

设备的采购和使用应考虑经济性，选择性价比高的设备，避免不必要的浪费。通过合理的设备配置，降低施工成本，提高经济效益。

3. 效率性原则：

设备的配置应以提高施工效率为目标，选择高效、可靠的设备，确保施工进度的顺利推进。合理的设备配置能够有效缩短工期，提高工程的整体效率。

4. 环保性原则：

在设备配置时，应考虑设备的环保性能和能耗，选择低能耗、低排放的设备，推动绿色施工，确保公路建设的可持续发展。

5. 成龙配套原则：要加强机械品种、数量的成龙配套每一工种的施工工序都要配备一定数量而且合乎使用性能要求的机械，在机种和数量上按相应的比例成龙配套，才能经济合理地实现机械化施工。

6. 专用性与通用性相结合：

既要考虑到机械设备的专用性，以满足特定施工任务的需求，又要考虑到通用性，以便在必要时能够灵活调配和使用。

二、试验检测设备配备原则

1. 满足试验检测项目要求

试验室应根据承担工程的规模、特点配置仪器设备，必须满足试验检测项目的要求。

3、性能、状态、量程及精度达标。

配置的仪器设备的工作性能、状态量程及精度(分辨率)应满足相关规范、规程标准的要求。

3、设施环境满足标准要求：

操作间分区明确、布局合理，环境温湿度等满足标准要求，特定实验室(如混凝土室、胶凝材料室、化学分析室、力学室)应配备相应的设施(如空调)，标准养护室应配备自动养护系统。相互有影响的设备应采取有效的隔离措施。

二、保证措施

1、根据施工设计图纸、施工规范的要求，认真制定各种材料、机械设备总计划和采购清单。材料进场后及时做好复测。严格其他各种材料、机械设备采购的质量过程控制。对供方生产（制造）的各种材料、机械设备做好检验和验证，确保其各项质量指标符合和满足工程质量要求，对各种机械、设备按照采购合同文件的要求，严格进行验证，确保其技术状态良好，运转正常，能够达到应有的施工能力和要求。对机械设备实行定机定人定岗管理，落实安全使用、维护、保管等责任制度。严格执行维修、保养、小修、大修计划，保证各种机械设备工作正常，确保施工和工程质量不受影响。

2、质量管理保证

组织制定工艺标准，积极落实创优规划。正确引导和开展工序样板先行、典型路工示范，整体推进的工程创优活动，严格按照创优规划和措施要求，加强现场技术指导和工序质量预控。各专业施工队严格按照施工规范、技术操作规程、审定的技术方案、工艺要求组织施工，按照《质量验收标准》进行验收，上道工序不合格，不交付下道工序施工。保证每个检验批、分项、分部、单位工程一次验收合格。做好隐蔽工程的检查验收。项目经理部和各专业施工队严格质量检查和抽查，各班组严格“自检、互检、专检”三检制，及时邀请现场监理工程师检查签证，不符合要求的不隐蔽。对关键工序、特殊过程和质量控制重点部位、混凝土作业等坚持技术试验人员跟班作业，实行 24 小时旁站监控，做好施工记录，保证实施过程具有可追溯性。严格岗位质量责任制和质量目标考核制度。各级落实质量包保责任和质量终身负责制，每项工程明确质量具体负责人，施工过程跟踪考核，实行工程质量直接与个人经济收入挂钩的分配制度，真正使质量责任落到实处。

3、测量、试验检测保证

(1) 严格检测操作管理制度

认真执行《项目测试管理办法细则》中明确的仪器设备管理制度、样品管理制度检测工作负责保证制度、测试数据检验制度、检测报告审批制度、检测资料保密制度和试验资料管理制度、测量工作规程，以及试验和施工过程控制等制度。严格按照有关规定做好检测设备的使用、搬运、储存、维护等管理。所有检测、试验仪器按规定进行校准或检定，经国家有关部门标定认可，保证在有效期限内使用。

(2) 加强原材料的进场检测

所有原材料进场前都应当严格检验控制，从源头上杜绝质量隐患。各种材料要有出厂合格证，并严格按照规范要求的批量或数量进行抽检。

(3) 确保施工检测数据准确性对商品混凝土进行跟踪质量检测，及时出具资料，反馈有关信息，加强合作。混凝土浇筑现场按规定进行坍落度试验并记入施工记录，保证混凝土强度试验的频数、试件组数达到规定要求。

投标人：西峡县正通公路养护有限公司（电子签章）

法定代表人或其委托代理人：_____（电子签名）

日 期： 2025 年 10 月 31 日

（四）服务承诺

工期承诺及保证措施

一、计划工期承诺：本项目计划工期 2 个月，缺陷责任期 6 个月。

二、工期保证措施如下：

（一）组织措施（人的保障措施）

我公司充分认识到本工程项目的 важность与工期的紧迫性，为此必须组建具有丰富现场管理经验的、强有力的项目经理部。在项目经理的统一领导下，精心组织、精心安排提倡前道工序为后道工序服务、与其他分包互相协调的思想，在保证工程质量的前提下，用下列措施来保证响应工期的实现。

1、劳动力的投入是保证工期的关键，因此当本工程的工作面一旦形成，立即按序调集劳动力，并按总进度的控制，做好后备劳动力的调集工作。在施工高峰时，视具体情况统一调度机械设备与劳动力。

2、用施工进度的三级动态管理来保证工期进度的措施。由公司制定一级进度计划（施工总进度控制计划表）、项目经理部编制二级进度计划（月工作计划）、各专业施工队组编制三级进度计划（各分部项工程每周进度计划）。三个计划要求总体衔接、稳定平衡，通过信息反馈，对计划实施的全过程做有效的动态控制。月计划和周计划的编制，必须具体、详细，具有实际性和可操作性。

3、项目经理部每月召开一次施工现场会议（邀请业主、监理单位等参加），每周召开一次现场工作协调会议。对反馈的信息必须立即做出正确的处理，并对月、周计划加以调整。

4、根据工程特点及工作面的部署，强化材料设备部门人员结构，材料提前配齐配足，便于加快施工进度。

5、为有效地缩短工期，原则上应经常加班作业，根据工程进度安排，全体施工人员与管理人员取消节假日、休息日。

6. 各类机械设备必须专人操作、精心维修，确保正常使用，以满足施工进度的实际需要，这是保证工期的必备条件。

7. 充分利用经济规律及其杠杆作用，有效地调动工人生产积极性，所有施工人员经济利益按实际进度完成情况进行分段兑现奖罚。

8、组织公司内部的技术力量，开展以质量为中心的劳动竞赛，即提高工程质量同时加快施工进度。

（二）管理措施（机制的保障措施）

1、项目部管理人员认真学习项目部与业主签订的合同文本，全面理解和掌握合同文本规定的要求。在工程实施中，以合同文本为依据，自始至终贯彻执行到施工管理全过程，确保工程优质如期完成。

2、以合同规定的承包施工范围的工程质量、工期、安全、文明施工等要求为原则，项目部编制详细、完善的施工组织设计，经业主、监理单位审核后，实施。

3、以合同规定的总工期要求，项目部根据现场实际情况编制本工程施工总进度网络计划，以此有效地对工程进度进行总控制。

4、以总工期为依据，项目部根据现场实际情况编制分阶段实施计划（施工准备计划；劳动力进场计划；施工材料、设备、机具进场计划；分项分部施工进度计划等）。

5、将合同的条款要求，分解纳入相应的分包合同中，对质量、工期、安全、文明施工等完全处于承包控制范围之内，确保工程如期完成。

6、施工过程中各类工作联系，除必要口头通知外，项目部一律以书面指示，及时发给各工作班组执行。

7、项目部诚恳接受业主、监理单位和当地主管部门对管理工作的指导和要求，相互紧密合作，确保工程顺利进行。

（三）材料设备供应措施（材料的保证措施）

1、及时准确地向业主提出材料计划且具有超前意识；计划及时准确，关系到工程进度的顺利进行；也能充分发挥资金效益。因此，我公司将高度重视此项工作，在资料的打印、传递方面严肃认真。

2、在时间及数量上慎之又慎，绝不因为我方工作造成供料混乱。此项工作的落实，对各级管理人员制定岗位责任制，选派具有业务素质高、责任心强的专业材料员来担任此项工作。

3、协助业主做好材料供应及保管工作，是我公司为业主服务的具体表现。设置专门的仓储库房，配备专人看管，对已装和未装的设备、材料进行定期的防护、检查、清洗、加油、回收，建立专职保管员及完整的领用手续，保证供应的设备及材料不丢失，不浪费。

4、材料的组织供应是项目部物资管理的中心任务，供应质量的优劣与供应速度的及时准确与否是关系到项目部各项工作能否顺利进行的决定因素，所以在做好日常工作管理方面重点抓好如下几点：

1) 加强材料计划的及时性、准确性、严肃性：

项目部将执行规范化的计划编制、审核、采购制度，做到供应工作的不同阶段有不同的人员负责，坚决杜绝计划盲目性，铺张浪费的不严肃工作作风。

2) 加强采购成本的控制：

在保证质量、数量供货及时的基础上，降低采购成本是提高项目施工效益的重要环节。为此，项目部将坚持材料采购以“三比一算”为基础的采购制度。任何物质必须有采购通知单及严格的验收入库制度，采购员不得接受任何人随意的采购指令。

3) 坚持审批的环节：

项目部在做好自身环节的审批工作的基础上，同时也做好对业主的报批工作，对实行调整的大宗材料应事先报送业主方进行价格、厂家的审批，在审批的基础上进行采购未经审批的材料决不自行采购，决不先斩后奏。

(四) 资金措施

1、合理收取工程款

严格遵照合同条款中有关付款的条文，根据要求提供必要的付款依据，请业主、监理工程师审核。统计工作的基础是实事求是，决不高估冒算，对设计变更增加的工作量实事求是地经过监理单位、在审核的基础上结算价款。

2、合理使用工程款

1) 保证项目的资金使用是保证工程顺利进行的先决条件。为此公司在资金使用上坚决做到专款专用，不属于公司使用的资金决不占用。

2) 在抓计划的基础上做好调度工作，绝不因计划不周导致物资缺乏。

3、管理调度工程款

若业主方按合同规定资金一时不能到位，则不能因此而拖延工期或影响工程质量，我方将千方百计调度项目外资金确保工程顺利进行；这也是我公司“为业主服务”的一种实实在在的体现。

（五）检查措施

1、施工进度的检查是计划执行信息的主要来源，也是计划调整和分析总结的依据。施工进度跟踪检查，及时反馈进度计划的实施情况是进度闭环控制之中不可缺少的部分反馈系统。故在施工组织中应尤为重视。

2、每天检查工作制：专业施工人员是施工技术、进度、质量的主要负责人，建立以专业施工队为主的计划执行系统与施工员为主的计划检查体系这一对立统一的工作关系，是保证项目进度计划的重要方法。施工员每日进行现场检查，并将检查的结果每日以书面的形式汇报项目经理，以便及时了解施工动态，监督和督促各施工班组按计划完成工作及时进行必要的调整。

3、周汇报工作制：配合三周滚动计划的实施，建立每周进度汇报分析制。汇报分析会由项目经理主持，项目经理参加检查、落实一周工作情况，并将检查分析的结果书面汇报监理单位、业主及存档。并提出建议及要求，在每周由业主或监理主持的协调会上解决。

4、月、季分析调整制度：项目部按月、季度进行分析、总结，并对进度的个别节点调整。进行必要的生产要素调动。由项目经理主持，公司项目部门及有关人员参加，并将检查分析的结果书面汇报业主、监理单位并存档。

（六）循环措施

1、如前所述，在建立各级检查制度的基础上有效地控制施工进度，这是目的所在。所以在了解了施工状态和实际进度后，如何进行进度控制是保证进度计划的关键，是项目管理的中心任务。

2、加强进度实施：第一类循环是在进度分析总结的基础上对进度实施的反馈，这就要求根据施工的进度，通过项目部生产协调会改善施工组织，改善施工组织的方法如下：

1) 如果出现偏差，首先重点检查管理人员及施工人员，改善管理人员工作作风，使之更好地围绕进度工作。若存在施工人员不足，则视其缺口大小，迅速通过现场指挥调入劳动力或实行加班加点，延长工作时间，整顿劳动纪律，提高工作效率。

2) 及时改进施工技术，绝不因技术措施不适用或不合理造成施工的浪费和返工。

3、调整进度计划：由于外部因素影响造成进度无法实施或是计划与现场状况不符就应及时调整进度计划，同时也要及时积极地进行施工协调，此项计划一般在周会上做出。

4、质量跟踪检查：项目部质量检查员每日对施工班组所施工的内容进行检查，发现质量

问题及时签发整改单，并每日将检查结果汇报项目工程师，把质量问题消除在过程中，决不因质量问题造成返工，从而影响工程进度计划。

5、利用现代科学手段，采用计算机项目管理系统对工程进行动态管理。

工程质量承诺及具体措施

一、质量承诺要求：合格。

二、具体措施如下：

1、组织保证

（1）配备强有力的项目班子

项目管理层由管理人员和技术人员构成，全面负责本工程施工任务，有效组织人力设备、物资等资源，保证质量管理体系的有效运行，实现质量目标。

（2）抽调和整合施工专业队伍

根据任务规模和工程特点，按工程类别和模块化、专业化质量的原则划分施工任务抽调和整合专业施工队，在项目经理部直接领导和指挥下，参加本工程的施工。

2、材料、机械设备保证

根据施工设计图纸、施工规范的要求，认真制定各种材料、机械设备总计划和采购清单。

材料进场后及时做好复测。严格其他各种材料、机械设备采购的质量过程控制。对供方生产（制造）的各种材料、机械设备做好检验和验证，确保其各项质量指标符合和满足工程质量要求，对各种机械、设备按照采购合同文件的要求，严格进行验证，确保其技术状态良好，运转正常，能够达到应有的施工能力和要求。对机械设备实行定机定人定岗管理，落实安全使用、维护、保管等责任制度。严格执行维修、保养、小修、大修计划，保证各种机械设备工作正常，确保施工和工程质量不受影响。

3、质量管理保证

组织制定工艺标准，积极落实创优规划。正确引导和开展工序样板先行、典型路工示范，整体推进的工程创优活动，严格按照创优规划和措施要求，加强现场技术指导和工序质量预控。各专业施工队严格按照施工规范、技术操作规程、审定的技术方案、工艺要求组织施工，按照《质量验收标准》进行验收，上道工序不合格，不交付下道工序施工。保证每个检验批、分项、分部、单位工程一次验收合格。做好隐蔽工程的检查验收。

项目经理部和各专业施工队严格质量检查和抽查，各班组严格“自检、互检、专检”三检制，及时邀请现场监理工程师检查签证，不符合要求的不隐蔽。对关键工序、特殊过程和质量控制重点部位、混凝土作业等坚持技术试验人员跟班作业，实行 24 小时旁站监控，做好施工记录，保证实施过程具有可追溯性。

严格岗位质量责任制和质量目标考核制度。各级落实质量包保责任和质量终身负责制，每项工程明确质量具体负责人，施工过程跟踪考核，实行工程质量直接与个人经济收入挂钩的分配制度，真正使质量责任落到实处。

4、测量、试验检测保证

（1）严格检测操作管理制度

认真执行《项目测试管理办法细则》中明确的仪器设备管理制度、样品管理制度检测工作负责保证制度、测试数据检验制度、检测报告审批制度、检测资料保密制度和试验资料管理制度、测量工作规程，以及试验和施工过程控制等制度。严格按照有关规定做好检测设备的使用、搬运、储存、维护等管理。所有检测、试验仪器按规定进行校准或检定，经国家有关部门标定认可，保证在有效期限内使用。

（2）加强原材料的进场检测

所有原材料进场前都应当严格检验控制，从源头上杜绝质量隐患。各种材料要有出厂合格证，并严格按照规范要求的批量或数量进行抽检。

（3）确保施工检测数据准确性对商品混凝土进行跟踪质量检测，及时出具资料，反馈有关信息，加强合作。混凝土浇筑现场按规定进行坍落度试验并记入施工记录，保证混凝土强度试验的频数、试件组数达到规定要求。

5、施工技术保证

（1）坚持图纸会审制

由项目总工程师组织对图纸进行分级会审，审核完成后，审核人员对审核结果有无问题均要进行有效标识，填写审核意见，汇总。必要时，及时与建设单位、设计单位及监理单位进行沟通，不断完善设计。

（2）坚持技术交底制度

根据建设单位审批通过的施工方案编制各工序技术交底，同时对管理人员、施工人员进行

设计意图交底、施工方案交底、施工工艺交底、质量标准交底、创优措施交底。组织项目部人员、施工作业班组成员认真学习审批通过的施工方案，按照方案安排组织施工。

(3) 坚持资料管理制度

按照建设单位、监理工程师的要求，结合 ISO9000 标准质量管理体系的规定，对资料管理实行专人负责，分类归档，集中管理。施工中详细如实地记录施工全过程，最大程度地反映施工的可追溯性，使资料能够正确反映施工全过程并与施工进度同步积累。

管理、服务做出相应实质性的承诺

我公司在此郑重承诺：

一、我公司的施工工艺、拟投入本项目的机械设备等满足国家关于环保的有关规定在建设过程中，我公司必定严格按照河南省公路水运施工扬尘污染防治标准和省、市关于大气污染防治和扬尘治理的相关要求，建立扬尘防治责任制和预防扬尘预案，切实加强施工工地的环境污染防治和扬尘治理工作，落实“三员管理”“六全施工”和“开复工制度”，确保施工环保达标。

二、计划工期：本项目计划工期 2 个月，缺陷责任期 6 个月。

三、投标有效期：自投标人提交投标文件截止之日起计算 60 日历天。

四、质量要求：合格。

五、投标范围：施工图纸及招标工程量清单范围内的所有内容。

六、管理：我方将严格按照在投标文件中填报的其他主要管理人员和技术人员及主要机械设备和试验检测设备组织进场施工，且不进行更换。

七、技术标准和要求：符合招标文件及国家有关规定的要求；

八、如我公司中标，本项目拟任的项目经理及项目总工将不会更换。

九、服务承诺

(1) 我公司承诺中标后，我公司将拨付一定的款项，做到资金专款专用，保证工程施工的连续性。

(2) 为保证劳动力充足，满足施工进度计划，公司拟投入自有优秀施工队伍。工程施工前，组织专业技术工种人员进行培训教育，熟悉了解本工程的施工特点，掌握各项目的施工工艺和技术标准，为工程施工顺利进行创造条件。组织施工人员在开工前 3—5 天进场。

(3) 我公司将按规定的数额及时足额缴纳农民工工资，保障金为中标价的 2%。在建工程中，一旦出现拖欠农民工工资及其他职工工资的，贵方可从农民工工资保障金中先予以划支，我公司愿意接受贵方的任何处罚。

(4) 我公司承诺在工程款暂不到位的情况下垫资施工，将不影响施工进度。

(5) 我方承诺一定遵照业主和监理的要求，做好施工现场协调工作，确保工程质量，确保工期。

十、安全生产文明施工承诺：

1、认真贯彻执行《建筑法》《安全生产法》《建设工程安全生产管理条例》等安全生产法律法规，坚持“安全第一，预防为主”的方针，建立健全企业和项目部安全生产管理体系，并使之正常有效运转；

2、按规定设立项目管理班子，并足量配备专职安全生产管理人员，各班组设立兼职安全员，建立安全生产监督管理网络；

3、对建设单位支付的安全文明措施费用将足额用于施工安全防护用具及设施的采购和更新、安全施工措施的落实、安全生产条件的改善，决不挪作他用；

4、加强对进场作业人员的安全教育培训。特种作业人员均做到持有效证上岗；所有作业人员均经“三级”安全教育培训并考核合格后上岗；

5、贯彻落实工程建设安全生产强制性标准条文，严格并全面落实经审批的施工组织设计和专项施工方案及其安全技术措施，并按规定做好安全技术交底工作；

6、加强对施工现场文明施工的管理，教育职工自觉抵制“四乱”行为，现场围墙、大门、冲洗台、道路硬化、材料堆放、建设立面、临建设及餐饮等均符合文明卫生要求；

7、接受建设行政主管部门及建设、监理、勘察设计和相关方的监督，认真对待所提出的指令或意见、建议，及时消除各类隐患；

8、公司和项目部均按规定分级实施监督检查，及时消除各类事故隐患将按照有关规定及时上报；发生生产安全事故，将按照事故管理规定及时上报建设行政主管部门、地方安全生产监管部门等有关部门，并积极配合做好事故调查处理工作，决不瞒报或拖延报告；

9、组织管理现场的安全生产工作时，必须服从业主和监理单位的领导和指挥，接受建设单位的监督检查。与业主、监理单位的配合，及时反映施工中存在并需建设单位解决的问题，

及时上报施工进度，每周会同业主、监理单位汇报和研究施工情况，做到业主、监理公司满意。

十一、质量保证期内、外的服务承诺

1、保修期内的服务承诺：

（1）保修服务范围：严格按照建设部《建设工程质量管理条例》及《工程施工总承包合同》《工程质量保修书》中的规定执行。对于工程承包范围内的施工项目，自工程竣工验收合格之日起进入工程质量保修阶段。在保修阶段，凡因工程不符合规程、规范和工程合同规定所造成工程实体损坏，我公司将无条件进行保修，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

（2）保修期限按国家、省、市的有关规定及工程质量保修书执行。

（3）工程保修及服务承诺：我单位对所提供施工自投入使用之日起，严格按照工程总承包合同有关保修的条款执行；严格贯彻公司的质量方针，本着客户至上的原则，服务热情，周到，随叫随到；建立回访制，进行定期、不定期回访，每年内工程回访不少于两次，认真听取建设单位意见，并形成回访记录；建立维修工程专班专人负责制，由公司工程部、技术部派人负责。

2、保修期外的服务承诺：

在工程保修期满后，我公司将一如既往进行定期回访，如果工程出现质量问题或由于操作不当等其他原因造成的问题，我公司本着负责到底和优质服务的宗旨，在酌情收到一定成本费用情况下，全力组织技术力量进行保修，让业主完全可以放心使用。同时保修期外的维修费用将给予最廉价之优惠。

十二、我公司承诺在施工期间，加强安全防护措施，安全文明施工，保证不发生各种安全事故，并承担由此发生的一切费用。

十三、我公司承诺：

招标人有权核查我公司在投标文件中提供的材料，若在评标期间发现我公司提供了虚假资料，招标人有权对我公司的投标文件作废标处理，并没收其投标担保；若我公司有幸中标，在评标结果公示期间发现我公司提供了虚假资料，招标人有权取消其中标资格并没收其投标担保；若在合同实施期间发现我公司提供了虚假资料，招标人有权从合同价款或履约保证金中扣除不超过 5%签约合同价的金额作为违约金。同时招标人将我公司以上弄虚作假行为上报省级交通

运输主管部门，作为不良记录纳入公路建设市场信用信息管理系统。

十四、信誉承诺：

(1) 我公司未被省级及以上交通运输主管部门取消招标项目所在地的投标资格且处于有效期内；

(2) 我公司未被责令停业，暂扣或吊销执照，或吊销资质证书；

(3) 我公司未被进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

(4) 我公司在“信用中国”网站未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单；在“中国政府采购网”未被列入严重违法失信行为记录名单；

(5) 我公司在“国家企业信用信息公示系统”网站中未被列入严重违法失信企业名单；

(6) 我公司及其法定代表人、拟委派的项目经理在近三年内没有行贿犯罪行为。

十五、我公司满足法律法规及投标人须知前附表规定的其他情形。

投标人：西峡县正通公路养护有限公司（电子签章）

法定代表人或其委托代理人：_____（电子签名）

日 期：____2025____年__10__月__31__日

（五）有不拖欠农民工工资的具体承诺、相应措施

西峡县公路事业发展中心（招标人名称）：

1. 不拖欠农民工工资的承诺：

（1）截止本工程开标之日止，我公司无拖欠农民工工资及其他职工工资，无克扣农民工工资的行为。

（2）承建此工程我公司承诺不得存在拖欠或克扣农民工工资。

（3）本次响应成交后，将及时、足额向建设行政主管部门提交农民工工资保障金为成交价的 2%：

（4）承包此建筑工程项目中若出现拖欠职工工资情况，可由建设行政主管部门从工资保障金中先划支。

2. 不拖欠农民工工资保障措施及便于落实的程度：

为保护农民工的合法权益，不拖欠农民工工资，郑重承诺：

（1）按照劳动保障法律法规规定使用农民工，依法与农民工签订劳动合同，执行国家社会保险、工时制度和加班费支付规定。

（2）实行农民工实名制管理，按月将工资直接发放给农民工本人，支付工资不低于当地最低工资标准。严禁发放给“包工头”，严禁以实物、有价证券、“饭菜票”等抵付。

（3）按规定缴纳农民工工资支付保障金。

（4）如果发生违反规定拖欠或克扣农民工工资行为，造成农民工上访，本单位愿意接受人力资源社会保障、建设、公安等部门依照有关规定作出的处理和处罚决定。

投标人：西峡县正通公路养护有限公司（电子签章）

法定代表人或其委托代理人：_____（电子签名）

日 期：_____ 2025 年 10 月 31 日

（六）保证连续施工的实质性的承诺

西峡县公路事业发展中心（招标人名称）：

我公司在此郑重承诺：

一、我公司的施工工艺、拟投入本项目的机械设备等满足国家关于环保的有关规定在建设过程中，我公司必定严格按照河南省公路水运施工扬尘污染防治标准和省、市关于大气污染防治和扬尘治理的相关要求，建立扬尘防治责任制和预防扬尘预案，切实加强施工工地的环境污染防治和扬尘治理工作，落实“三员管理”“六全施工”和“开复工制度”，确保施工环保达标。

二、计划工期：本项目计划工期 2 个月，缺陷责任期 6 个月。

三、投标有效期：自投标截至之日起 60 日历天。

四、质量要求：合格。

五、响应范围：施工图纸及招标工程量清单范围内的所有内容。

六、管理：我方将严格按照在响应文件中填报的其他主要管理人员和技术人员及主要机械设备和试验检测设备组织进场施工，且不进行更换。

七、技术标准和要求：符合招标文件及国家有关规定的要求；

八、如我公司成交，本项目拟任的项目经理及项目总工将不会更换。

九、服务承诺

（1）我公司承诺成交后，我公司将拨付一定的款项，做到资金专款专用，保证工程施工的连续性。

（2）为保证劳动力充足，满足施工进度计划，公司拟投入自有优秀施工队伍。工程施工前，组织专业技术工种人员进行培训教育，熟悉了解本工程的施工特点，掌握各项目的施工工艺和技术标准，为工程施工顺利进行创造条件。组织施工人员在开工前 3—5 天进场。

（3）我公司将按规定的数额及时足额缴纳农民工工资，保障金为成交价的 2%。在建工程

中，一旦出现拖欠农民工工资及其他职工工资的，贵方可从农民工工资保障金中先予以划支，我公司愿意接受贵方的任何处罚。

（4）我公司承诺在工程款暂不到位的情况下垫资施工，将不影响施工进度。

（5）我方承诺一定遵照业主和监理的要求，做好施工现场协调工作，确保工程质量，确保工期。

十、安全生产文明施工承诺：

1、认真贯彻执行《建筑法》《安全生产法》《建设工程安全生产管理条例》等安全生产法律法规，坚持“安全第一，预防为主”的方针，建立健全企业和项目部安全生产管理体系，并使之正常有效运转；

2、按规定设立项目管理班子，并足量配备专职安全生产管理人员，各班组设立兼职安全员，建立安全生产监督管理网络；

3、对建设单位支付的安全文明措施费用将足额用于施工安全防护用具及设施的采购和更新、安全施工措施的落实、安全生产条件的改善，决不挪作他用；

4、加强对进场作业人员的安全教育培训。特种作业人员均做到持有效证上岗；所有作业人员均经“三级”安全教育培训并考核合格后上岗；

5、贯彻落实工程建设安全生产强制性标准条文，严格并全面落实经审批的施工组织设计和专项施工方案及其安全技术措施，并按规定做好安全技术交底工作；

6、加强对施工现场文明施工的管理，教育职工自觉抵制“四乱”行为，现场围墙、大门、冲洗台、道路硬化、材料堆放、建设立面、临建设及餐饮等均符合文明卫生要求；

7、接受建设行政主管部门及建设、监理、勘察设计和相关方的监督，认真对待所提出的指令或意见、建议，及时消除各类隐患；

8、公司和项目部均按规定分级实施监督检查，及时消除各类安全隐患将按照有关规定及时上报；发生生产安全事故，将按照事故管理规定及时上报建设行政主管部门、地方安全生产监管部门等有关部门，并积极配合做好事故调查处理工作，决不瞒报或拖延报告；

9、组织管理现场的安全生产工作时，必须服从业主和监理单位的领导和指挥接受建设单位的监督检查。与业主、监理单位的配合，及时反映施工过程中存在并需建设单位解决的问题，及时上报施工进度，每周会同业主、监理单位汇报和研究施工情况，做到业主、监理公司满意。

投标人：西峡县正通公路养护有限公司（电子签章）

法定代表人或其委托代理人：_____（电子签名）

日 期：_____ 2025 _____ 年 _____ 10 _____ 月 _____ 31 _____ 日

（七）质量保证期内、外服务优惠承诺

一、我公司承诺在施工期间，加强安全防护措施，安全文明施工，保证不发生各种安全事故，并承担由此发生的一切费用。

二、费用透明：我方将确保所有费用明细清晰、透明，无隐藏费用。在项目执行过程中，如需增加额外费用，将提前与招标人沟通并征得同意。

三、高质量施工：我方将严格按照国家及地方相关法规、标准和合同要求，组织施工队伍，确保工程质量达到优良标准。

四、工期保障：我方将制定详细的施工计划合理安排施工进度，确保工程在合同约定的工期内顺利完成。

五、保修期内、外服务优惠承诺

1、保修期内的服务承诺：

（1）保修服务范围：严格按照建设部《建设工程质量管理条例》及《工程施工总承包合同》、《工程质量保修书》中的规定执行。对于工程承包范围内的施工项目，自工程竣工验收合格之日起进入工程质量保修阶段。在保修阶段，凡因工程不符合规程、规范和工程合同规定所造成工程实体损坏，我公司将无条件进行保修，并在保修期内承担相应的工程维修责任。

（2）保修期限按国家、省、市的有关规定及工程质量保修书执行。

（3）工程保修及服务承诺：我单位对所提供施工自投入使用之日起，严格按照工程总承包合同有关保修的条款执行；严格贯彻公司的质量方针，本着客户至上的原则，服务热情，周到，随叫随到；建立回访制，进行定期、不定期回访，每年内工程回访不少于两次，认真听取建设单位意见，并形成回访记录；建立维修工程专班专人负责制，由公司工程部、技术部派人负责。

2、保修期外的服务承诺：

在工程保修期满后，我公司将一如既往进行定期回访，如果工程出现质量问题或由于操作不当等其他原因造成的问题，我公司本着负责到底和优质服务的宗旨，在酌情收到一定成本费用情况下，全力组织技术力量进行保修，让业主完全可以放心使用。同时保修期外的维修费用将给予最廉价之优惠。

六、我公司承诺：

招标人有权核查我公司在响应文件中提供的材料，若在评标期间发现我公司提供了虚假资料，招标人有权对我公司的响应文件作废标处理，并没收其响应担保；若我公司有幸成交，在评标结果公示期间发现我公司提供了虚假资料，招标人有权取消其成交资格并没收其响应担保；若在合同实施期间发现我公司提供了虚假资料，招标人有权从合同价款或履约保证金中扣除不超过 5% 签约合同价的金额作为违约金。同时招标人将我公司以上弄虚作假行为上报省级交通运输主管部门，作为不良记录纳入公路建设市场信用信息管理系统。

六、信誉承诺：

- (1) 我公司未被省级及以上交通运输主管部门取消招标项目所在地的响应资格且处于有效期内；
 - (2) 我公司未被责令停业，暂扣或吊销执照，或吊销资质证书；
 - (3) 我公司未被进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；
 - (4) 我公司在“信用中国”网站未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单；在“中国政府采购网”未被列入严重违法失信行为记录名单；
 - (5) 我公司在“国家企业信用信息公示系统”网站中未被列入严重违法失信企业名单；
 - (6) 我公司及其法定代表人、拟委派的项目经理在近三年内没有行贿犯罪行为。
- 七、我公司满足法律法规及供应商须知前附表规定的其他情形。

投标人：西峡县正通公路养护有限公司（电子签章）

法定代表人或其委托代理人：_____（电子签名）

日 期；2025 年 10 月 31 日
